

محافظة الزرقاء

محافظة الزرقاء

لمحة عامة:



تمتاز محافظة الزرقاء بأنها إحدى محافظات الوسط في المملكة، وتتكون من عدة وحدات إدارية تتمثل في ستة ألوية، ويوجد في المحافظة عدة منشآت إقتصادية هامة منها مصفاة البترول الأردنية، ومحطة الحسين الحرارية والمنطقة الحرة وعدة جامعات خاصة وحكومية وعدد كبير من المصانع التي تشكل ما نسبته (٥٢%) من حجم الصناعة الأردنية من حيث رأس المال والعمال والإنتاج والتي تساهم في رفد الإقتصاد الأردني.

التضاريس والمناخ:

- تمتاز الزرقاء بتضاريس مختلفة وهي على ثلاثة أشكال:
- **الوديان** : وأشهرها وادي الزرقاء وهو الحد الفاصل ما بين حوران والبلقاء.
 - **الهضبة الصحراوية** : من الجهة الشرقية للزرقاء.
 - **المرتفعات الجبلية** : وتقع إلى الغرب بمحاذاة محافظتي جرش والبلقاء.
- وهي ذات مناخ صحراوي جاف صيفاً قليل الأمطار شتاءً.

الموقع والمساحة:

تقع محافظة الزرقاء في شمال المملكة، بين محافظتي [المفرق](#) من الشمال والعاصمة من الجنوب وتتميز بقربها من محافظات العاصمة [والبلقاء](#) و [جرش](#) و [المفرق](#) وتبلغ مساحة المحافظة حوالي (٤٧٦١.١٥) كم^٢ أي ما نسبته (٥.٤%) من مساحة المملكة، وتشكل الأراضي الصحراوية الشرقية جزءاً كبيراً من مساحتها. و تمر من خلالها سكة الحديد التي تأسست عام ١٩٠٠ .

الواقع السكاني والكثافة السكانية:

مرت الزرقاء في مراحل متعددة فيما يتعلق بالتطور السكاني قبل بدايات القرن العشرين الامر الذي أدى الى التنوع السكاني بالشكل الذي هي عليه الآن، وبلغ عدد سكان محافظة الزرقاء (٨٥٢٧٠٠) نسمة لعام ٢٠٠٧ بنسبة نمو تصل الى (٦.٦%)، وما نسبته (١٤.٩%) من سكان المملكة تقريباً. والجدول التالي يبين توزيع السكان حسب الجنس واللواء والكثافة السكانية في محافظة الزرقاء.

الجدول رقم (١)

التوزيع السكاني حسب الجنس واللواء والكثافة السكانية في محافظة الزرقاء

معدل الكثافة السكانية فرد/كم ^٢	النسبة %	المساحة كم ^٢	النسبة من المحافظة %	عدد السكان (نسمة)		اللواء
				اناث	ذكور	
١٠٩.٧	٩٦	٤٥٧٤.٣٣	٥٨.٩	٢٤٣٠٦٠	٢٥٨٨٧٠	قصبية الزرقاء
٦٣٣٧.١٦	١	٤٤.٤٠	٣٥	١٤٣٧٧٠	١٥٥٣٦٠	الرصيفة
٣٦٢.٦	٣	١٤٢.٤٢	٦.١	٢٤٦٧٠	٢٦٩٧٠	الهاشمية
١٧٩.١	١٠٠	٤٧٦١.١٥	١٠٠	٨٥٢٧٠٠		المجموع

المصدر :- دائرة الإحصاءات العامة، ٢٠٠٧.

التقسيمات الإدارية:

تقسم محافظة الزرقاء إلى ثلاثة ألوية و ثلاثة أفضية على النحو التالي :

أولاً : لواء القصبية

[قضاء الأزرق](#)

[قضاء بيرين](#)


[قضاء الضليل](#)

ثانياً : لواء الرصيفة

ثالثاً : لواء الهاشمية

الخارطة رقم (١)

خارطة محافظة الزرقاء حسب الألوية والقرى

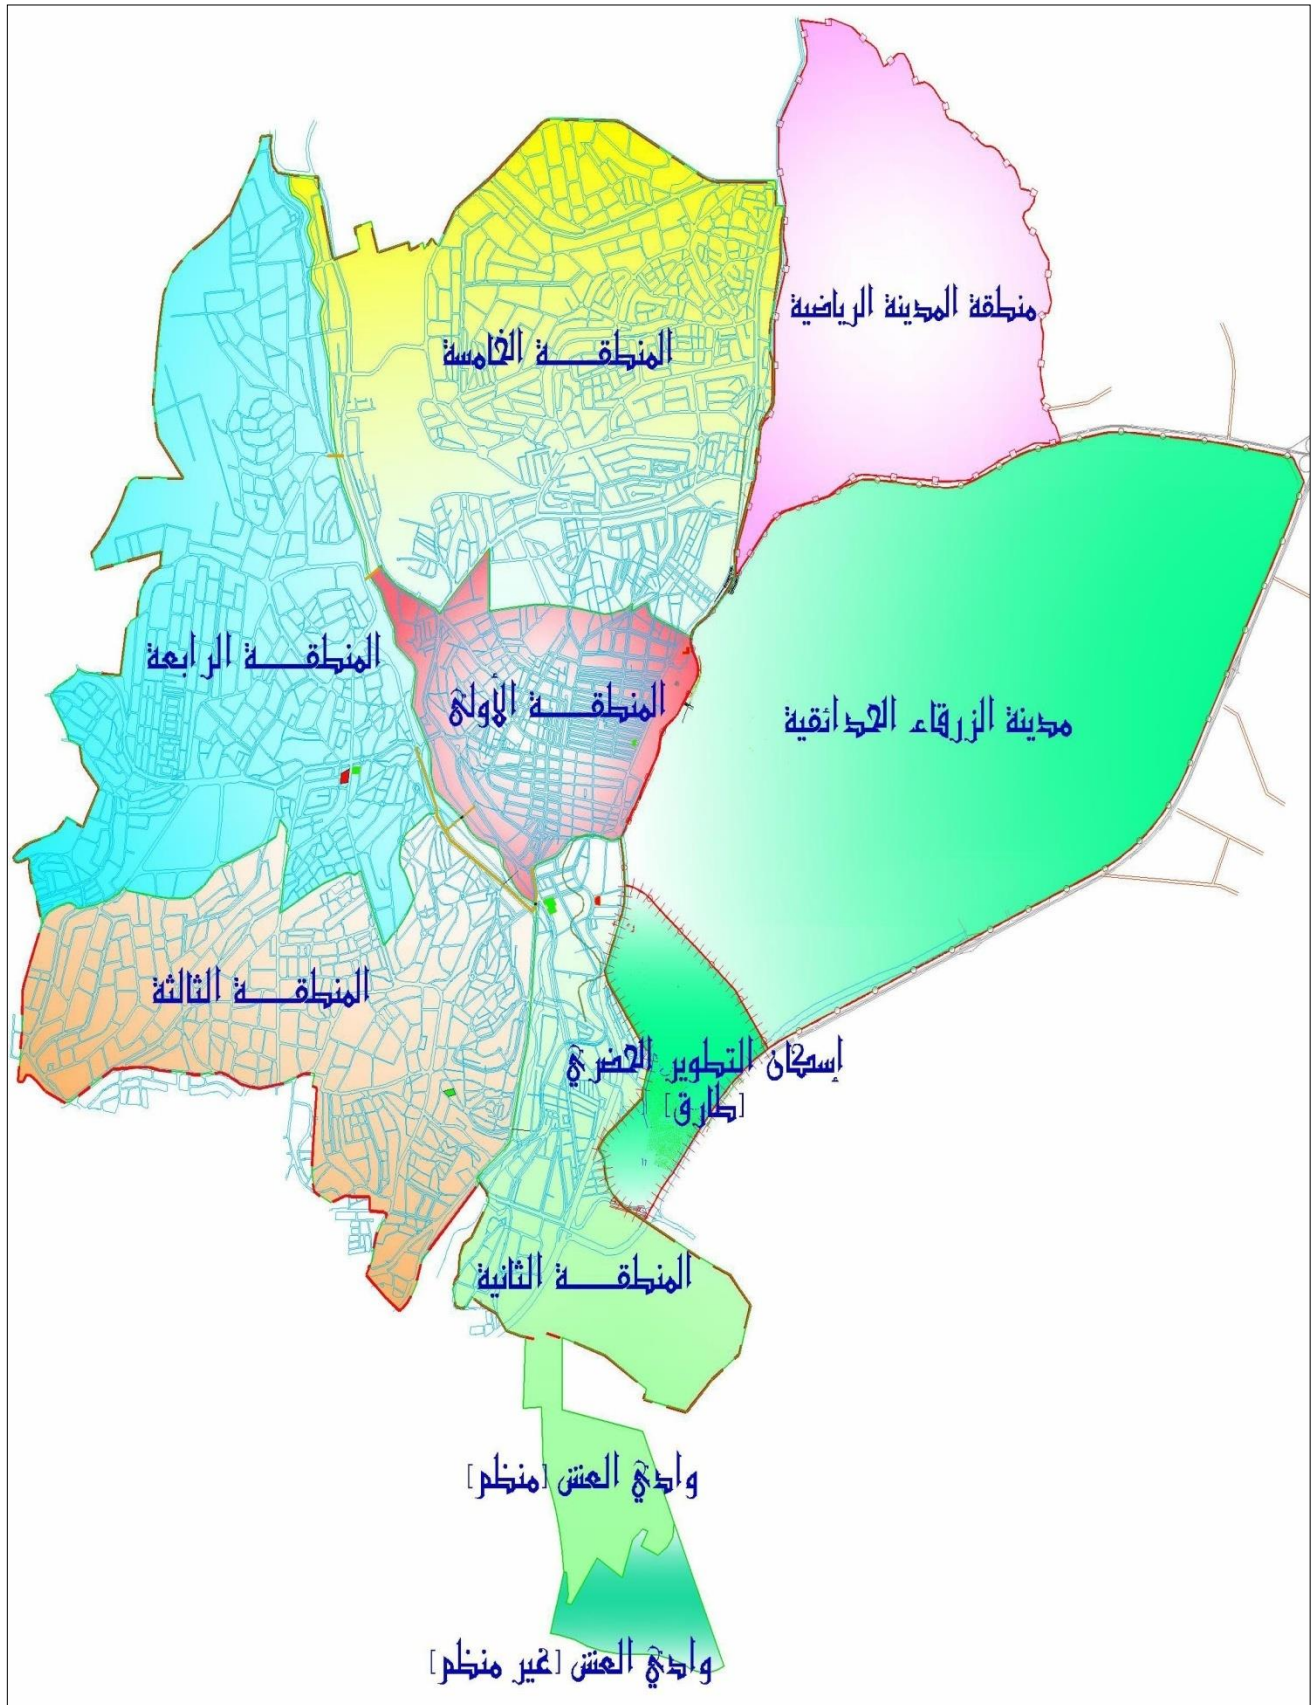

أبرز المشاريع الرأسمالية لمحافظة الزرقاء

(بالآلاف دينار)

الرقم	اسم المشروع	الجهة المنفذة	مخصصات ٢٠٠٨	نسبة الإنفاق %	نسبة الإنجاز %	الملاحظات
	مجموع المشاريع الرأسمالية للمحافظة منها المشاريع التالية		٧٢٨٤٢.٦	٥٩		
١.	إنشاء أبنية نموذجية للمحاكم وقصور العدل في المملكة.	وزارة العدل	٣٣٥٠	٤٧.٦	١٠	تم إحالة العطاء على شركة ضرار صرايرة ولغاية الآن لم يتم صدور أمر المباشرة .
٢.	إنشاء مجمع المحاكم الشرعية/ الزرقاء.	دائرة قاضي القضاة	٩٥٤	٧٨	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع وتم تشكيل لجنة الاستلام الأولي.
٣.	خط سكة حديد عمان / الزرقاء.	وزارة المالية	١٧٠٠٠	٨.٨	-	المشروع يسير دون المستوى المخطط له وتم توقيع إتفاقية بناء وتشغيل مشروع خطة السكة مع شركة الائتلاف الكويتي الاسباني.
٤.	مستشفى الزرقاء الجديد.	وزارة التخطيط	٨٠٩٥	٩٦.٢	٢٦	العمل جارٍ في موقع المشروع.
٥.	طريق الهاشمية / بلعما / الزنية شاملة منطقة التوسعة.	وزارة الأشغال	٤٥٠٠	١٠٠	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع/ قيد الاستلام الأولي.
٦.	طريق ياجوز/ تقاطع القوات الخاصة.	وزارة الأشغال	٢٩٠٠	١٠٠	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع/ قيد الاستلام الأولي.
٧.	تحسين تقاطعات على أوتسترد عمان/ الزرقاء.	وزارة الأشغال	٢٥٠٠	١٠٠	٨٥	العمل جارٍ في موقع المشروع.
٨.	تنفيذ طريق الزرقاء/الأزرق.	وزارة الأشغال	٣٨٠٠	١٠٠	٧٠	العمل جارٍ في موقع المشروع.
٩.	تنفيذ طريق الزرقاء / بيرين.	وزارة الأشغال	٢١٠٠	١٠٠	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع/ قيد الاستلام الأولي.
١٠.	المساهمة في تنفيذ تقاطع مدخل الجامعة الهاشمية.	وزارة الأشغال	٥٠٠	١٠٠	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع وتم استلامه أولاً.
١١.	إنشاء جسر الهاشمية على	وزارة	٨٠٠	١٠٠	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع

وتم استلامه أولاً				الأشغال	طريق الهاشمية/بلعما.
المشروع قيد الطرح للإحالة.	١٠	١٠٠	١٠٠٠	وزارة الأشغال	١٢. تنفيذ جسر على تقاطع الفيحاء/ الزرقاء.

(بالألف دينار)

الرقم	اسم المشروع	الجهة المنفذة	مخصصات ٢٠٠٨	نسبة الإنفاق %	نسبة الإنجاز %	الملاحظات
١٣.	تنفيذ تقاطع الركبان.	وزارة الأشغال	-	-	١٠	المشروع يسير دون المستوى المخطط له وتم إجراء مناقشات من المخصص لمشاريع الأخرى.
١٤.	القرى الحضرية.	وزارة الأشغال	٧٥٠	١٠٠	٦٠	العمل جارٍ في موقع المشروع.
١٥.	إسكان الأسر الفقيرة.	وزارة الأشغال	٩٧٩	١٠٠	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع وتم الاستلام الأولي.
١٦.	المحطة المركزية لمعالجة المياه العادمة الصناعية	وزارة البيئة	٥٠٠	٠.٠٨	-	تم إعادة طرح العطاء.
١٧.	الإدارة المتكاملة لإعادة تأهيل سيل الزرقاء.	وزارة البيئة	٢٠٠	-	-	المشروع في مرحلة الدراسات وإعداد التصاميم.
١٨.	إعادة تأهيل تلال الفوسفات.	وزارة البيئة	٦٠	-	-	المشروع في مرحلة الدراسات وإعداد التصاميم.
١٩.	تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي.	وزارة التربية	١٠٠٠	٨٣	٨٥	تم استلام عدد من المدارس وهناك مدارس في مراحل التنفيذ.
٢٠.	إنشاء مركز للمعوقين/الضليل.	وزارة التنمية الإجتماعية	١١٠٢	٦٥	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع وتم استلامه أولاً.
٢١.	إنشاء مبنى مركز الخنساء .	وزارة التنمية الإجتماعية	١٠٩٧	٥٦.٧	٣٠	العمل جارٍ في موقع المشروع وتم نقله لمشاريع العاصمة.
٢٢.	إنشاء طابق إضافي لمركز أسامة بن زيد.	وزارة التنمية الإجتماعية	٢٢٥	٥٣	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع وتم استلامه أولاً.

٢٣ .	إكمال مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي.	وزارة الثقافة	٤١٠	١٠٠	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع وتم تسليم المبنى.
------	---	------------------	-----	-----	-----	---

خلاصة التقييم لأهم المشاريع التنموية والرأسمالية لمحافظة الزرقاء

مخصصات النفقات الرأسمالية للمشاريع التنموية في قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٠٨

بلغت مخصصات المشاريع الرأسمالية لمحافظة الزرقاء (٧٢٨٤٢.٦) دينار لعام ٢٠٠٨ موزعة على القطاعات وحسب الفصول للوزارات والدوائر الحكومية في حين بلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ (٤٢٩٨٠.٦) دينار أي ما نسبته (٥٩%) وهي نسبة دون المستوى المستهدف، ويعود ذلك إلى التأخر في طرح العطاءات لبعض المشاريع التي خصصت لها مبالغ كبيرة بالمقارنة مع المشاريع الأخرى كما هو واضح بالشكل رقم (١) .


(بالآلف دينار)

البيان	مقدر ٢٠٠٨	الإنفاق حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	نسبة الإنفاق الفعلي %
المشاريع الرأسمالية	٧٢٨٤٢.٦	٤٢٩٨٠.٦	٥٩

المصدر: دائرة الموازنة العامة، ٢٠٠٨.

شكل رقم (١)


مقارنة الاتفاق الفعلي للمشاريع الرأسمالية حسب القطاعات
لمحافظة الزرقاء

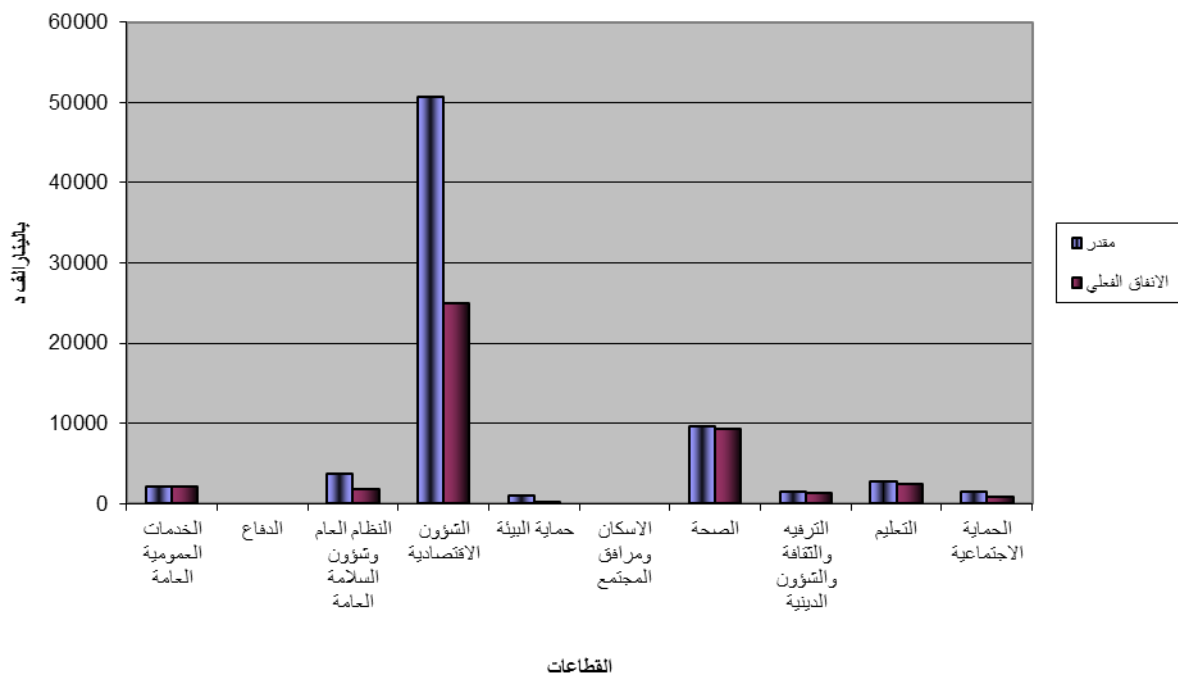

ويشير توزيع مخصصات المحافظة حسب القطاعات الوظيفية إلى أن قطاع الشؤون الاقتصادية إستأثر على ما نسبته (٦٩.٥%) من إجمالي مخصصات محافظة الزرقاء لعام ٢٠٠٨ وذلك من أجل تنمية المحافظة إقتصادياً والمساهمة في تخفيض معدلات البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة من مشاريع البنية التحتية ومشاريع تعزيز الإنتاجية وتحفيز الإستثمارات المحلية ، ويأتي في المرتبة الثانية قطاع الصحة والذي حاز على ما نسبته (١٣.٢%) من إجمالي مخصصات محافظة الزرقاء وتلاه القطاعات الأخرى بنسب متقاربة كما هو واضح في الشكل رقم (٢) .

شكل رقم (٢)

التوزيع القطاعي للمشاريع الرأسمالية لمحافظة الزرقاء

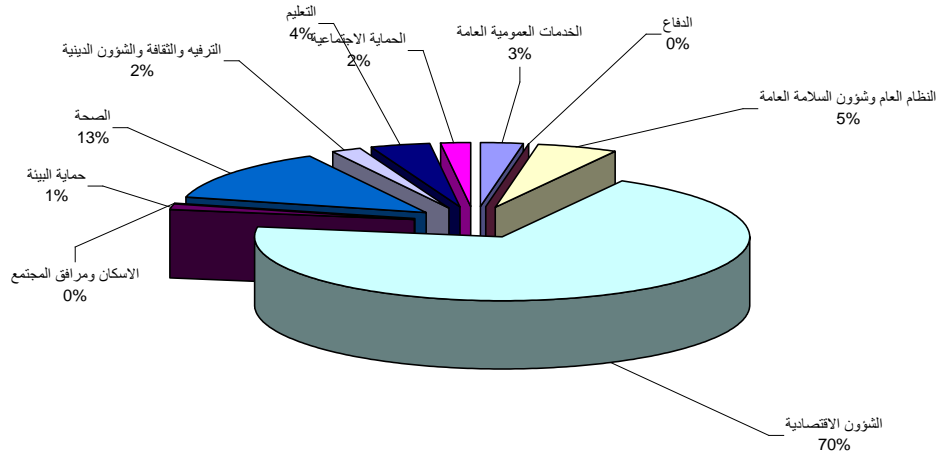

■ الخدمات العمومية العامة ■ الدفاع ■ النظام العام وشؤون السلامة العامة ■ الشؤون الاقتصادية ■ حماية البيئة ■ الإسكان ومراقب المجتمع ■ الصحة ■ الترفيه والثقافة والشؤون الدينية ■ التعليم ■ الحماية الاجتماعية

وفي ما يلي تحليل موجز لأهم مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب الفصول:-

الإشغال العامة والإسكان :-

تم رصد مبلغ (٢٤٦٣٩.٨) ألف دينار لوزارة الأشغال العامة والإسكان في محافظة الزرقاء مشكلة ما نسبته (٣٣.٨%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة وتم إنفاق (٢٤٦٣٧.٥) ألف دينار أي ما نسبته (٩٩.٩%) من المخصصات المرصودة لوزارة الأشغال العامة والإسكان في المحافظة حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١.

التربية والتعليم :-

تم رصد مبلغ (٢٨٠٤) ألف دينار أي ما نسبته (٣.٨%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ (٢٤٨٧.٨) ألف دينار أي ما نسبته (٨٨.٧%) من المخصصات المرصودة لوزارة التربية والتعليم في المحافظة.

الصحة :-



بلغ حجم المخصصات المرصودة لوزارة الصحة في المحافظة (١٢٤٥.١) ألف دينار مشكلة ما نسبته (١.٧%) من إجمالي المخصصات للمشاريع الرأسمالية في المحافظة، كما بلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ (١٢٠٨.٣) ألف دينار أي ما نسبته (٩٧%) من مخصصات وزارة الصحة في محافظة الزرقاء.

وفيما يلي بطاقة وصف لأهم المشاريع التي تم تقييمها:-

بالآلف دينار

١- مشروع إنشاء أبنية نموذجية للمحاكم وقصور العدل في المملكة	
<p>٧٥٠٠ ٣٦ شهراً ٣٣٥٠ ١٥٩٥ ٤٧.٦% ١٠% تم الانتهاء من الدراسات وإعداد التصاميم وتم طرح العطاء وإحالته على شركة ضرار صرايرة ومن المتوقع صدور أمر المباشرة خلال شهر كانون ثاني ٢٠٠٩.</p> <p>- ١٠% المشروع يسير دون المستوى المخطط له بسبب التأخر في طرح وإحالة العطاء.</p>	<p>الكلفة الكلية: مدة التنفيذ: مخصصات عام ٢٠٠٨ : الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ : نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨ : نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨ : سير العمل في المشروع :</p> <p>الأوامر التغييرية : نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:: تقييم المشروع :</p>
<p>يهدف المشروع إلى إنشاء مباني حديثة نموذجية مستقلة للمحاكم وقصور العدل في المملكة للمحافظة على هيبة ونزاهة القضاء الأردني.</p>	
ملاحظات :	

بالآلف دينار

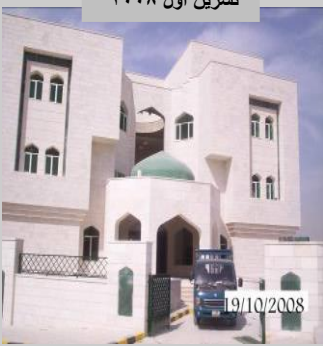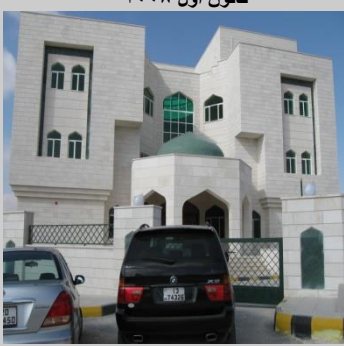

٢- مشروع إنشاء مجمع المحاكم الشرعية / الزرقاء		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>تشرين أول ٢٠٠٨</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>كانون أول ٢٠٠٨</p>  </div> </div>	<p>١٨٥٠ ٢٤ شهراً ٩٥٤ ٧٤٦ ٧٨% ٩٠%</p>	<p>الكلفة الكلية : مدة التنفيذ: مخصصات عام ٢٠٠٨ : الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ : نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨ : نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨ :</p>
<p>تم الانتهاء من المشروع وتم تشكيل لجنة للاستلام الأولي بتاريخ ٢٠٠٨/١/١٢.</p> <p>يوجد تعديلات على المخططات التصميمية لما يلي:-</p>		<p>سير العمل في المشروع: الأوامر التغييرية :</p>

<ul style="list-style-type: none"> - تأسيس كاميرات مراقبة. - تركيب تدفئة مركزية. - وضع نوافذ لقاعات المحاكمات. - تأسيس كاونترات وإضافة سلاالم حديدية إضافية. <p>١٠٠% المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات.</p>	<p>نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع :</p>
<p>يهدف المشروع إلى تجميع المحاكم الشرعية في محافظة الزرقاء لتبسيط الرقابة القضائية والإدارية على أعمال المحاكم.</p>	<p>ملاحظات :</p>

بالألف دينار

٣- مشروع خط سكة حديد عمان-الزرقاء	
<p>٦٨٠٠٠ ٤٨ شهراً ١٧٠٠٠ ١٥٠٠ ٨.٨% -</p> <p>تم توقيع اتفاقية بناء وتشغيل مشروع خط السكة الخفيف بين مدينتي عمان والزرقاء مع شركة الائتلاف الكويتي الاسباني (اكنان جلوبل) بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٣١ ومن المتوقع أن تقوم الشركة البدء بتنفيذ المشروع خلال الربع الأول من عام ٢٠٠٩.</p> <p>- يسير دون المستوى المخطط له .</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع:</p> <p>الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع</p>
<p>المشروع يخدم سكان محافظة العاصمة ومحافظة الزرقاء.</p>	<p>ملاحظات:</p>

بالألف دينار

٤- مشروع مستشفى الزرقاء الجديد	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>تشرين أول ٢٠٠٨</p>  <p>19/10/2008</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>كانون أول ٢٠٠٨</p>  </div> </div> <p>٤٢٠٠٠ ٣٦ شهراً ٨٠٩٥ ٧٧٨٨ ٩٦.٢% ٧٥%</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:</p>

تم إحالة العطاء على شركة محمد أحمد أبو عيشة والعمل جارٍ في موقع المشروع. إضافة تكيف كامل للمستشفى بكلفة (٤) مليون دينار. ٢٦% المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات.	سير العمل في المشروع : الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع
يهدف المشروع إلى نقل مستشفى الزرقاء القديم إلى المستشفى الجديد مع زيادة عدد الأسرة بحيث تصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى (٥٠٠) سريراً.	ملاحظات

بالآلف دينار

٥- مشروع طريق الهاشمية-بلعما-الزنية شاملة منطقة التوسعة		
 <p>كانون أول ٢٠٠٨</p>	<p>٧٢٢١ ٣٦ شهراً ٤٥٠٠ ٤٥٠٠ ١٠٠% ٩٨%</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:</p>
تم الانتهاء من المشروع / قيد الاستلام الأولي. إضافة (٥) كم للأعمال المستهدفة ١٠٠% المشروع يسير حسب المخطط له ولا توجد معوقات.	سير العمل في المشروع: الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع	ملاحظات
-		

بالآلف دينار

٦- مشروع طريق ياجوز-تقاطع القوات الخاصة		
<p>١٢٦٥٠ ٣٦ شهراً ٢٩٠٠ ٢٩٠٠ ١٠٠% ١٠٠%</p> <p>تم الانتهاء من المشروع / قيد الاستلام الأولي. تعديل بمخططات شبكة الصرف الصحي وإضافة جسر وأعمال إضافية للقوات الخاصة .</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع: الأوامر التغييرية</p>	ملاحظات

نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع	١٠٠% المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات.
ملاحظات	-

بالألف دينار

٧- مشروع تحسين تقاطعات على اتوستراد عمان-الزرقاء	
الكلفة الكلية	١٤٠٠٠
مدة التنفيذ	٣٦ شهراً
مخصصات عام ٢٠٠٨	٢٥٠٠
الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٥٠٠
نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨	١٠٠%
نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:	٨٥%
سير العمل في المشروع:	المشروع قيد التنفيذ / العمل جار في موقع المشروع ومن المتوقع الإنتهاء من المشروع في شهر شباط ٢٠٠٩
الأوامر التغييرية	-
نسبة الانجاز الفعلية	٨٥%
تقييم المشروع	المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات.
ملاحظات	-

بالألف دينار

٨- مشروع تنفيذ طريق الزرقاء - الأزرق	
الكلفة الكلية	٤٤٠٠٠
مدة التنفيذ	٤٨ شهراً
مخصصات عام ٢٠٠٨	٣٨٠٠
الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	٣٨٠٠
نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨	١٠٠%
نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:	٨٥%
سير العمل في المشروع:	المشروع تحت الانشاء والعمل جار في موقع المشروع .
الأوامر التغييرية	تحويل الطريق من مسربين إلى أربعة مسارب مفصولين بجزيرة وسطية.
نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:	٧٠%
تقييم المشروع	المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات.
ملاحظات	يهدف المشروع إلى ربط المحافظات والمناطق السياحية من خلال شبكة طرق بمستوى فني عالي.

بالألف دينار

٩- مشروع تنفيذ طريق الزرقاء - بيرين

٦٥٠٠	الكلفة الكلية
٢٤ شهراً	مدة التنفيذ
٢١٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
٢١٠٠	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
%١٠٠	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨
%١٠٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
تم الانتهاء من المشروع / قيد الاستلام الأولي.	سير العمل في المشروع :
إزالة العوائق عن الطريق ، خلطات أسفلتية ساخنة .	الأوامر التغييرية
%١٠٠	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:
المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات.	تقييم المشروع
-	ملاحظات :

بالألف دينار

١٠- مشروع المساهمة في تنفيذ تقاطع مدخل الجامعة الهاشمية

٢٠٠٠	الكلفة الكلية
٢٤ شهراً	مدة التنفيذ
٥٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
٥٠٠	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
%١٠٠	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨
%١٠٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
تم الانتهاء من المشروع وتم تسليمه أولاً.	سير العمل في المشروع:
-	الأوامر التغييرية
%١٠٠	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:
المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات	تقييم المشروع
-	ملاحظات

بالألف دينار

١١- مشروع إنشاء جسر الهاشمية على طريق الهاشمية-بلعما

١٧٠٠	الكلفة الكلية
------	---------------

مدة التنفيذ	٣٦ شهراً
مخصصات عام ٢٠٠٨	٨٠٠
الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	٨٠٠
نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨	%١٠٠
نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:	%١٠٠
سير العمل في المشروع:	تم الانتهاء من المشروع وتم استلامه اولياً.
الأوامر التغييرية	-
نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:	%١٠٠
تقييم المشروع	المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات.
ملاحظات	-

بالآلف دينار

١٢- مشروع تنفيذ جسر على تقاطع الفيحاء - الزرقاء	
الكلفة الكلية	٦٥٠٠
مدة التنفيذ	٣٦ شهراً
مخصصات عام ٢٠٠٨	١٠٠٠
الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	١٠٠٠
نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨	%١٠٠
نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:	%١٠
سير العمل في المشروع:	تم الانتهاء من الدراسات وإعداد التصاميم والمشروع قيد الطرح للإحالة.
الأوامر التغييرية	-
نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:	%١٠
تقييم المشروع	المشروع يسير ببطء ودون المستوى المخطط له.
ملاحظات	-

بالآلف دينار

١٣- مشروع تنفيذ تقاطع الركبان	
الكلفة الكلية	٤٥٠٠
مدة التنفيذ	٣٦ شهراً
مخصصات عام ٢٠٠٨	٥٠٠ إجراء تم مناقلة مالية لمشاريع أخرى
الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	-
نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨	-
نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:	-
سير العمل في المشروع:	تم إحالة العطاء للتنفيذ على شركة الجعفر للتعهدات بتاريخ ٢٠٠٨/٩/٧ وتم صدور أمر المباشرة خلال شهر كانون الأول ٢٠٠٨.

-	الأوامر التغييرية: نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع .
١٠% المشروع يسير دون المستوى المخطط له.	
-	ملاحظات

بالآلف دينار

١٤- مشروع القرى الحضرية	
 <p>تشرين أول ٢٠٠٨ كانون أول ٢٠٠٨</p>	<p>٢١٠٠٠ ٢٤ شهراً ٧٥٠ ٧٥٠ ١٠٠% ١٠٠%</p> <p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإفناق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإفناق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:</p>
<p>تم إحالة العطاء على المتعهد مؤسسة الحق للمقاولات وتم تسليم الموقع بتاريخ ٢٠٠٨/٩/١٤ وتمت المباشرة بالتنفيذ بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/٢١ ومن المتوقع أن ينتهي المشروع في شهر آذار ٢٠٠٩.</p> <p>سير العمل في المشروع:</p> <p>الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع</p>	<p>- ٦٠%</p> <p>المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات. يهدف المشروع إلى إنشاء حدائق نموذجية في المحافظات.</p>
	ملاحظات

بالآلف دينار

١٥- مشروع إسكان الأسر الفقيرة	
 <p>تشرين أول ٢٠٠٨</p>	<p>٢٢٥٠٠ ٢٤ شهراً</p> <p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ</p>

	تم تخصيص مبلغ (٨) مليون دينار لجميع المحافظات منها ٩٧٩ للزرقاء ٩٧٩ %١٠٠ %١٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
	تم الإنتهاء من المشروع/استلام أولي الهاشمية ٥٠ وحدة سكنية أم رمانة ٢٠ وحدة سكنية - %١٠٠ المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات.	سير العمل في المشروع: الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع
	يهدف المشروع إلى تأمين مساكن للأسر الفقيرة في كافة محافظات المملكة.	ملاحظات

بالآلف دينار

١٦- مشروع المحطة المركزية لمعالجة المياه العادمة الصناعية		
	١٠٦٥ ٣٦ شهراً ٥٠٠ ٠.٤ %٠.٠٨ - تم طرح العطاء عن طريق دائرة العطاءات الحكومية وهذا العطاء مناصفة بين وزارة البيئة وغرفة الصناعة. - - المشروع يسير دون المستوى المخطط له حيث تم إعاد طرح العطاء وهو الآن قيد الدراسة من بداية السنة.	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع: الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع
	يهدف المشروع إلى معالجة مخلفات الصناعة السائلة في منطقة الحلابات حتى تخرج مطابقة للمواصفات الأردنية لري المزروعات.	ملاحظات

بالآلف دينار

١٧- مشروع الإدارة المتكاملة لإعادة تأهيل سيل الزرقاء	
١٢٥٠	الكلفة الكلية
٣٦ شهراً	مدة التنفيذ
٢٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
-	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
-	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨
-	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
المبلغ المرصود أعلاه للدراسة والتصاميم ولغاية الآن تم توفير (١) مليون دولار من الوكالة الإسبانية (منحة) و (٣٣٥) ألف دولار من وكالة التنمية والتجارة الأمريكية للتنفيذ .	سير العمل في المشروع:
-	الأوامر التغييرية
-	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:
يتم تمويل المشروع عن طريق منح خارجية حسب قدرة الوزارة على استقطاب المانحين، المشروع يسير دون المخطط له.	تقييم المشروع
يهدف المشروع إلى إعادة الحياة لسيل الزرقاء لمعالجة التلوث والتدهور لمياه السيل حيث يمر بأربع محافظات ويبدأ العمل من عين غزال وحتى الخربة السمراء.	ملاحظات

بالآلف دينار

١٨- مشروع إعادة تأهيل تلال الفوسفات	
١٨٠	الكلفة الكلية
٣٦ شهراً	مدة التنفيذ
٦٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
-	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
-	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨
-	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
المشروع في مرحلة الدراسات وإعداد التصاميم ومن المتوقع إعادة النظر في الكلفة الكلية بحيث سيتم تأهيل (١١) مليون م٢ من تلال الفوسفات بكلفة (٣) دنانير للمتر، سيتم تنفيذ دراسة مشروع حالة البيئة عن طريق الجامعة الهاشمية .	سير العمل في المشروع:
-	الأوامر التغييرية
-	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:
المشروع يسير دون المخطط له.	تقييم المشروع
	ملاحظات

بالألف دينار

١٩- مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي

<p>تشرين أول ٢٠٠٨</p>  <p>19/10/2008</p>	<p>كانون أول ٢٠٠٨</p> 	<p>١٩٠٠٠٠ ١٠٨ أشهر ١٠٠٠ ٨٣٣ %٨٣ %٧٥</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:</p>
<p>* تم استلام المدارس التالية في محافظة الزرقاء:- - مدرسة حي الاسكان - مدرسة طارق بن زياد - مدرسة خديجة أم المؤمنين * المدارس تحت التنفيذ :- - مدرسة ابن زيدون - مدرسة خالد بن الوليد - (٣)مدارس في منطقة الحلابات الشرقي . - مدرسة الأمير محمد للبنين والبنات. - %٨٥</p> <p>المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات.</p>		<p>سير العمل في المشروع: الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع</p>	
<p>يهدف المشروع إلى إنشاء (١٨٦) مدرسة حكومية شاملة وإضافة (٥٦٠) غرفة صفية وتطوير الأداء وتأهيل المعلمين .</p>		<p>ملاحظات</p>	

بالألف دينار


٢٠- مشروع إنشاء مركز للمعوقين / الضليل	
١٤٠٠	الكلفة الكلية
٢٤ شهراً	مدة التنفيذ
١١٠٢	مخصصات عام ٢٠٠٨
٧٢٠	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
%٦٥	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨
%٩٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
تم الانتهاء من المشروع وتم استلامه أولاً.	سير العمل في المشروع:
(٢٠٠) ألف دينار لتأهيل الساحات الخارجية وإضافة أعمال كهربائية وميكانيكية جديدة.	الأوامر التغييرية
%١٠٠	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:
المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات.	تقييم المشروع
يهدف المشروع إلى إيواء وتأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة حيث قدرت نسبة الاعاقة في الزرقاء (٤%) من عدد السكان.	ملاحظات

بالألف دينار

٢١- مشروع إنشاء مبنى مركز الخنساء	
٢٠٥٠	الكلفة الكلية
٢٤ شهراً	مدة التنفيذ
١٠٩٧ تم نقله لمشاريع العاصمة.	مخصصات عام ٢٠٠٨
٦٢٢	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
%٥٦.٧	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨
%٤٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
العمل جاري في موقع المشروع.	سير العمل في المشروع:
-	الأوامر التغييرية

نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع	٣٠% المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات.
ملاحظات	يهدف المشروع إلى تربية وتأهيل الفتيات الأحداث الجانحات دون سن (١٨) وهو أول مركز تأهيلي في المملكة .

بالألف دينار

٢٢- مشروع إنشاء طابق اضافي لمركز أسامة بن زيد		
تشرين أول ٢٠٠٨	٢٩٥	الكلفة الكلية
	٢٤ شهراً	مدة التنفيذ
	٢٢٥	مخصصات عام ٢٠٠٨
	١١٩	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
	٥٣%	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨
	١٠٠%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
تم الانتهاء من المشروع/وتم استلامه أولاً.	-	سير العمل في المشروع:
	١٠٠%	الأوامر التغييرية
المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات.	-	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:
	-	تقييم المشروع
	-	ملاحظات

بالألف دينار

٢٣- مشروع إكمال مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي		
تشرين أول ٢٠٠٨	٦٠٠٠	الكلفة الكلية
	٩٦ شهراً	مدة التنفيذ
	٤١٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
	٤٠٩	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١

	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:	٩٩.٩% ١٠٠%
سير العمل في المشروع: الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع	- تم الانتهاء من تنفيذ المشروع وتم تسليم المبنى - ١٠٠% المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات.	
ملاحظات	يهدف المشروع إلى تفعيل النشاطات الفنية والثقافية في محافظة الزرقاء وإظهار معالم الحضارة الأردنية العربية في إقليم الوسط.	

مطالب واحتياجات محافظة الزرقاء

- ١- انشاء مراكز صحية شاملة في المناطق النائية.
- ٢- تحسين الخدمات في المراكز الصحية.
- ٣- زيادة الدعم للقطاع الصحي في المحافظة وزيادة الكوادر الطبية المؤهلة.
- ٤- انشاء مركز صحي أولي في حي الأمير علي .
- ٥- ترفيع المراكز الصحية الأولية التالية إلى شاملة (مركز صحي الضليل، مركز صحي إسكان الهاشمية، مركز صحي بيرين ، مركز صحي الرصيفة الجنوبي)
- ٦- الحد من تلوث ينابيع المياه في المحافظة من مشروع الخربة السمراء.
- ٧- استكمال انشاء الطرق الزراعية في المناطق الشرقية والغربية للمحافظة .
- ٨- منع تعديات المواطنين على غابات البلوط في المناطق الغربية للمحافظة وتقليم الأشجار الموجودة فيها .
- ٩- الاهتمام بدعم زراعة الأشجار الحرجية للتخفيف من آثار التلوث البيئي في المحافظة.
- ١٠- انشاء غابة ومنتزة في منطقة الفوسفات كون الأرض لا تصلح للبناء للتخفيف من الآثار البيئية.
- ١١- اقامة مشروع توطين بدو الوسط في منطقة الضليل والحلابات وذلك من خلال نقل المياه الى هذه المنطقة وتشجيع انتاج الأعلاف التي توجد لها سوق في الضليل .
- ١٢- زيادة الإهتمام بسيل الزرقاء ومعالجة المشاكل البيئية.

- ١٣- انشاء مركز شباب وشابات في لواء الهاشمية.
- ١٤- تنجیل ملعب مدينة الزرقاء .
- ١٥- انشاء مركز شباب في قضاء بيرين .
- ١٦- اقامة منشآت شبابية في غرب الزرقاء (جبل الأمير علي، جبل الأميرة رحمة، الزواهره ،بيرين).
- ١٧- ضرورة قيام المجلس الأعلى للشباب بدور توجيهي للشباب .
- ١٨- اعادة تفعيل صندوق دعم الحركة الرياضية في محافظة الزرقاء .
- ١٩- تشطیب وتجهيز مسرح مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي .
- ٢٠- تشجيع مشاركة المؤسسات الصناعية بدعم الأنشطة الشبابية و الرياضية .
- ٢١- الإسراع في تنفيذ طريق الزرقاء – بيرين .
- ٢٢- تکملة طريق ياجوز وإنارته .
- ٢٣- طريق الزرقاء الدائري: البدء في دراسة إنشاء طريق دائري يخدم الزرقاء ويخفف ضغط حركة السير عن الطرق داخل المدينة.
- ٢٤- استكمال مسار نفق الفوسفات .
- ٢٥- استكمال شارع بركة البيبيسي.
- ٢٦- الإسراع باكمال طريق ياجوز من جسر القوات المسلحة باتجاه الزرقاء .
- ٢٧- استكمال انشاء الطرق الداخلية في الرصيفة .
- ٢٨- طريق عمان / الزرقاء (الأوتوستراد) يحتاج الى توسعة ،جسور علوية وسفلية وطريق رديف آخر لتخفيف الضغط عليه .
- ٢٩- تزيين وتشجير جوانب الطرق النافذة .
- ٣٠- إنشاء نفق للسيارات والمشاة أمام مدخل الجامعة الهاشمية الغربي .
- ٣١- توسعة وإعادة إنشاء طريق الهاشمية – بلعما - النعيمة
- ٣٢- إنارة شارع المصفاة من خو الى المصفاة .
- ٣٣- الإسراع بانشاء طريق مكب الغباوي .
- ٣٤- الحاجة الى كوادر لمديرية الأشغال في المحافظة وتزويدها بالآليات
- ٣٥- زيادة مخصصات الطرق الزراعية.
- ٣٦- توسعة مدخل مدينة الزرقاء من الجهة الغربية (بيرين)
- ٣٧- إعادة تأهيل تقاطع الموقر على طريق الزرقاء – الأزرق
- ٣٨- استكمال أعمال تحسين وتوسعة طريق الزرقاء – الأزرق
- ٣٩- تحسين وإعادة تأهيل تقاطع إشارة الدوريات الخارجية على طريق الزرقاء –الازرق
- ٤٠- إعادة إنشاء واستملاك طريق الكلية العسكرية –وادي شطنة – المحطة التحويلية.
- ٤١- إعادة تأهيل مداخل ومخارج جسر الركبان – اوتستراد الزرقاء – المفرق.
- ٤٢- إعادة تأهيل وتوسيع وتحسين وانشاء مدخل طريق الحزام من اوتستراد الزرقاء – عمان (إعادة إنشاء جسر البيبيسي – الحزام
- ٤٣- استكمال طريق الضليل- الخالدية مع توسعة جسر وادي الضليل.

- ٤٤- بناء مبنى لمصادر التعلم
- ٤٥- إنشاء مدرسة في منطقة حي العرافة
- ٤٦- إنشاء مدرسة في منطقة حي الرشيد
- ٤٧- صيانة مدارس مختلفة في مديرية تربية الرصيفة.
- ٤٨- إنشاء مدارس جديدة لمواجهة التوسعة المستقبلية في أعداد الطلاب .
- ٤٩- حل مشكلة المدارس المستأجرة عن طريق استملاك المدارس القديمة وإنشاء مدارس جديدة.
- ٥٠- توسعة وصيانة مدرسة جبل الأمير حسن.
- ٥١- إنشاء مدرسة في منطقة الزواهره والجنية.
- ٥٢- زيادة مخصصات معونة الإعاقات للواء الرصيفة
- ٥٣- زيادة فرق العمل ومخصصات المعونة للمحافظة وعدد المنتفعين من المعونة الوطنية.
- ٥٤- تسيير خطوط لنقل المواطنين الى المجمعين المتواجدين في المحافظة من مختلف المناطق .
- ٥٥- توسعة محطة رفع غرب الزرقاء
- ٥٦- استكمال مشاريع الصرف الصحي للأحياء الداخلية لمدينة الزرقاء .
- ٥٧- تحديث شبكة المياه الرئيسية والفرعية للمحافظة (الزرقاء، الرصيفة والهاشمية)
- ٥٨- استكمال مشروع صرف صحي غرب الزرقاء ومنها ضاحية الأميرة هيا
- ٥٩- زيادة كمية التزويد المائي للمحافظة .
- ٦٠- الاستفادة من المياه المعالجة من محطة الخربة السمراء للمناطق المجاورة
- ٦١- الحد من تسرب المياه العادمة من محطة أبو نصير باتجاه منطقة بيرين.
- ٦٢- دعم إدارة مياه محافظة الزرقاء بالكوادر الفنية والآليات.
- ٦٣- التركيز على نوعية التدريب بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل وحاجة القطاعات الواعدة .
- ٦٤- تزويد مناطق غرب الزرقاء بالخدمات اللازمة حيث توجد فيها متنزهات طبيعية من أشجار قديمة وقصور أثرية .
- ٦٥- زيادة الترويج الإعلامي للمواقع الثرية في المحافظة .
- ٦٦- زيادة الدعم المخصص لحدائق البلديات .
- ٦٧- زيادة حصة الزرقاء من مخصصات السياحة .
- ٦٨- تطوير بعض المعالم التاريخية في الزرقاء
- ٦٩- دعم مديرية بيئة الزرقاء بالأجهزة والكوادر اللازمة لتعزيز دورها .
- ٧٠- معالجة التلوث الناجم عن المحطة الحرارية و الغازات المنبعثة منها كالكبريت والرصاص وغيرهما .
- ٧١- إيجاد حلول للمشاكل البيئية الناتجة عن قيام العاملين في مزارع الدجاج برمي الدجاج النافق في الأماكن العامة .
- ٧٢- إنشاء وحدات استخلاص الكبريت في مصفاة البترول .

