

محافظة الزرقاء

محافظة الزرقاء

لمحة عامة:



تمتاز محافظة الزرقاء بأنها إحدى محافظات الوسط في المملكة، وتتكون من عدة وحدات إدارية تتمثل في ستة ألوية، ويوجد في المحافظة عدة منشآت إقتصادية هامة منها مصفاة البترول الأردنية، ومحطة الحسين الحرارية والمنطقة الحرة وعدة جامعات خاصة وحكومية وعدد كبير من المصانع التي تشكل ما نسبته (٥٢%) من حجم الصناعة الأردنية من حيث رأس المال والعمال والإنتاج والتي تساهم في رفد الإقتصاد الأردني.

التضاريس والمناخ:

- تمتاز الزرقاء بتضاريس مختلفة وهي على ثلاثة أشكال:
- **الوديان** : وأشهرها وادي الزرقاء وهو الحد الفاصل ما بين حوران والبلقاء.
 - **الهضبة الصحراوية** : من الجهة الشرقية للزرقاء.
 - **المرتفعات الجبلية** : وتقع إلى الغرب بمحاذاة محافظتي جرش والبلقاء.
- وهي ذات مناخ صحراوي جاف صيفاً قليل الأمطار شتاءً.

الموقع والمساحة:

تقع محافظة الزرقاء في شمال المملكة، بين محافظتي [المفرق](#) من الشمال والعاصمة من الجنوب وتتميز بقربها من محافظات العاصمة [والبلقاء](#) و [جرش](#) و [المفرق](#) وتبلغ مساحة المحافظة حوالي (٤٧٦١.١٥) كم^٢ أي ما نسبته (٥.٤%) من مساحة المملكة، وتشكل الأراضي الصحراوية الشرقية جزءاً كبيراً من مساحتها. و تمر من خلالها سكة الحديد التي تأسست عام ١٩٠٠ .

الواقع السكاني والكثافة السكانية:

مرت الزرقاء في مراحل متعددة فيما يتعلق بالتطور السكاني قبل بدايات القرن العشرين الامر الذي أدى الى التنوع السكاني بالشكل الذي هي عليه الآن، وبلغ عدد سكان محافظة الزرقاء (٨٧١٦٠٠) نسمة لعام ٢٠٠٨ بنسبة نمو تصل الى (٢.٢%)، وما نسبته (١٤.٩%) من سكان المملكة تقريباً. والجدول التالي يبين توزيع السكان حسب الجنس واللواء والكثافة السكانية في محافظة الزرقاء.

الجدول رقم (١)

التوزيع السكاني حسب الجنس واللواء والكثافة السكانية في محافظة الزرقاء

| معدل الكثافة السكانية فرد/كم ^٢ | النسبة % | المساحة كم ^٢ | النسبة من المحافظة % | عدد السكان (نسمة) | | اللواء |
|---|----------|-------------------------|----------------------|-------------------|--------|---------------|
| | | | | اناث | ذكور | |
| ١١٢.٢ | ٩٦ | ٤٥٧٤.٣٣ | ٥٨.٩ | ٢٤٨٥٠٠ | ٢٦٤٥٦٠ | قصبية الزرقاء |
| ٦٨٨٦.٣ | ١ | ٤٤.٤٠ | ٣٥ | ١٤٦٩٧٠ | ١٥٨٧٨٠ | الرصيفة |
| ٣٧٠.٧ | ٣ | ١٤٢.٤٢ | ٦.١ | ٢٥٢٣٠ | ٢٧٥٦٠ | الهاشمية |
| ١٨٣.١ | ١٠٠ | ٤٧٦١.١٥ | ١٠٠ | ٨٧١٦٠٠ | | المجموع |

المصدر :- دائرة الاحصاءات العامة ٢٠٠٨.

التقسيمات الإدارية:

تقسم محافظة الزرقاء إلى ثلاثة ألوية و ثلاثة أفضية على النحو التالي :

أولاً : لواء القصبية

[قضاء الأزرق](#)

[قضاء بيرين](#)


[قضاء الضليل](#)

ثانياً : لواء الرصيفة

ثالثاً : لواء الهاشمية

الخارطة رقم (١)

خارطة محافظة الزرقاء حسب الألوية والقرى

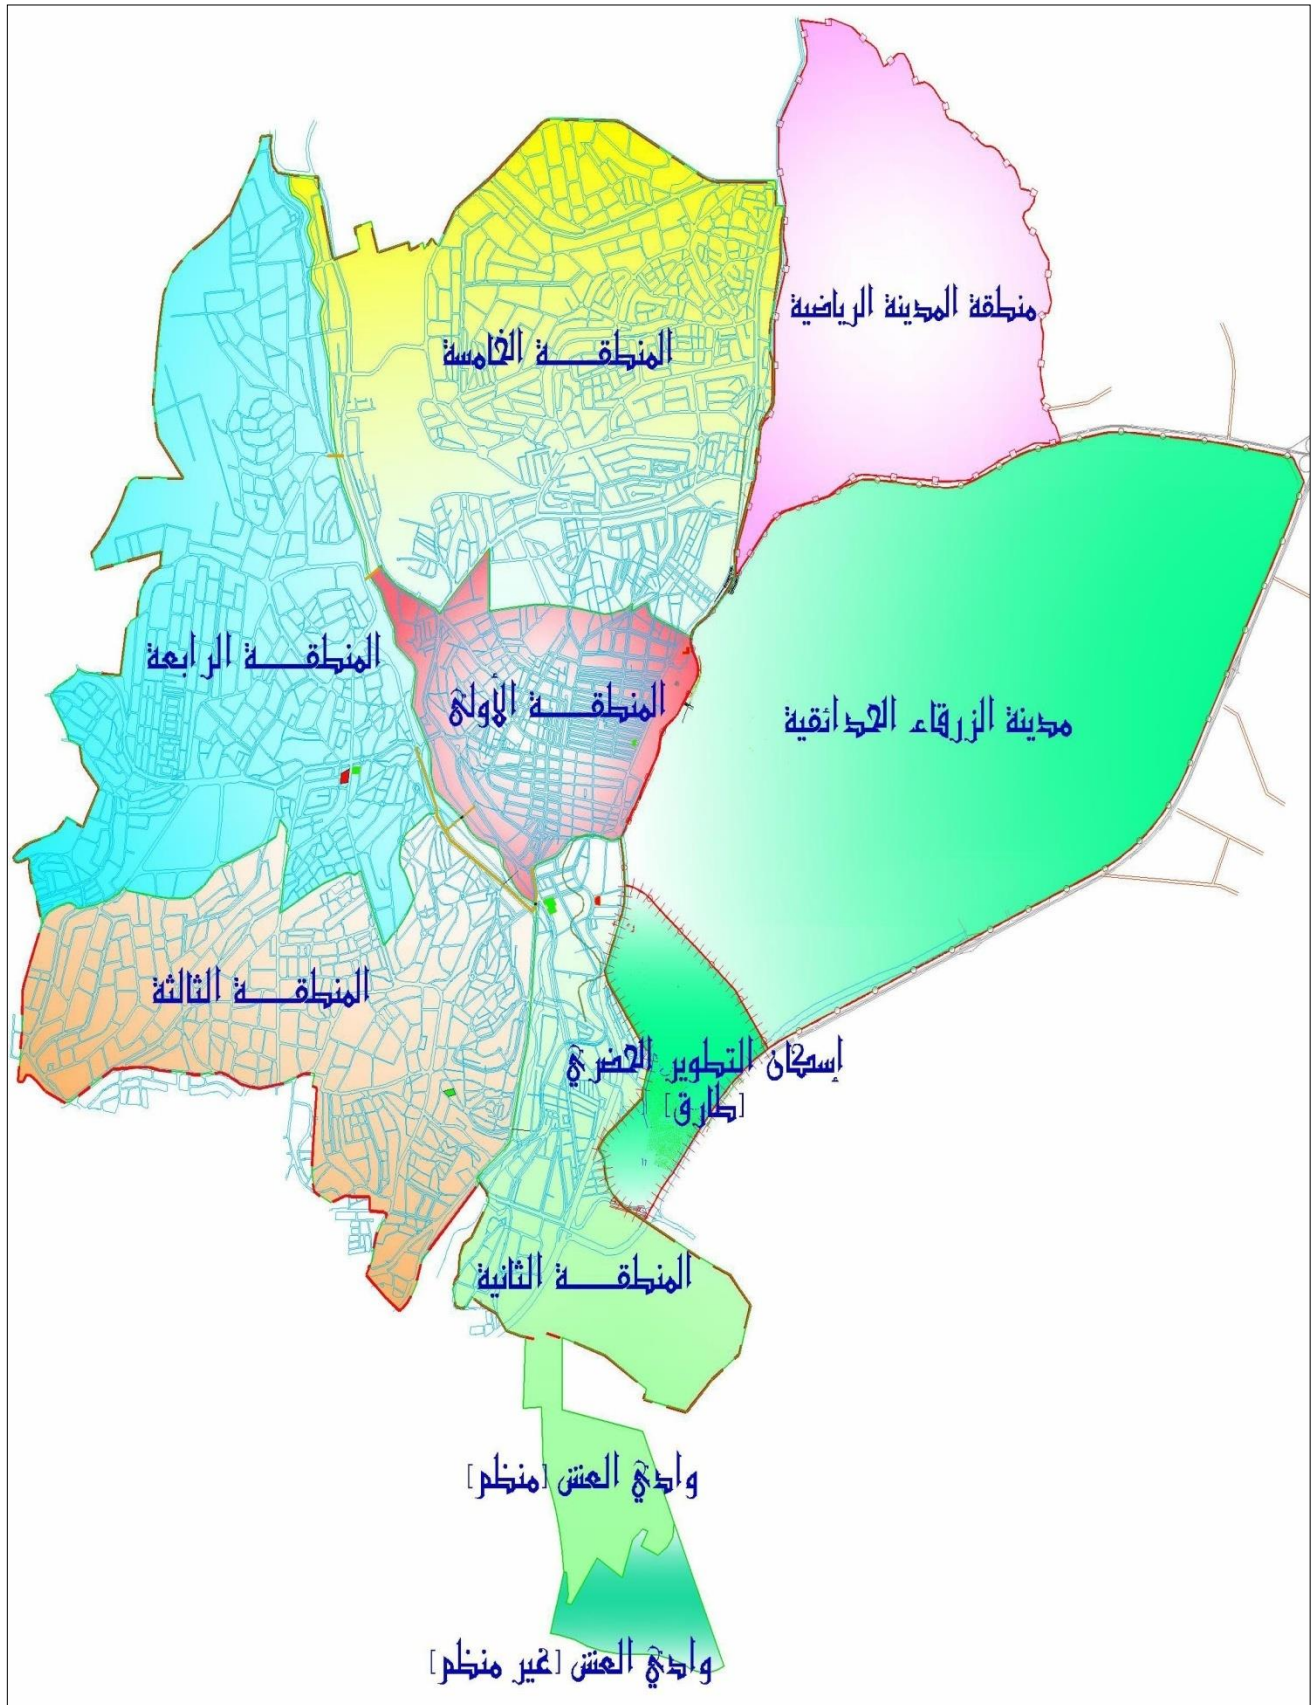

أبرز المشاريع الرأسمالية لمحافظة الزرقاء

(بالآلاف دينار)

| الرقم | اسم المشروع | الجهة المنفذة | مخصصات ٢٠٠٩ | نسبة الإنفاق % | نسبة الإنجاز % | الملاحظات |
|-------|--|--------------------------|-------------|----------------|----------------|---|
| | مجموع المشاريع الرأسمالية للمحافظة منها المشاريع التالية | | ١٣١٦٥٥.٨ | ٥٣.٠ | | |
| ١. | انشاء مبنى قصر العدل في الزرقاء | وزارة العدل | ٢٧٥٠ | ٤٦.٤ | ١٥ | تم انجاز ١٥% لمحكمة بداية الزرقاء، |
| ٢ | انشاء مبنى قصر العدل في الرصيفة | وزارة العدل | ١٧٥٠ | ٢٤.٢ | ٥ | ٥% لمحكمة بداية الرصيفة. |
| ٣. | انشاء مجمع المحاكم الشرعية | دائرة قاضي القضاة | ٦٠٠ | ٢٣.٥ | ١٠٠ | تسليم اولي المشروع في طور التأثيث. |
| ٤. | مستشفى الزرقاء الجديد. | وزارة التخطيط | ٩٤٠٠ | ٥٦.٥ | ٣٣ | العمل جارٍ في موقع المشروع. |
| ٥. | دعم مشاريع المجلس الاعلى للشباب | وزارة المالية | ١٠٠٠ | ٩٠ | ٨٠ | ينفذ حالياً المشروع من قبل شركة المشرق سبيل الهندسية. |
| ٦. | طريق الهاشمية _ بلعما_ منطقة التوسعة | وزارة الأشغال العامة | ٤٠٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | المشروع قيد التسليم |
| ٧. | طريق ياجوز تقاطع القوات الخاصة | وزارة الأشغال العامة | ١٠٠٠ | ٨٩.٥ | ٩٥ | تم الانتهاء والعمل على انارة الطريق |
| ٨. | تحسين تقاطعات على أوتستراد عمان/ الزرقاء. | وزارة الأشغال | ١٠٠٠ | ١٠٠ | ٩٠ | العمل جارٍ في موقع المشروع. |
| ٩. | تنفيذ طريق الزرقاء/الأزرق. | وزارة الأشغال | ١٠٠٠٠ | ٧١.٤ | ٨٧ | العمل جارٍ في موقع المشروع. |
| ١٠. | مشروع تنفيذ طريق الزرقاء - بيرين | وزارة الأشغال | ١٠٠٠ | ٥٢.٢ | ١٠٠ | تم الانتهاء من المشروع. |
| ١١. | انشاء مركز للمعوقين / الضليل | وزارة التنمية الاجتماعية | ٣٩٤.١ | ٣٢.٧ | ١٠٠ | تم التسليم والمشروع في طور التأثيث |
| ١٢. | انشاء طابق اضافي لمركز اسامة بن زيد | وزارة التنمية الاجتماعية | ٩٤ | ١.٥ | ١٠٠ | تسليم اولي والمشروع في طور التأثيث. |

| | | | | | | |
|-----|--|------------------------|-------|------|-----|--|
| ١٣. | اكمال مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي | وزارة الثقافة | ٢٠٠ | ١٨.٩ | ١٠٠ | تم استملاك قطعة الارض المجاورة لعمل مواقف ومسرح للمركز. |
| ١٤. | مشروع البنية التحتية لمدينة خادم الحرمين | وزارة المالية | ٤٠٠٠٠ | ٥٣.٣ | ٣٥ | تم الانتهاء من البنية التحتية للمدينة. |
| ١٥. | مشروع اعادة تنظيم وتطوير مدينة الزرقاء | وزارة المالية | ١٠٠٠٠ | ١.٦ | | |
| ١٦. | مشروع حزمة الامان الاجتماعي | وزارة التخطيط | ٩٧٥ | ٣٤.٦ | ٥٠ | تشير نسبة الانفاق الى ان المشروع يسير حسب النسب المستهدفه للانفاق. |
| ١٧. | مشروع تعزيز الانتاجية | وزارة التخطيط | ٢٥٩٥ | ٣٥.٣ | ٥٠ | تشير نسبة الانفاق الى ان المشروع يسير حسب النسب المستهدفه للانفاق. |
| ١٨. | مشروع اكمال طريق ياجوز/ الرصيفة | وزارة الاشغال | ٥٠٠ | ٦٩.٦ | ٧٠ | العمل جاري في موقع المشروع |
| ١٩. | مشروع طريق الربط لمستشفى الزرقاء الجديد | وزارة الاشغال | ٢٠٠٠ | ١٧ | ٨٠ | العمل جاري في موقع المشروع |
| ٢٠. | تنفيذ جسر على تقاطع الفيحاء/ الزرقاء. | وزارة الأشغال | ٢٠٠٠ | ٠.٣ | ١٠ | المشروع قيد التنفيذ |
| ٢١. | تنفيذ تقاطع الركبان. | وزارة الأشغال | ٢٠٠٠ | ٩٠.٨ | ٤٠ | العمل جاري في موقع المشروع. |
| ٢٢. | مشروع انشاء واعادة تأهيل طريق الازرق / الحدود العراقية | وزارة الاشغال | ٢٠٠٠ | ٥٠.٤ | ٨٧ | العمل جاري في موقع المشروع |
| ٢٣. | مشروع تنفيذ جسر شومر | وزارة الاشغال | ١٠٠٠ | ٠ | ٥ | الدراسات والتصاميم منتهيته وتم تاجيله لعام ٢٠١٠. |
| ٢٤. | مشروع اكمال انشاء استراحات طريق الازرق | الابنية الحكومية | ٥٠٠ | ٧٦ | | |
| ٢٥. | حزمة مشاريع وزارة التربية والتعليم | وزارة التربية والتعليم | ٣٢٢٥ | ٤٠ | ٦٠ | اعمال صيانة واضافات غرف صفية. |
| ٢٦. | مشروع استصلاح الاراضي | وزارة الزراعة | ٣٠٨.٥ | ٢٧.٢ | ٦٠ | زيادة الاراضي المزروعة |
| ٢٧. | مشروع المحطة المركزية لمعالجة المياه العادمة الصناعية | وزارة البيئة | ٥١٥ | ٠.١ | | اعادة طرح العطاء |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|-------------|--------|------|----|------------------------------------|
| ٢٨. | مشاريع حزمة وزارة الصحة | وزارة الصحة | ٧١١٢.٨ | ١٠.٢ | ٤٠ | صيانة واضافات وانشاءات مراكز صحية. |
|-----|-------------------------|-------------|--------|------|----|------------------------------------|

خلاصة التقييم لأهم المشاريع التنموية والرأسمالية لمحافظة الزرقاء

مخصصات النفقات الرأسمالية للمشاريع التنموية في قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٠٩

بلغت مخصصات المشاريع الرأسمالية لمحافظة الزرقاء (١٣١٦٥٥.٨) دينار لعام ٢٠٠٩ موزعة على القطاعات وحسب الفصول للوزارات والدوائر الحكومية، في حين بلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ (٦٩٧٤٣.٠) دينار أي ما نسبته (٥٣.٠%) .

(بالآلاف دينار)

| البيان | مقدر ٢٠٠٩ | الانفاق حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ | نسبة الإنفاق الفعلي % |
|---------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| المشاريع الرأسمالية | ١٣١٦٥٥.٨ | ٦٩٧٤٣.٠ | ٥٣.٠% |

المصدر: دائرة الموازنة العامة، ٢٠٠٩.

شكل رقم (١)

ويشير توزيع مخصصات المحافظة حسب القطاعات الوظيفية إلى أن قطاع الشؤون الاقتصادية إستأثر على ما نسبته (٦٥.٨%) من إجمالي مخصصات محافظة الزرقاء لعام ٢٠٠٩ وذلك من أجل تنمية المحافظة إقتصادياً والمساهمة في تخفيض معدلات البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة من مشاريع البنية التحتية ومشاريع تعزيز الإنتاجية وتحفيز الإستثمارات المحلية، ويأتي في المرتبة الثانية قطاع الصحة والذي حاز على ما نسبته (٢٠.٨%) من إجمالي مخصصات محافظة الزرقاء وتلاه القطاعات الأخرى بنسب متقاربة كما هو واضح في الشكل رقم (٢) .

شكل رقم (٢)

وفي ما يلي تحليل موجز لأهم مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب الفصول:-

الإشغال العامة والإسكان :-

تم رصد مبلغ (٢٧٥٠٠) ألف دينار لوزارة الأشغال العامة والإسكان في محافظة الزرقاء مشكلة ما نسبته (٢٠.٩%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة وتم إنفاق

(١٨٠١٩.٦) ألف دينار أي ما نسبته (٦٥.٥%) من المخصصات المرصودة لوزارة الأشغال العامة والإسكان في المحافظة حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠، وهي من نسب الانفاق المرتفع لمثل هذا الوقت من العام. ويعزى الارتفاع الى ارتفاع نسبة الانفاق في بعض المشاريع مثل تنفيذ تقاطع الركبان وطريق الهاشمية بلعما.

التربية والتعليم :-

تم رصد مبلغ (٥٢٧٦.٩) ألف دينار أي ما نسبته (٤.٠%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ (٣١١٣.٥) ألف دينار أي ما نسبته (٥٩.٠%) من المخصصات المرصودة لوزارة التربية والتعليم في المحافظة وهي من نسب الانفاق المرتفع لمثل هذا الوقت من السنة. يعزى الارتفاع ارتفاع نسب انفاق بعض المشاريع حيث بلغت ١٠٠%.

الصحة :-

بلغ حجم المخصصات المرصودة لوزارة الصحة في المحافظة (١٧٤٤١.٣) ألف دينار مشكلة ما نسبته (١٣.٢%) من إجمالي المخصصات للمشاريع الرأسمالية في المحافظة، كما بلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ (١٠٤٥٦.٥) ألف دينار أي ما نسبته (٦٠.٠%) من مخصصات وزارة الصحة في محافظة الزرقاء، وهي من نسب الانفاق المرتفع لمثل هذا الوقت من السنة. يعزى الارتفاع ارتفاع نسب انفاق بعض المشاريع حيث بلغت ٩٠%-١٠٠%.


الوزارات والدوائر الاخرى :-

تم تخصيص مبلغ (٨١٤٣٧.٦) ألف دينار لباقي الوزارات والدوائر الحكومية او ما نسبته (٦١.٩%) من اجمالي المخصصات المرصوده للمحافظة حيث تم انفاق (٣٨١٥٣.٤) ألف دينار اي ما نسبته (٤٦.٨%) من المخصصات المرصودة للوزارات والدوائر الاخرى حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠.

وفيما يلي بطاقة وصف لأهم المشاريع التي تم تقييمها:-


بالألف دينار

١- مشروع إنشاء مبنى قصر العدل في الزرقاء

| | | |
|---|-------------------------------|----------------|
|  | ٩٠٠٠ | الكلفة الكلية: |
| | ١٨ شهراً | مدة التنفيذ: |
| ٢٧٥٠ | مخصصات عام ٢٠٠٩ : | |
| ١٢٧٦.١ | الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ | |
| %٤٦.٤ | نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ : | |
| %١٥ | نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩ : | |
| تم المباشرة بالمشروع بتاريخ ٢٠٠٩/٣/١ | سير العمل في المشروع : | |
| - | الأوامر التغييرية : | |
| %١٥ | نسبة الانجاز التراكمية | |
| المشروع يسير حسب ما هو مخطط له ولا يوجد معوقات. | تقييم المشروع : | |
| | ملاحظات : | |

بالألف دينار

٢- مشروع إنشاء مبنى قصر العدل في الرصيفة

| | | |
|--|-------------------------------|----------------|
|  | ٧٢٠٠ | الكلفة الكلية: |
| | 18 شهراً | مدة التنفيذ: |
| ١٧٥٠ | مخصصات عام ٢٠٠٩ : | |
| ٤٢٤.٢ | الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ | |
| %٢٤.٢ | نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ : | |
| %٦ | نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩ : | |
| تم احالة العطاء وتمت المباشرة بالعمل ٢٠٠٩/٣/١. | سير العمل في المشروع : | |
| - | الأوامر التغييرية : | |
| %٦ | نسبة الانجاز التراكمية | |
| المشروع يسير حسب ما خطط له. | تقييم المشروع : | |
| | ملاحظات : | |

بالألف دينار

٣- مشروع إنشاء مجمع المحاكم الشرعية / الزرقاء

| | | |
|--|----------|-----------------|
| | ١٨٥٠ | الكلفة الكلية : |
| | ٢٤ شهراً | مدة التنفيذ: |

| | | |
|---|--|--|
|  | ٦٠٠ ١٤١.١ %٢٣.٥ %١٠٠ | مخصصات عام ٢٠٠٩ : الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ : نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ : نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩ : |
| تم الانتهاء من المشروع. والمبلغ المرصود لغايات التأثيث. - %١٠٠ المشروع طور التسليم. | سير العمل في المشروع: الأوامر التغييرية : نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع : | |
| يهدف المشروع إلى تجميع المحاكم الشرعية في محافظة الزرقاء لتبسيط الرقابة القضائية والإدارية على أعمال المحاكم. | ملاحظات : | |


بالآلاف دينار

| ٤- مشروع مستشفى الزرقاء الجديد | | |
|--|--|--|
|  | ٨٠٠٠٠ ٣٦ شهراً ٩٤٠٠ ٤٩٤٩.٥ %٥٢.٧ %٢٠ | الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ : نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ : نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩ : |
| العمل جارٍ في موقع المشروع. اضافة المطبخ المركزي، المصبغة، ثلاجة حفظ الموتى، ثلاجة صيدلية، تكيف ويقدر مبلغ الاوامر التغييرية (٥) مليون دينار. %٣٣ المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات. | سير العمل في المشروع : الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية تقييم المشروع | |
| يهدف المشروع إلى نقل مستشفى الزرقاء القديم إلى المستشفى الجديد مع | ملاحظات | |

زيادة عدد الأسرة بحيث تصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى (٥٠٠) سريراً.

بالآلف دينار

٥- دعم مشاريع المجلس الاعلى للشباب

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>١٥٠٤ ١٨ شهراً ١٠٠٠ ٩٠٠ ٩٠% ٦٠%</p> | <p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:</p> |
| <p>العمل جار في موقع المشروع وينفذ حالياً من قبل شركة المشرق سبيل الهندسية. اعمال الكهرباء والميكانيك ٨٠% المشروع يسير ببطء شديد حيث بلغت نسبة الفتره المنقضيه ٨١% بعد التمديدات الزمنية التي طلبت والسبب يعود الى تغيير اكثر من مقاول.</p> | <p>سير العمل في المشروع: الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع</p> | |
| <p>-</p> | <p>ملاحظات</p> | |

بالآلف دينار

٦- مشروع طريق الهاشمية-بلعما-الزنية شاملة منطقة التوسعة

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>٧٢٢١ ٣٦ شهراً ٤٠٠٠ ٤٠٠٠ ١٠٠% ١٠٠%</p> | <p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:</p> |
|---|--|---|

| | |
|-------------------------|---|
| سير العمل في المشروع: | تم الانتهاء من المشروع. |
| الأوامر التغييرية | - |
| نسبة الانجاز التراكمية: | ١٠٠% |
| تقييم المشروع | المشروع يسير حسب المخطط له ولا يوجد معوقات. |
| ملاحظات | يربط محافظة المفرق بمحافظة الزرقاء. |

بالألف دينار

| ٧- مشروع طريق ياجوز-تقاطع القوات الخاصة | |
|---|---|
| الكلفة الكلية | ١٢٦٥٠ |
| مدة التنفيذ | ٣٦ شهراً |
| مخصصات عام ٢٠٠٩ | ١٠٠٠ |
| الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ | ٨٩٥.٢ |
| نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ | ٨٩.٥% |
| نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: | ٨٥% |
| سير العمل في المشروع: | تم الانتهاء من المشروع. العمل جاري على انارة الطريق |
| الأوامر التغييرية | - |
| نسبة الانجاز التراكمية: | ٩٥% |
| تقييم المشروع | المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات. |
| ملاحظات | - |

بالألف دينار

| ٨- مشروع تحسين تقاطعات على اتوستراد عمان-الزرقاء | |
|--|-------|
| الكلفة الكلية | ١٤٠٠٠ |

| | |
|------------------------------|---|
| مدة التنفيذ | ٣٦ شهراً |
| مخصصات عام ٢٠٠٩ | ١٠٠٠ |
| الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ | ١٠٠٠ |
| نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ | %١٠٠ |
| نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: | %١٠٠ |
| سير العمل في المشروع: | المشروع قيد التنفيذ / العمل جار في موقع المشروع |
| الأوامر التغييرية | - |
| نسبة الانجاز التراكمية: | %٩٠ |
| تقييم المشروع | المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات. |
| ملاحظات | - |

بالألف دينار

| ٩- مشروع تنفيذ طريق الزرقاء - الأزرق | |
|--------------------------------------|--|
| الكلفة الكلية | ١١٠٠٠ |
| مدة التنفيذ | ٤٨ شهراً |
| مخصصات عام ٢٠٠٩ | ١٠٠٠٠ |
| الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ | ٧١٤٢.٨ |
| نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ | %٧١.٤ |
| نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: | %٦٥ |
| سير العمل في المشروع: | العمل جار في موقع المشروع . |
| الأوامر التغييرية | تحويل الطريق من مسربين إلى أربعة مسارب مفصولين بجزيرة وسطية. |
| نسبة الانجاز التراكمية: | %٨٧ |
| تقييم المشروع | المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات. |
| ملاحظات | يهدف المشروع إلى ربط المحافظات والمناطق السياحية من خلال شبكة طرق بمستوى فني عالي. |

بالآلف دينار

١٠- مشروع تنفيذ طريق الزرقاء - بيرين


| | |
|--|------------------------------|
| ٦٥٠٠ | الكلفة الكلية |
| ٢٤ شهراً | مدة التنفيذ |
| ١٠٠٠ | مخصصات عام ٢٠٠٩ |
| ٥٢٢.٥ | الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ |
| %٥٢.٢ | نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ |
| %٥٠ | نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: |
| تم الانتهاء من المشروع. | سير العمل في المشروع : |
| - | الأوامر التغييرية |
| %١٠٠ | نسبة الانجاز التراكمية: |
| المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات. | تقييم المشروع |
| - | ملاحظات : |

بالآلف دينار


١١- مشروع إنشاء مركز للمعوقين / الضليل

| | | |
|---|--|------------------------------|
|  | ١٤٠٠ | الكلفة الكلية |
| | ٢٤ شهراً | مدة التنفيذ |
| | ٣٩٤.١ | مخصصات عام ٢٠٠٩ |
| | ١٢٩.٠ | الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ |
| | %٣٢.٧ | نسبة الإنفاق من المخصص |
| | %٣٥ | ٢٠٠٩ |
| | تم الانتهاء من المشروع وتم استلامه أولاً. | نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: |
| | المبلغ المرصود في قانون الموازنة لتأنيث وتجهيز المركز. | سير العمل في المشروع: |
| | %١٠٠ | الأوامر التغييرية |
| | يسير حسب المخطط له | نسبة الانجاز التراكمية: |
| | | تقييم المشروع |
| يهدف المشروع إلى إيواء وتأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة حيث قدرت نسبة الاعاقة في الزرقاء (٤%) من عدد السكان. | | ملاحظات |

بالآلف دينار

| ١٢ - مشروع إنشاء طابق اضافي لمركز أسامة بن زيد | | |
|--|--|---|
|  | ٢٩٥ ٢٤ شهراً ٩٤ ١.٤ ١.٥ % % | الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: |
| تم الانتهاء من المشروع وتم استلامه أولياً. المبلغ المرصود لغايات التأثيث الطابق الجديد - ١٠٠ % المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات. | | سير العمل في المشروع: الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع ملاحظات |
| | - | |

بالآلف دينار

| ١٣ - مشروع إكمال مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي | | |
|---|---|---|
|  | ٦٠٠٠ ٩٦ شهراً ٢٠٠ ٣٧.٧ ١٨.٩ % ٢٢ % | الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: |
| - تم الانتهاء من تنفيذ المشروع وتم تسليم المبنى، تم طرح عمل دراسات لقطعة الارض المستملكه المجاوره للمركز لانشاء مواقف ومسرح واسوار. - ١٠٠ % | | سير العمل في المشروع: الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: |

| | |
|--|---------------|
| المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات. | تقييم المشروع |
| يهدف المشروع إلى تفعيل النشاطات الفنية والثقافية في محافظة الزرقاء وإظهار معالم الحضارة الأردنية العربية في إقليم الوسط. | ملاحظات |

بالألف دينار

| ١٤- مشروع البنية التحتية لمدينة خادم الحرمين | |
|---|------------------------------|
| ٤٠٠٠٠ | الكلفة الكلية |
| ٣٦ شهراً | مدة التنفيذ |
| ٤٠٠٠٠ | مخصصات عام ٢٠٠٩ |
| ٢١٣١٩ | الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ |
| ٥٣.٣% | نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ |
| % | نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: |
| تم انجاز البنية التحتية المؤدية الى طريق مدينة خادم الحرمين | سير العمل في المشروع: |
| - | الأوامر التغييرية |
| ٣٥% | نسبة الانجاز التراكمية: |
| المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات. | تقييم المشروع |
| - | ملاحظات: |

بالألف دينار

| ١٥- مشروع اعادة تنظيم وتطوير مدينة الزرقاء | |
|--|------------------------------|
| ٦٥٠٠ | الكلفة الكلية |
| ٢٤ شهراً | مدة التنفيذ |
| ١٠٠٠٠ | مخصصات عام ٢٠٠٩ |
| ١٦١ | الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ |
| ١.٦% | نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ |
| ٥٠% | نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: |
| . | سير العمل في المشروع: |
| - | الأوامر التغييرية |
| ١٠٠% | نسبة الانجاز التراكمية: |
| المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات. | تقييم المشروع |
| - | ملاحظات: |

بالألف دينار

١٦- مشروع حزمة الامان الاجتماعي

| | |
|--|------------------------------|
| ٦٥٠٠ | الكلفة الكلية |
| ٢٤ شهراً | مدة التنفيذ |
| ٩٧٥ | مخصصات عام ٢٠٠٩ |
| ٣٣٧ | الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ |
| ٣٤.٦% | نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ |
| ٥٠% | نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: |
| تشير نسبة الانفاق الى ان المشروع يسير حسب النسب المستهدفة للانفاق. | سير العمل في المشروع : |
| - | الأوامر التغييرية |
| ٥٠% | نسبة الانجاز التراكمية: |
| المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات. | تقييم المشروع |
| - | ملاحظات : |

بالآلف دينار

١٧- مشروع تعزيز الانتاجية

| | |
|--|------------------------------|
| ٦٥٠٠ | الكلفة الكلية |
| ٢٤ شهراً | مدة التنفيذ |
| ٢٥٩٥ | مخصصات عام ٢٠٠٩ |
| ٩١٦ | الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ |
| ٣٥.٣% | نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ |
| ٥٠% | نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: |
| تشير نسبة الانفاق الى ان المشروع يسير حسب النسب المستهدفة للانفاق. | سير العمل في المشروع : |
| - | الأوامر التغييرية |
| ٥٠% | نسبة الانجاز التراكمية: |
| المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات. | تقييم المشروع |
| - | ملاحظات : |

بالآلف دينار

١٨- مشروع اكمال طريق ياجوز / الرصيفه

| | |
|------------------------|------------------------------|
| ٦٥٠٠ | الكلفة الكلية |
| ٢٤ شهراً | مدة التنفيذ |
| ٥٠٠ | مخصصات عام ٢٠٠٩ |
| ٣٤٨.٢ | الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ |
| ٦٩.٦% | نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ |
| ٥٠% | نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: |
| العمل جاري في المشروع. | سير العمل في المشروع : |

| | |
|--|---|
| - | الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع |
| ٧٠% | |
| المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات. | |
| - | ملاحظات : |

بالآلف دينار

| ١٩- مشروع طريق الربط لمستشفى الزرقاء الجديد | |
|---|------------------------------|
| ٦٥٠٠ | الكلفة الكلية |
| ٢٤ شهراً | مدة التنفيذ |
| ٢٠٠٠ | مخصصات عام ٢٠٠٩ |
| ٣٤٠ | الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ |
| ١٧% | نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ |
| ٥٠% | نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: |
| العمل جاري في موقع المشروع. | سير العمل في المشروع : |
| - | الأوامر التغييرية |
| ٨٠% | نسبة الانجاز التراكمية: |
| المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات. | تقييم المشروع |
| - | ملاحظات : |

بالآلف دينار

| ٢٠- مشروع جسر تقاطع الفيحاء / الزرقاء | |
|--|------------------------------|
| ٧٠٠٠ | الكلفة الكلية |
| ٣٦ شهراً | مدة التنفيذ |
| ٢٠٠٠ | مخصصات عام ٢٠٠٩ |
| ٥.٦ | الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ |
| ٠.٣% | نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ |
| % | نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: |
| المشروع قيد التنفيذ | سير العمل في المشروع : |
| - | الأوامر التغييرية |
| ١٠% | نسبة الانجاز التراكمية: |
| المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات. | تقييم المشروع |
| - | ملاحظات : |

بالآلف دينار

| ٢١- مشروع تنفيذ تقاطع الركبان | |
|-------------------------------|-----------------|
| ٤٠٠٠ | الكلفة الكلية |
| ٣٦ شهراً | مدة التنفيذ |
| ٢٠٠٠ | مخصصات عام ٢٠٠٩ |

| | |
|--|------------------------------|
| ١٨١٥.٣ | الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ |
| %٩١ | نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ |
| %٧٥ | نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: |
| المشروع قيد التنفيذ. | سير العمل في المشروع : |
| - | الأوامر التغييرية |
| %٤٠ | نسبة الانجاز التراكمية: |
| المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات. | تقييم المشروع |
| - | ملاحظات : |

بالآلف دينار

| ٢٢- مشروع انشاء واعادة تاهيل طريق الازرق / الحدود العراقية | |
|--|------------------------------|
| ٦٥٠٠ | الكلفة الكلية |
| ٢٤ شهراً | مدة التنفيذ |
| ٢٠٠٠ | مخصصات عام ٢٠٠٩ |
| ١٠٠٧ | الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ |
| %٥٠.٤ | نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ |
| %٥٠ | نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: |
| العمل جاري في موقع المشروع. | سير العمل في المشروع : |
| - | الأوامر التغييرية |
| %٨٧ | نسبة الانجاز التراكمية: |
| المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات. | تقييم المشروع |
| - | ملاحظات : |

بالآلف دينار

| ٢٣- مشروع تنفيذ جسر شومر | |
|---|------------------------------|
| ٦٥٠٠ | الكلفة الكلية |
| ٢٤ شهراً | مدة التنفيذ |
| ١٠٠٠ | مخصصات عام ٢٠٠٩ |
| ٠ | الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ |
| %٠ | نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ |
| %٠ | نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: |
| الانتهاء من الدراسات والتصميم وتم تأجيله لعام ٢٠١٠. | سير العمل في المشروع : |
| - | الأوامر التغييرية |
| %٥ | نسبة الانجاز التراكمية: |
| المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات. | تقييم المشروع |
| - | ملاحظات : |

بالآلف دينار

٢٤- مشروع اكمال انشاء استراحات طريق الازرق

| | |
|--|------------------------------|
| ٦٥٠٠ | الكلفة الكلية |
| ٢٤ شهراً | مدة التنفيذ |
| ٥٠٠ | مخصصات عام ٢٠٠٩ |
| ٣٨٠.٧ | الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ |
| ٧٦% | نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ |
| ٥٠% | نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: |
| . | سير العمل في المشروع : |
| - | الأوامر التغييرية |
| % | نسبة الانجاز التراكمية: |
| المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات. | تقييم المشروع |
| - | ملاحظات : |

بالألف دينار

٢٥- حزمة مشاريع وزارة التربية

| | |
|--|------------------------------|
| ٣٢٢٥ | الكلفة الكلية |
| ٢٤ شهراً | مدة التنفيذ |
| ٣٢٢٥ | مخصصات عام ٢٠٠٩ |
| ١٢٩٤.٦ | الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ |
| ٤٠% | نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ |
| ٤٠% | نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: |
| تمثل اعمال صيانة واطافات غرف صفية وصالات رياضية وتأثيث وتجهيز المدارس، انشاء مدرسة حي الزواهر ٩٥%، صيانة شاملة لمدرسة سمرقند وطارقومدرسة عكرمة والهاشمية ٦٥%، المقريزي ٧٠%المغير ابن شعبة واسماء بنت بكر ١٠%، هارون الرشيد وعاتكة وهندبنت امية ٧٥%. | سير العمل في المشروع : |
| - | الأوامر التغييرية |
| ٦٠% | نسبة الانجاز التراكمية: |
| المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات. | تقييم المشروع |
| - | ملاحظات : |

بالألف دينار

٢٦- مشروع استصلاح الاراضي

| | |
|---|------------------------------|
| ٦٥٠٠ | الكلفة الكلية |
| ٢٤ شهراً | مدة التنفيذ |
| ٣٠٨.٥ | مخصصات عام ٢٠٠٩ |
| ٨٤ | الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ |
| ٢٧.٢% | نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ |
| ٥٠% | نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: |
| يهدف المشروع الى زيادة الاراض المزروعة بالمحافظة واستصلاح الاراضي الجبلية. | سير العمل في المشروع : |

| | |
|---|--|
| الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع | - ٦٠% المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات. |
| ملاحظات : | - |

بالآلف دينار

| ٢٧- مشروع المحطة المركزية لمعالجة المياه العادمة الصناعية | |
|--|---|
| الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع : الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع | ٦٥٠٠ ٢٤ شهراً ٥١٥ ٠.٥ ٠.١% % تم اعادة طرح العطاء - % المشروع لا يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات. |
| ملاحظات : | - |

بالآلف دينار

| ٢٨- مشاريع حزمة وزارة الصحة | |
|--|--|
| الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع : الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع | ٧١١٢.٨ ٢٤ شهراً ٧١١٢.٨ ٧٢٣.٥ ١٠.٢% ٤٠% تمثل مشاريع صيانة واطافات انشاء مركز صحية وتوسعة المستشفيات تحديث وتطوير الاجهزة والمعدات الصحية. مثل مركز صحي القادسية ٢٥%، مركز صحي اسكان الامير طلال ٩٠%. - ٤٠% المشاريع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات. |
| ملاحظات : | - |

نظرة سريعة حول الإنجازات التنموية في محافظة الزرقاء

نورد فيما يلي تحليلاً موجزاً لأبرز الإنجازات في محافظة الزرقاء وفقاً للقطاعات الاقتصادية :-

أولاً: البنية التحتية والخدمات الحكومية الأساسية:

(١) الأشغال العامة والإسكان:

تقوم مديرية الأشغال العامة بمحافظة الزرقاء بالعديد من المهام منها :

- توفير خلطات ساخنة للطرق النافذة
- الإشراف على مشاريع الإسكان الفقيرة
- تنفيذ توسعة جسر سكة الهاشمية - بلعما
- تحسين و إعادة تأهيل طريق الزرقاء - الأزرق - العقد (٤)
- تنفيذ تقاطعات أوتوستراد عمان - الزرقاء.
- إنشاء و صيانة الطرق.

والجدول التالي يبين أطوال الطرق الداخلية الرئيسية والثانوية والقروية والزراعية المعبدة.
الجدول رقم (١-١)

أنواع الطرق الداخلية وأطوالها

| نوع الطريق | طول الطريق (كم) |
|------------|-------------------|
| رئيسية | ٣٠٣ |
| ثانوية | ١٤٩ |
| قروية | ١٥٠ |
| زراعية | ٦٥٠ |
| المجموع | ١٢٥٢ |

المصدر :- مديرية الأشغال العامة، ٢٠٠٧.

وترتبط محافظة الزرقاء مع المحافظات المجاورة بشبكة من الطرق الرئيسية المعبدة، وتعتبر هذه الطرق عنصراً مهماً في حركة الأفراد والبضائع والخدمات.

(٢) المياه والري والسدود:

يبلغ معدل هطول الأمطار السنوي في المحافظة حوالي (٢٠٠) ملم حيث تبلغ نسبة المخدومين بالمياه ما يقارب (٩٨%) من إجمالي السكان.
ويبلغ عدد الآبار (٣٢٠) بئراً، بالإضافة إلى (٣) ينابيع، وتبلغ حصة الفرد من التزويد المائي حوالي (١٢٨) لتر/يوم.
ويشكل عدد السكان المشمولين بخدمة الصرف الصحي ما نسبته (٨٠.٠%) من إجمالي سكان المحافظة.

الجدول رقم (٢-١)

التزويد المائي السنوي من الآبار الحكومية حسب الغرض

| نوع الاستخدام | كمية التزويد السنوي (مليون م ^٣) |
|---------------|--|
| منزلي | ٤٤.٦ |
| المجموع | ٤٤.٦ |

المصدر الإحصاءات العامة، التقرير السنوي ٢٠٠٧.

(٣) قطاع الكهرباء:

تم تغذية محافظة الزرقاء بالتيار الكهربائي من مصدرين رئيسيين هما محطة تحويل الحسين الحرارية ومحطة تحويل العبدلي الرئيسية وتعتبر جميع مناطق المحافظة مخدومة بشبكة الكهرباء. حيث تصل نسبة المخدومين الى ١٠٠% من خلال ١٠٨٠ محطة تحويل.

(٤) البريد والاتصالات:

تغطي الخدمة الهاتفية جميع التجمعات السكانية في المحافظة وذلك من خلال (٦) مقاسم رئيسية يتبع لها (٩) مقاسم فرعية موزعة على مناطق المحافظة، كما وتغطي الخدمات البريدية معظم مناطق المحافظة وذلك من خلال (٢٠) مكتبا بريديا.

(٥) النقل والمواصلات العامة:

تتوفر في محافظة الزرقاء وسائل نقل عامة وخاصة تعمل على الخطوط الداخلية والخارجية لخدمة سكان المحافظة، كما تم إحالة مشروع القطار الكهربائي الخفيف حيث يبلغ طول خط القطار (٢٧) كم وتصل سرعة القطار إلى (٩٠) كم/ساعة وبمعدل (٧٨) رحلة يوميا ذهاباً وإياباً ومن المتوقع أن ينقل (١٠٠) ألف راكب يوميا .

ثانياً: التنمية الاجتماعية والموارد البشرية:

(١) قطاع الصحة:

شهد القطاع الصحي خلال السنوات الماضية تطوراً ملموساً، أدى إلى تحسين المؤشرات الصحية في المحافظة، حيث شملت الخدمات الصحية تقريباً أغلب مناطق المحافظة، وتتوفر هذه الخدمات من خلال مديرية الصحة والمراكز الصحية والعديد من المستشفيات الحكومية والخاصة حيث يوجد في المحافظة (٨) مستشفيات منها (٦) للقطاع الخاص وهناك مستشفى يتبع للخدمات الطبية الملكية وهو مستشفى الأمير هاشم بن الحسين ومستشفيان يتبعان لوزارة الصحة هما مستشفى الأمير فيصل بن الحسين ومستشفى الزرقاء الحكومي، حيث بلغ عدد الاسرّة في مستشفيات المحافظة (٩٤٧) سرير، وبلغ معدل اشغال هذه الاسرّة (٨٥%)، والجدول التالي يبين عدد المرافق الصحية والكوادر الطبية.

الجدول رقم (٢-١)

البيانات الاحصائية لقطاع الصحة في محافظة الزرقاء

| المجموع على مستوى المحافظة | قطاع الصحة | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| ٨ | عدد المستشفيات | |
| ٩٤٧ | عدد الاسرة | |
| ٦ | شامل | عدد المراكز الصحية |
| ٢٩ | أولي | |
| ٦ | فرعي | |
| ٤١ | المجموع | |
| ٣٥ | عدد مراكز الامومة والطفولة | |
| ١٠ | مختبر | عدد المختبرات |
| ٤٠ | اشعة | |
| ٢٣ | اسنان | عيادات الاسنان |
| ٢٦٦ | خاصة | عدد الصيدليات |
| ٤٢ | حكومي | |
| ٣٠٨ | المجموع | |
| ١٠٢ | طبيب عام | |
| ١٤١ | طبيب اختصاص | |
| ٤٣ | طبيب اسنان | |
| ١٥ | صيدلي | |

| | | | | | | | |
|------|------|------|--------|-------|-------|------|---------------|
| ٣٦.١ | ٦٣.٩ | ٢١.٩ | ٧٤٣٣٩ | ٧٤٥١٦ | ٤٢٨٧ | ٢٥١٧ | قصة الزرقاء |
| | | ٢٥.٣ | ٤١٢٠٠ | ٤٢٩٠٥ | ٢١٧٦ | ١١٤٧ | الرصيفة |
| | ١٠٠ | ٢٣ | ٢٣٢٩٦٠ | | ١٠١٢٧ | | المجموع الكلي |

المصدر :- دائرة الاحصاءات العامة / الكتاب الاحصائي السنوي ٢٠٠٧

ب) التعليم العالي:

يحظى التعليم العالي في محافظة الزرقاء باهتمام كبير، حيث يوجد في المحافظة جامعتان واحدة خاصة وهي جامعة الزرقاء الأهلية وجامعة حكومية هي الجامعة الهاشمية، أما كليات المجتمع فيوجد في المحافظة (٦) كليات هي كلية الزرقاء الحكومية، معهد المهن الطبية المساندة، كلية رفيعة للتدريب، كلية الزرقاء الأهلية، كلية المجتمع الإسلامي وكلية قرطبة للبنات.

٢) التنمية الاجتماعية:

تهدف التنمية الاجتماعية إلى تنمية الإنسان وتأهيله وتفعيل قدراته باعتباره محور التنمية ومحركها وهدفها ويناط بهذا القطاع دورا مهما لوجود مديريتين للتنمية الاجتماعية (إحداهما في الزرقاء والثانية في الرصيفة) يتفرع عنهما عدة مكاتب ومراكز منتشرة في جميع أرجاء المحافظة، وتقوم هاتان المديريتان بالتعاون والتنسيق مع المكاتب والمراكز التابعة لهما بتقديم العديد من الخدمات التي تهدف من خلالها إلى تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمل على وحدة وتماسك المجتمع بشكل عام. وتقدم خدمات الرعاية الاجتماعية للمواطنين في المحافظة من خلال:-

أ) **صندوق المعونة الوطنية** :- يقدم الصندوق عدداً من الخدمات مثل معونة نقدية متكررة وتأهيل جسماني وغيرها من الخدمات التي يقدمها الصندوق، ويبلغ عدد الاسر المحتاجة في محافظة الزرقاء (٧٥٥٧) اسره اي ما نسبته ١١.٥% من الاسر المحتاجة في المملكة حسب التقرير السنوي لصندوق المعونة الوطنية ٢٠٠٦.

ب) **الصندوق الأردني الهاشمي** :- يقوم الصندوق بمجموعة من النشاطات تشمل التنقيف الأسرى، والدورات التدريبية، وتقديم خدمات أمومة وطفولة ومشاركة فاعلة مع المجتمع المحلي.

٤) قطاع العمل والتدريب المهني:

أ) العمل:

بلغت نسبة المشتغلين والناشطين إقتصادياً في المحافظة (٣٩.٦%) من إجمالي سكان المحافظة، حيث بلغت نسبة الناشطين إقتصادياً من الذكور (٦٧.٠%) ومن الإناث (١١.٣%) من إجمالي المشتغلين، في حين بلغ معدل البطالة للمحافظة (١١.٣%) منهم (٩.٠%) ذكور و (٢٥.١%) إناث من إجمالي العاطلين عن العمل في المحافظة

عام ٢٠٠٧ حسب إحصائيات دائرة الإحصاءات العامة ، الكتاب الإحصائي السنوي ٢٠٠٧.

(ب) التدريب المهني:

تسعى مؤسسة التدريب المهني في محافظة الزرقاء إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية على مهن تمكنها من ولوج سوق العمل بكفاءة عالية حيث تضم مديريات التدريب المهني في محافظة الزرقاء عدة مراكز وهي :-

- مركز الهاشمية.
- مركز ياجوز.
- مركز السواقين.
- مركز إناث الزرقاء.

(٥) قطاع الثقافة والرياضة والشباب

يساهم هذا القطاع بتوفير المرافق الرياضية والثقافية المختلفة، بالإضافة إلى دوره في إقامة الأنشطة الرياضية والثقافية التي تساهم في تطوير الحركة الرياضية والثقافية في المحافظة.

(٦) الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية:

يعتبر قطاع الأوقاف من القطاعات الاجتماعية الهامة في محافظة الزرقاء ويساهم بشكل فاعل بتوفير دور العبادة وتعيين الأئمة والوعاظ في المساجد والتركيز على المواقع الدينية، حيث يبلغ عدد المساجد في المحافظة (٥٨١) مسجداً، كما تضم محافظة الزرقاء عدد من المراكز الثقافية الإسلامية ودور القرآن النموذجية، أما عدد المؤذنين والوعاظ والأئمة فيبلغ (١٢٣١) موظف. ويبين الجدول التالي عدد المساجد والوعاظ والأئمة في المحافظة.

الجدول رقم (٢-٥)

عدد المساجد والوعاظ في محافظة الزرقاء

| العدد | على مستوى المحافظة |
|--------------------|--------------------|
| المساجد | ٥٨١ |
| الواعظات والمرشدات | ٣٦ |
| الوعاظ والأئمة | ٢٠٧ |

ثالثا: التنمية الاقتصادية:**(١) الزراعة:**

الزراعة كانت السمة الأبرز في تاريخ الزرقاء ، فقد كان لتوافر المياه وخصوبة الأراضي في كثير من مناطقها شجع الكثيرين لاختيار الزرقاء مكانا للسكن والاستقرار، فمن واحات الأزرق ذات المياه والينابيع العذبة إلى متنزهات الرصيفة ومزارع السخنة وسيل الزرقاء، والغابات الحرجية غربا، وساعد أيضا في جذب أصحاب الثروة الحيوانية من القبائل البدوية التي حافظت على رعي الماشية في المناطق الشاسعة من الزرقاء شرقا حتى الأزرق وحتى بيرين والمسرات والعالوك غربا، وفي محيط حوض سيل الزرقاء وعلى إمتداده، ويبين الجدول المساحات المزروعة للمحاصيل الزراعية المختلفة.

**الجدول رقم (٣-١)
المساحات المزروعة حسب نوع المحاصيل**

| نوع المحصول | المساحات المزروعة (دونم) |
|----------------|---------------------------|
| محاصيل حقلية | ٢٨٦١٤ |
| أشجار مثمرة | ٥١٥٨٥ |
| الخضروات | ٢٤١٠٦ |
| المجموع | ١٠٤٣٠٥ |

المصدر :- الإحصاءات العامة / التقرير السنوي، ٢٠٠٦.

وبالنسبة للثروة الحيوانية فقد تم إجراء تعداد عام للمواشي بتاريخ ١/١١/٢٠٠٧م في جميع مناطق المحافظة ويبين الجدول التالي أنواع الثروة الحيوانية وعددها.

الجدول رقم (٣-٢)**الثروة الحيوانية**

| النوع | ضان | ماعز | أبقار |
|-------|--------|-------|-------|
| العدد | ١٣٥٩٧٠ | ٤٥٤١٠ | ٣٨٣٧٠ |

المصدر :- دائرة الإحصاءات العامة / الكتاب الإحصائي السنوي، ٢٠٠٧.

(٢) السياحة والآثار:

يعتبر قطاع السياحة من القطاعات الإنتاجية المهمة في المحافظة والذي لا يقتصر تأثيره على الجانب الاقتصادي فحسب بل يشمل الجانب الاجتماعي والثقافي. وتضم محافظة الزرقاء العديد من المواقع الأثرية والمهمة التي تغطي كافة مراحل الحضارة الإنسانية عبر العصور.

الجدول رقم (٣-٣)

أهم المواقع السياحية والأثرية في محافظة الزرقاء

| المواقع الأثرية | المواقع السياحية | النوع |
|-----------------|---------------------------|-------|
| قصر شبيب | البرك الرومانية | |
| قصر الحلابات | مياه ساخنة/الأزرق الجنوبي | |
| القصر الأحمر | محمية الشومري | |
| قصر السل | الأزرق الجنوبي | |
| قصير عمرة | وادي رجل ومواقع القصور | |
| قصر الماخونة | الحجرية في الصحراء شرق | |

| | | |
|------------------|--------|--|
| قصر العويند | الأزرق | |
| جبل الرحيل | | |
| جبل المطوق | | |
| جبل الباكية | | |
| تل البيرة | | |
| تل السخنة | | |
| قلعة الأزرق | | |
| خربة خو | | |
| خربة زوبيا | | |
| خربة البتراوي | | |
| خربة الهاشمية | | |
| خربة الرصيفة | | |
| خربة أبو الزيغان | | |
| خربة المكحول | | |
| خربة المسرة | | |
| خربة الجاموس | | |
| القنية | | |
| الحسينية | | |
| صروت | | |
| جربية | | |
| مقام عيسى | | |
| غريسا | | |
| حمام الصراح | | |
| رجم المخيزان | | |

المصدر :- مديرية السياحة والآثار، ٢٠٠٦م.

(١) قطاع الصناعة والتعدين:

يقدر عدد منشآت الصناعة والتعدين في محافظة الزرقاء (٤٢٣١) منشأة وهي الأعلى من بين جميع الأنشطة الاقتصادية ويلبها النقل والإتصالات والإنشاءات والزراعة.

مطالب واحتياجات محافظة الزرقاء

١- اعادة تأهيل مداخل الزرقاء: طريق الزرقاء السخنة جرش.

- ٢- اعادة تأهيل مداخل الزرقاء : دوار الجيش (الشعلة سابقا).
- ٣- تكملة طريق الزرقاء _ الازرق.
- ٤- انشاء جسور مشاه على الاتوستراد.
- ٥- تزويد مبنى محافظة الزرقاء بمولد كهربائي احتياطي.
- ٦- انارة طريق خو _ المصفاة _ الهاشمية.
- ٧- صيانة واعادة تأهيل اوتوستراد عمان _ الزرقاء.
- ٨- انارة طريق ياجوز.
- ٩- صيانة شارع الملكة نور (طريق المصفاة).
- ١٠- صيانة الطريق الرابط بين الهاشمية والسخنة.
- ١١- انشاء جسر بين طريق السخنة - خريسان وطريق الزرقاء - جرش
- ١٢- سيارة اسعاف لمركز صحي الحلابات الشرقي.
- ١٣- سيارة اسعاف لمركز صحي الازرق.
- ١٤- مشروع القطار الخفيف بين الزرقاء وعمان.
- ١٥- تطوير التزويد المائي في محافظة الزرقاء (المشروع الياباني المرحلة الثانية).
