

محافظة المفرق

# محافظة المفرق

## لمحة عامة:



عرفت المفرق سابقاً بإسم الفدين أي القصر المشيد ومازالت آثار هذا القصر باقية شمال شرق مستشفى المفرق الحكومي الحالي، وقد اكتشف في هذا الموقع آثار تعود إلى الحقب البرونزية واليونانية والرومانية والأموية ، وقد سميت لاحقاً بالمفرق لوقوعها على مفترق الطرق الدولية التي تربط الأردن مع كل من سوريا والعراق والسعودية .

## التضاريس والمناخ:

تتكون تضاريس المحافظة من أراضي منبسطة خالية من العوائق الطبيعية ، كما تحتوي المحافظة على ثروات طبيعية مثل التّف البركاني والزيولايت والبوزلانا والبازلت والحجر الجيري التي تدخل في عدة صناعات مثل الإسمنت والدهانات والزجاج والإسمنت الأبيض، ويسود أرجاء المحافظة المناخ الصحراوي حيث تقع في المنطقة الجافة ويسود الطقس الحار والجاف صيفاً والبارد شتاءً، وتعتبر المنطقة الغربية من المحافظة أكثر تساقطاً للأمطار ويبلغ معدل درجة الحرارة في الصيف (٣٢) درجة مئوية و في الشتاء يبلغ (٦.٥) درجة مئوية . كما أن معدل هطول الأمطار السنوي لا يزيد عن (٢٠٠) ملم، ومن أهم الأحواض المائية فيها هو حوض الضليل والعاقب وسما السرحان.

## الموقع والمساحة:

تقع المحافظة في الشمال الشرقي من المملكة، وتبلغ مساحة محافظة المفرق (٢٦٥٤١) كم٢، وتشكل ما نسبته (٢٩.٩%) من مجموع مساحة المملكة، وتشكل منطقة البادية الشمالية الغالبية العظمى منها، وتعتبر ثاني محافظات المملكة من حيث المساحة، وإن إتساع رقعتها الجغرافية أدى إلى انتشار تجمعاتها السكانية وتباعدها عن بعضها البعض، واكتسبت المحافظة أهميتها الإستراتيجية لوقوعها على مفترق الطرق الدولية، حيث تربط المملكة مع الجمهورية العراقية من خلال مركز حدود الكرامة والذي يبعد عن مركز المحافظة (٢٨٥) كم، بالإضافة إلى وجود مركز حدود جابر والذي يربط المملكة مع الجمهورية السورية والذي يبعد عن مركز المحافظة حوالي (٢٠) كم.

## الواقع السكاني والكثافة السكانية:

بلغ عدد سكان محافظة المفرق (٢٦٩٠٠٠) نسمة لعام ٢٠٠٧ أي ما نسبته (٤.٧%) من سكان المملكة، وتبلغ الكثافة السكانية (١٠) شخص/كم<sup>٢</sup>، وبلغت نسبة الذكور (٥١.٨%) في حين بلغت نسبة الإناث (٤٨.٢%)، وأن نسبة السكان في الريف (٦٠.٨%) في حين بلغت نسبة سكان الحضر (٣٩.٢%) والجدول التالي يبين توزيع السكان حسب الجنس واللواء والكثافة السكانية في محافظة المفرق :-

### الجدول رقم (١)

#### التوزيع السكاني حسب الجنس واللواء والكثافة السكانية في محافظة المفرق

معدل الكثافة السكانية فرد/كم <sup>٢</sup>	النسبة %	المساحة كم <sup>٢</sup>	النسبة من المحافظة %	عدد السكان (نسمة)		اللواء
				ذكور	إناث	
١٨٧	٢.٣	٦٠٠.٣٦	٤١.٧	٥٤٢٩٠	٥٧٧٦٠	قصبية المفرق
١٧	١٣.٨	٣٦٥١.٠	٢٣.٦	٣٠٨٩٠	٣٢٦٨٠	البادية الشمالية
١٢٤	٢.٥	٦٦٨.٥٨	٣٠.٧	٤٠٠٢٠	٤٢٥٦٠	البادية الشمالية الغربية
٠.٥	٨١.٤	٢١٦٢١.٥	٤.٠	٤٤٠٠	٦٤٠٠	لواء الرويشد
١٠	١٠٠	٢٦٥٤١	١٠٠	٢٦٩٠٠٠		المجموع

المصدر :- دائرة الإحصاءات العامة، ٢٠٠٧.

## التقسيمات الإدارية:

تتضمن المحافظة أربعة ألوية و(١٠) أفضية وهي:-

أولاً : لواء قصبية المفرق :

- مركز اللواء
- قضاء بلعما
- قضاء المنشية
- قضاء ارحاب

ثانياً : لواء البادية الشمالية :

- مركز اللواء
- قضاء صبحا
- قضاء أم الجمال
- قضاء دير الكهف
- قضاء أم القطين

ثالثاً : لواء البادية الشمالية الغربية

- مركز اللواء
- قضاء حوشا

- قضاء سما السرحان
- قضاء الخالدية

رابعاً : لواء الرويشد

الخارطة رقم (١)

خارطة محافظة المفرق حسب الأولوية والقرى



## أبرز المشاريع الرأسمالية لمحافظة المفرق

(بالألف دينار)

الرقم	اسم المشروع	الجهة المنفذة	مخصصات ٢٠٠٨	نسبة الإنفاق %	نسبة الإنجاز %	الملاحظات
	مجموع المشاريع الرأسمالية للمحافظة منها المشاريع التالية		٣٧٨١٧.٥	٨٧.٤		
١.	البنية التحتية لمنطقة المفرق-منطقة الحسين بن طلال الاقتصادية.	وزارة المالية	٢٠٠٠٠	٨٩.٦	٨٥	البنية التحتية تسير بالشكل المطلوب في حين أن الاسثمارات والمدن الاسكانية لا تسير بالتوازي.
٢.	إسكان الأسر الفقيرة.	وزارة الأشغال	٤٩.٩	١٠٠	١٠٠	المشروع يسر حسب المخطط له.
٣.	مستشفى البادية الشمالي.	وزارة الصحة	٥٠	٦٠.٨	٥	المشروع دون المستوى المطلوب.
٤.	إنشاء مستشفى المفرق.	الخدمات الطبية	٢٠٠٠	٥.٧	٥	المشروع دون المستوى المطلوب.
٥.	إنشاء نفق جامعة آل البيت على طريق بغداد.	وزارة الأشغال	١٥٠٠	١٠٠	٥٥	المشروع يسير حسب المخطط.
٦.	إنشاء طريق المفرق-الصفراوي.	وزارة الأشغال	٥٠٠	١٠٠	١٠٠	المشروع جاهز للاستلام.
٧.	طريق إربد - المفرق.	وزارة الأشغال	١٠٠٠	١٠٠	١٠	تم طرح العطاء ومن المتوقع البدء بالتنفيذ في الربع الأول من هذا العام.
٨.	إنشاء واعادة تأهيل طريق الأزرق-الحدود العراقية.	وزارة الأشغال	١٠٠٠	٩٩.٩	١٠	تم إحالة العطاء من المتوقع البدء في تنفيذ المشروع.
٩.	تنفيذ طريق بديل لطريق الزبيدية .	وزارة الأشغال	١٠٠٠	١٠٠	١٠٠	المشروع في مراحل الاستلام.
١٠.	القرى الحضرية	وزارة الأشغال	-	-	-	المشروع يسير حسب المخطط له.
١١.	إنشاء مركز للمعوقين/الصالحية.	وزارة التنمية الاجتماعية	٦١٠	٦٤.٦	٩٥	المشروع في المراحل النهائية.
١٢.	إنشاء مركز للمعوقين/الرويشد	وزارة التنمية	٦٦٥	٩٨.٥	٦٠	المشروع يسير حسب المخطط له.

## خلاصة التقييم لأهم المشاريع التنموية والرأسمالية لمحافظة المفرق

### مخصصات النفقات الرأسمالية للمشاريع التنموية في قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٠٨

قدرت النفقات الرأسمالية للمشاريع التنموية لمحافظة المفرق (٣٧٨١٧.٥) ألف دينار لعام ٢٠٠٨ موزعة على مختلف القطاعات وحسب الفصول للوزارات والدوائر الحكومية، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ (٣٣٠٦٩.٤) ألف دينار أي ما نسبته (٨٧.٤%) وهي نسبة ضمن المستوى المستهدف، مع ملاحظة أنه تم رصد مبلغ (٢٠) مليون دينار لمشروع البنية التحتية لمنطقة المفرق وإربد - منطقة الحسين بن طلال الإقتصادية - من ضمن مخصصات محافظة المفرق ، حيث تم إنفاق ما نسبته (٨٩.٦%) من مخصص المشروع لعام ٢٠٠٨، كما هو واضح في الشكل رقم (١).


(بالآلاف دينار)

البيان	مقدر ٢٠٠٨	الإنفاق حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	نسبة الإنفاق الفعلي %
المشاريع الرأسمالية	٣٧٨١٧.٥	٣٣٠٦٩.٤	٨٧.٤

المصدر: قانون الموازنة العامة، ٢٠٠٨.


الشكل رقم (١)

مقارنة الانفاق الفعلي حسب مخصصات المشاريع الرأسمالية موزعة حسب القطاعات لمحافظة المفرق

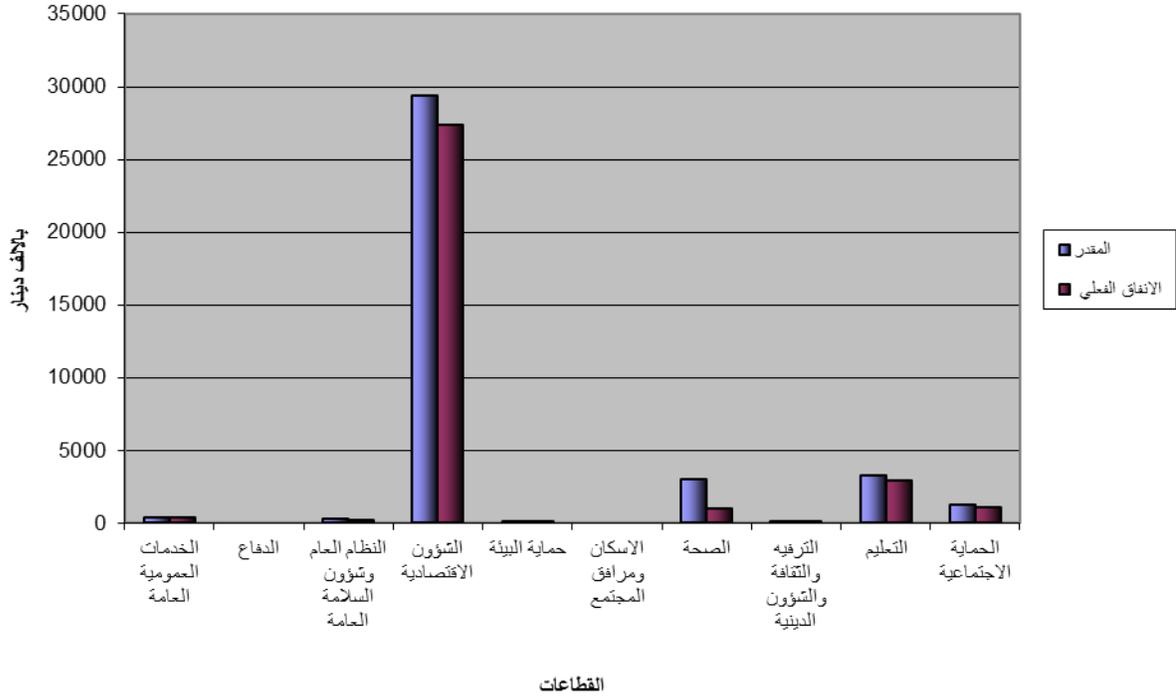

ويشير توزيع مخصصات المحافظة حسب القطاعات الوظيفية إلى إستئثار قطاع الشؤون الاقتصادية بالنصيب الأكبر وما نسبته (٧٧.٧%) من إجمالي مخصصات محافظة المفرق لعام ٢٠٠٨ وذلك من أجل تنمية المحافظة إقتصادياً والمساهمة في تخفيض معدلات البطالة ورفع معدلات الأجور من خلال خلق فرص عمل جديدة من مشاريع البنية التحتية ومشاريع تعزيز الإنتاجية وتحفيز الإستثمارات المحلية، وجاء في المرتبة الثانية قطاع التعليم حيث حصل على ما نسبته (٨.٧%) من إجمالي مخصصات محافظة المفرق ويليه قطاع الصحة ثم قطاع الخدمات العمومية والشكل التالي رقم (٢) يوضح التوزيع القطاعي للمشاريع الرأسمالية في محافظة المفرق.

التوزيع القطاعي للمشاريع الرأسمالية لمحافظة المفرق

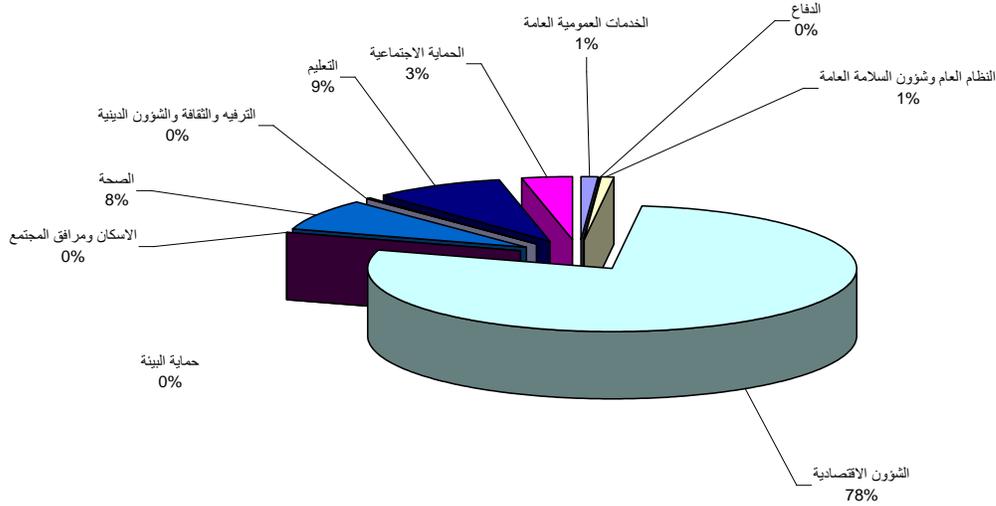

وف

■ الحماية الاجتماعية ■ التعليم ■ الترفيه والثقافة والشؤون الدينية ■ الصحة ■ الاسكان ومراقب المجتمع ■ حماية البيئة ■ الشؤون الاقتصادية ■ النظام العام وشؤون السلامة العامة ■ الدفاع ■ الخدمات العمومية العامة

ي ما يلي تحليل موجز لأهم مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب الفصول:-

### الإشغال العامة والإسكان :-

تم رصد مبلغ (٨١٤٤.٧) ألف دينار لقطاع الأشغال العامة والإسكان أي ما نسبته (٢١.٦%) من إجمالي المخصصات الرأسمالية المرصودة للمحافظة وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ (٨١٣٧.٩) ألف دينار أي ما نسبته (٩٩.٩%) من المخصصات المرصودة لوزارة الأشغال العامة والإسكان في المحافظة، وتعتبر نسبة الإنفاق ضمن المستوى المستهدف .

### التربية والتعليم :-

تم رصد مبلغ (٣٢٠٩.٦) ألف دينار أي ما نسبته (٨.٥%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ (٢٨٨٣) ألف دينار أي ما نسبته (٨٩.٨%) من المخصصات المرصودة لوزارة التربية والتعليم في المحافظة، وهي نسبة ضمن المستوى المستهدف ويعود ذلك إلى أن معظم النفقات الرأسمالية لوزارة التربية والتعليم في محافظة المفرق نفقات مستمرة مثل (صيانة وإصلاحات المباني، التغذية المدرسية، تطوير التعليم).

### الصحة :-

بلغ حجم المخصصات المرصودة لوزارة الصحة في المحافظة (١٠٣٧.٧) ألف دينار مشكلة ما نسبته (٢.٨%) من إجمالي المخصصات للمشاريع الرأسمالية في المحافظة، وبلغ الإنفاق

الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ (١٠٠٧.٨) ألف دينار أي ما نسبته (٩٧%) من مخصصات وزارة الصحة في محافظة المفرق وهي نسبة ضمن المستوى المستهدف في مثل هذا الوقت من السنة .  
وفيما يلي بطاقة وصف لأهم المشاريع التي تم تقييمها:-

بالألف دينار

١- مشروع البنية التحتية لمنطقة المفرق واربد - منطقة الحسين بن طلال الاقتصادية	
تشرين أول ٢٠٠٨	كانون أول ٢٠٠٨
	
٦١٠٠٠	الكلفة الكلية
٣٦ شهر	مدة التنفيذ
٢٠٠٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٨ :
١٧٩٢٦.٨	الانفاق الفعلي لغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١
%٨٩.٦	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
%٩٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨ : سير العمل في المشروع :
	الأوامر التغييرية :
	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية
	تقييم المشروع :
	ملاحظات :
	-

خدمات البنية التحتية ( الانشاءات الكهربائية اللازمة لتزويد المنطقة بحمل (١٦٠) ميغا بانشاء محطة تحويل كهربائية رئيسية من خلال شركة الكهرباء الوطنية خارج حدود المشروع).

%٨٥  
البنية التحتية تسير بالشكل المطلوب في حين أن الاستثمارات والمدن الاسكانية والخدمات لا تسير بالتوازي  
المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات

بالألف دينار

٢- مشروع اسكان الاسر الفقيرة	
تشرين أول ٢٠٠٨	
	
٢٢٥٠٠	الكلفة الكلية
١٨ شهر	مدة التنفيذ
٤٩.٩	مخصصات عام ٢٠٠٨ :
٤٩.٩	الانفاق الفعلي لغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١
%١٠٠	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
%١٠٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨ : سير العمل في المشروع :
	تم الانتهاء من المشروع وهو في مرحلة الاستلام النهائي. ٢٩ مسكن ١ صيانة

الأوامر التغييرية : نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع :	٣٧.٤ ألف دينار جدران وتعلبات ١٠٠% مشروع يسير حسب المخطط
ملاحظات :	تأمين مساكن للاسر الفقيرة في منطقة نايفة و الصاحية في لواء البادية الشمالية الشرقية

بالآلف دينار

### ٣- مشروع تأسيس مستشفى البادية الشمالية

الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع: الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية تقييم المشروع	١٧٢٥٠ جديد ٣٠ شهراً ٥٠ ٣٠.٤ ٦٠.٨ % ٥ % تم الانتهاء من مرحلة الدراسات والتصاميم والمشروع قيد الطرح لا يوجد ٥ % يسير المشروع دون المستوى المخطط له وتم نقل جزء كبير من المخصص
ملاحظات:	يخدم أبناء محافظة المفرق لواء البادية الشمالية الغربية والشرقية بسعة (٥٠) سرير وفق المواصفات العالمية / تم نقل المخصص

بالآلف دينار

### ٤- مشروع إنشاء مستشفى المفرق

الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية تقييم المشروع	٦٠٠٠ ٣٦ شهر ٢٠٠٠ ١٤.٨ ٠.٧ % ٥ % المشروع في مرحلة الدراسات وإعداد التصاميم لا يوجد ٥ % المشروع يسير دون المستوى المخطط له.
ملاحظات	مستشفى عسكري متطور مرصودة مخصصاته في فصل ٠٨٠٢/الخدمات الطبية الملكية لخدمة أبناء محافظة المفرق

بالآلف دينار

٥- مشروع انشاء نفق جامعة ال البيت على طريق بغداد

تشرين اول ٢٠٠٨	كانون اول ٢٠٠٨	٣٢٧٠	الكلفة الكلية
		٢٨ شهرا	مدة التنفيذ
		١٥٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٨ :
		١٥٠٠	الإنفاق الفعلي لغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١
		%١٠٠	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
		%١٠٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨ :
<p>تم الإنتهاء من الدراسات والتصاميم والتجهيزات وانشاء تحويلة للسير لاغلاق الطريق باتجاه جابر / الحدود السورية جار العمل بالمشروع ويسير حسب المخطط المعدل تغيير كلي للمشروع ٥٥%</p> <p>المشروع يسير وفق بنود عقد المقاولة حيث ينفذ من قبل شركة جعفر للتعهدات ويتم الاشراف عليه من قبل شركة دار عمران وهو مشروع منفذ من خلال وزارة الاشغال العامة والاسكان بالعتاء المركزي رقم (٢٠٠٧/٥٩)</p>			سير العمل في المشروع
			الأوامر التغييرية
			نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية
			تقييم المشروع
<p>المشروع لخدمة مستخدمي جامعة ال البيت وتنمية القطاع التعليمي وتأمين السلامة المرورية لطلاب الجامعة .</p>			ملاحظات

بالآلف دينار

٦- مشروع انشاء طريق المفرق – الصفاوي

٢٠٠٠	الكلفة الكلية
٦٠ شهراً	مدة التنفيذ
٥٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
٥٠٠	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
%١٠٠	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
%١٠٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨ :
المشروع منتهي وقيد التسليم والمبلغ المرصود في عام ٢٠٠٨ لمطالبات متاخرة	سير العمل في المشروع:
(٢٥٠) دينار بالعتاء رقم (٢٠٠٦/٨٦)	الأوامر التغييرية
%١٠٠	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية
جاهز للإستلام النهائي	تقييم المشروع
يوجد دفعات نهائية للمتعهد وهو مشروع سنوي للمحافظة على الطريق بمستوى فني عالي	ملاحظات



بالآلف دينار

٧- مشروع طريق المفرق - اربد

١٠٠٠	الكلفة الكلية
٣٦ شهر ٢٠٠٨/١٢/١ - ٢٠١١/١١/٣٠	مدة التنفيذ
١٠٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
١٠٠٠	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
%١٠٠	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨
	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
تم طرح العطاء ومن المتوقع بدء التنفيذ في الربع الأول من عام ٢٠٠٩.	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
%١٠	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية
تم إزالة العوائق وطرح العطاء	تقييم المشروع
طول الطريق ١٨ كم لربط المحافظات والمناطق السياحية من خلال شبكة طرق بمستوى فني عالي يوجد مشكلة استملاك مع اهالي بلدة البويضة حيث يقسم الشارع البلدة الى قسمين.	ملاحظات

بالآلف دينار

٨- مشروع انشاء واعادة تاهيل طريق الازرق - الحدود العراقية

١٠٠٠٠٠	الكلفة الكلية
٤٩ شهر	مدة التنفيذ
١٠٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
٩٩٨.٩	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
%١٠٠	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨
%١٠٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
تم إحالة العطاء ومن المتوقع البدء في التنفيذ في الربع الأول من عام ٢٠٠٩.	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
%١٠	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية
تم إزالة المعوقات ومن المتوقع البدء في التنفيذ	تقييم المشروع
انشاء طريق باربعة مسارب للربط مع الحدود العراقية لتحسين مستوى السلامة المرورية على هذا الطريق وتخفيض نسبة الحوادث الناتجة عن المواقع الخطرة	ملاحظات

بالآلف دينار

### ٩- مشروع تنفيذ طريق بديل لطريق الزبيدية /المفرق

١٠٠٠	الكلفة الكلية
١٢ شهر	مدة التنفيذ
١٠٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
١٠٠٠	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
%١٠٠	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
%١٠٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
جار العمل بالمشروع حسب المخطط	سير العمل في المشروع .
-	الأوامر التغييرية .
%١٠٠	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية
المشروع في مراحل الإستلام.	تقييم المشروع .
تنفيذ طريق بديل للطريق الزراعي الذي يمر ضمن منطقة المفرق الاقتصادية	ملاحظات .

بالآلف دينار

### ١٠- مشروع القرى الحضرية

٢١٠٠٠ / جزء من مشروع على المستوى الوطني / جديد	الكلفة الكلية
٢٤ شهر ٢٠٠٨/١/١ - ٢٠٠٩/١٢/٣١	مدة التنفيذ
تم نقل المخصص	مخصصات عام ٢٠٠٨
-	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
%٠	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
%٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
تم تحديد القطعة رقم ١٥٩ حوض رقم (١) لوحة ١٠٢ بمساحة ١٥ دونم من أراضي المفرق الشرقي وهي من أراضي خزينة الدولة	سير العمل في المشروع .
-	الأوامر التغييرية:
%٠	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية
المشروع يسير ببطء ودون المستوى المستهدف	تقييم المشروع .
إنشاء حدائق نموذجية في مختلف مناطق المملكة / تم نقل المخصص	ملاحظات

بالألف دينار

## ١١ - مشروع انشاء مركز للمعوقين/الصالحية

تشرين أول ٢٠٠٨



٧٦٠  
٢٤ شهر  
٦١٠  
٣٩٤  
٦٤.٦ %  
١٠٠ %

الكلفة الكلية

مدة التنفيذ

مخصصات عام ٢٠٠٨

الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٠/٣١

نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨

نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:

يسير حسب بنود عقد المقاولة في مراحل التشطيب والأعمال الخارجية من ساحات وتعبيد

-  
٩٥ %

يسير حسب المخطط له وسينتهي العمل به حسب الموعد المحدد.

المشروع لزيادة قدرة الوزارة على خدمة الحالات الخاصة في المجتمع وتأهيلهم في منطقة الصالحية

سير العمل في المشروع .

الأوامر التغييرية .

نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة

الاجمالية

تقييم المشروع .

ملاحظات .

بالألف دينار

## ١٢ - مشروع انشاء مركز للمعوقين / الرويشد

٨١٥  
٢٤ شهر  
٦٦٥ قيد التنفيذ  
٦٥٥  
٩٨.٥ %  
٧٥ %  
العمل جارٍ في المشروع

الكلفة الكلية

مدة التنفيذ

مخصصات عام ٢٠٠٨

الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١

نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨

نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:

سير العمل في المشروع .

- ٦٠% المشروع يسير حسب المخطط وتم إزالة كافة المعوقات	الأوامر التغييرية . نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية تقييم المشروع .
المشروع لزيادة قدرة الوزارة على خدمة المعوقين في المجتمع وتأهيلهم ومن المتوقع الانتهاء منه في شباط ٢٠٠٩	ملاحظات .

## مطالب واحتياجات محافظة المفرق

١. إنشاء مبنى لمحافظة المفرق.
٢. إنشاء مبنى لوحدة العناية بالأم و الطفل و مبنى للأسعاف و الطوارئ و مبنى للعيادات الخارجية في مستشفى النسائية و الأطفال.
٣. زيادة مخصصات الطرق الزراعية لمحافظة المفرق.
٤. إنشاء السدود والحفائر في جميع الالوية لاستغلال مياه الفيضانات في الزراعة وسقاية الماشية وتغذية المياه الجوفية.
٥. توسعة شبكة صرف صحي مدينة المفرق.
٦. إنشاء مركز ثقافي وقاعة اجتماعات متعددة الأغراض في مدينة المفرق.
٧. تحسين الشارع الرئيسي لمدخل مدينة المفرق من الجهة الجنوبية بما يليق بها كمركز للمحافظة.
٨. صيانة الطريق الواصل بين بلدي أيدون بني حسن ورحاب بطول ١٣ كم وفرشه بالخطة الساخنة.
٩. إلحاق مدرسة الرويشد الثانوية للبنين بمدارس الثقافة العسكرية.
١٠. تحويل المدرسة المهنية الشاملة في البادية الشمالية الواقعة على مثلث صبحا إلى كلية زراعة تابعة لجامعة آل البيت.
١١. إنشاء مدرسة مختلطة (أساسية) في بلدة السويلمة قضاء حوشا.
١٢. إنشاء فرع لصندوق المعونة الوطنية في لواء البادية الشمالية الغربية.
١٣. فتح وتعبيد طريق الخناصري من لواء البادية الغربية / إسكان المنشية.
١٤. فتح وتعبيد طريق بريقا/جامعة العلوم والتكنولوجيا.
١٥. إنشاء مبنى لمتصرفية البادية الشمالية الغربية بدلاً من المستأجر.
١٦. إنشاء مكتب للإرشاد الزراعي في البادية الغربية (حوشا).
١٧. إنشاء مديرية أوقاف في لواء البادية الشمالية.
