


# محافظة العقبة

## محافظة العقبة

### لمحة عامة:



تعتبر مدينة العقبة المنفذ البحري الوحيد المطل على البحر الأحمر، وتشكل أهمية كبيرة للسياحة والاقتصاد الأردني وهي غنية بالجبال الأرجوانية الوعرة التي يتغير لونها وشكلها مع تغير أوقات النهار. وعلى شواطئ العقبة يستجم الزوار تحت أشعة الشمس قبل الغطس في المياه الباردة المنعشة.

أولى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين جل اهتمامه لتكون العقبة ثغر الأردن الباسم، وأصبحت مدينة العقبة من أجمل مدن المملكة لا بل تضاهي في جمالها مدن سياحية عالمية عريقة.

### التضاريس والمناخ:

تمتاز محافظة العقبة بالمناخ الحار والجاف صيفاً، والدافئ شتاءً، وتعتبر من المناطق الصحراوية التي يتراوح معدل هطول الأمطار السنوي فيها من "٥٠-١٠٠" ملم، وبارتفاع شديد في نسبة التبخر يصل إلى (٣٧٥٠ ملم/السنة) حيث تتراوح درجة الحرارة في شهر كانون الثاني بين "١٦- ٢٠" درجة مئوية مما يجعلها منطقة سياحية متميزة يرتادها سكان المملكة من جميع المحافظات، وكذلك الأجانب للتمتع في شتائها المعتدل ومياهها الدافئة، أما في فصل الصيف تتراوح درجة الحرارة بين "٣٥-٤٠" درجة مئوية.

### الموقع والمساحة:

تقع محافظة العقبة في أقصى الجزء الجنوبي للمملكة الأردنية الهاشمية على رأس الخليج الذي سمي باسمها ، والذي يبلغ طوله (١٦٠) كم. ولقد لعبت العقبة دوراً كبيراً في تاريخ المنطقة لموقعها المتوسط الذي يربط بين قارتي آسيا وأفريقيا ، وتبعد العقبة عن العاصمة عمان مسافة

(٣٢٥) كيلو متراً، وتبلغ مساحة المحافظة الإجمالية (٦٩٠٠) كم<sup>٢</sup> تعادل ما نسبته (٧.٨%) تقريباً من المساحة الإجمالية للمملكة.

## الواقع السكاني والكثافة السكانية:

قدر عدد سكان محافظة العقبة حسب تقديرات دائرة الإحصاءات العامة لعام ٢٠٠٨ بـ (١٢٧٥٠٠) نسمة يمثلون ما نسبته (٢.١٧%) من إجمالي عدد سكان المملكة، يتوزعون على (٢٨) تجمعاً سكينياً، ويشكل الحضر ما نسبته (٨٥%) والريف (١٥%) تقريباً وتشكل نسبة الذكور (٥٥.٧%) والإناث (٤٤.٣%)، وتبلغ الكثافة السكانية في المحافظة حوالي (١٨.٥) شخص لكل كيلومتر مربع مقابل (٦٥) شخص لكل كيلومتر مربع على مستوى المملكة. ويتوزع السكان حسب التقسيمات الإدارية والكثافة السكانية في المحافظة على النحو التالي:

الجدول رقم (١)

التوزيع السكاني حسب الجنس واللواء والكثافة السكانية في محافظة العقبة

اللواء	عدد السكان (نسمة)		النسبة من المحافظة %	المساحة كم <sup>٢</sup>	النسبة %	معدل الكثافة السكانية فرد/كم <sup>٢</sup>
	ذكور	إناث				
قصبية العقبة	٥٩٥٦١	٤٦٥٤٩	٨٣.٢	٤٣٤١	٦٢.٩	٢٤.٤
القويرة	١١٤٣٩	٩٩٥١	١٦.٨	٢٥٥٩	٣٧.١	٨.٣
المجموع	١٢٧٥٠٠		١٠٠	٦٩٠٠	١٠٠	١٨.٥

المصدر : دائرة الإحصاءات العامة، ٢٠٠٧.

## التقسيمات الإدارية:

- تضم محافظة العقبة الوحدات الإدارية التالية :
- (١) لواء قصبية العقبة و مركزه مدينة العقبة
  - (٢) قضاء وادي عربية
  - (٣) لواء القويرة مركزه القويرة
  - (٤) قضاء الديسة ويتبع للواء القويرة ومركزه الديسة

## المناطق الحيوية :

### إقليم العقبة :

- ويقصد بالإقليم (المناطق التابعة لمحافظة العقبة والواقعة خارج حدود المنطقة الخاصة باستثناء المشمولة بقانون سلطة وادي الأردن ) .
- تتولى سلطة المنطقة الخاصة بموجب قانونها تنمية الإقليم اقتصادياً واجتماعياً ونقصد هنا بالإقليم لواء القويرة ومنطقة حوض الديسة .
- تتولى سلطة وادي الأردن مهمة تطوير وتنمية منطقة وادي عربة بموجب قانون السلطة. ملاحظة : إنتقلت صلاحية تطوير وادي عربة إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموجب موافقة مجلس الوزراء عام ٢٠٠٧ .

### • مؤسسة الموانئ (شركة تطوير العقبة) :


يعتبر ميناء العقبة من أهم موانئ المنطقة المطلّة على البحر الأحمر نظراً لموقعه الجغرافي المتميز، كونه الشريان الحيوي، والمنفذ البحري الوحيد الذي يطل به الأردن على موانئ العالم، والذي يصدر من خلاله الموارد والمنتجات الوطنية من الفوسفات والبوتاس والأسمدة الكيماوية، ويعتبر همزة الوصل التي تربط المشرق العربي بالمغرب العربي في كل من آسيا وأفريقيا، بالإضافة لحركة التجارة الخارجية مع الدول العربية المجاورة التي تربطه بها شبكة من الطرق البرية الجيدة، ومن خلال ميناء العقبة يتم تصدير (٧٨%) من مجموع الصادرات الأردنية واستيراد ما نسبته (٦٥%) من مجموع المستوردات الأردنية.

### • مطار الملك الحسين الدولي (شركة تطوير العقبة) :

يعمل المطار ليحقق ثلاث أهداف رئيسية تتمثل في نقل السياحة العالمية والشحن الجوي وأخيراً نقل رجال الأعمال، وكلها تساهم في الدخل القومي للأردن حيث يعتبر المطار دولياً من كافة المعايير العالمية بحيث استقبل كافة أنواع الطائرات المعروفة في مجالات النقل المدني والعسكري. وتعتبر شركة تطوير العقبة هي المالك الرئيسي لأصول ومجودات المطار ومؤسسة الموانئ.

الخريطة رقم (١)

خارطة محافظة العقبة حسب الألوية ومراكزها

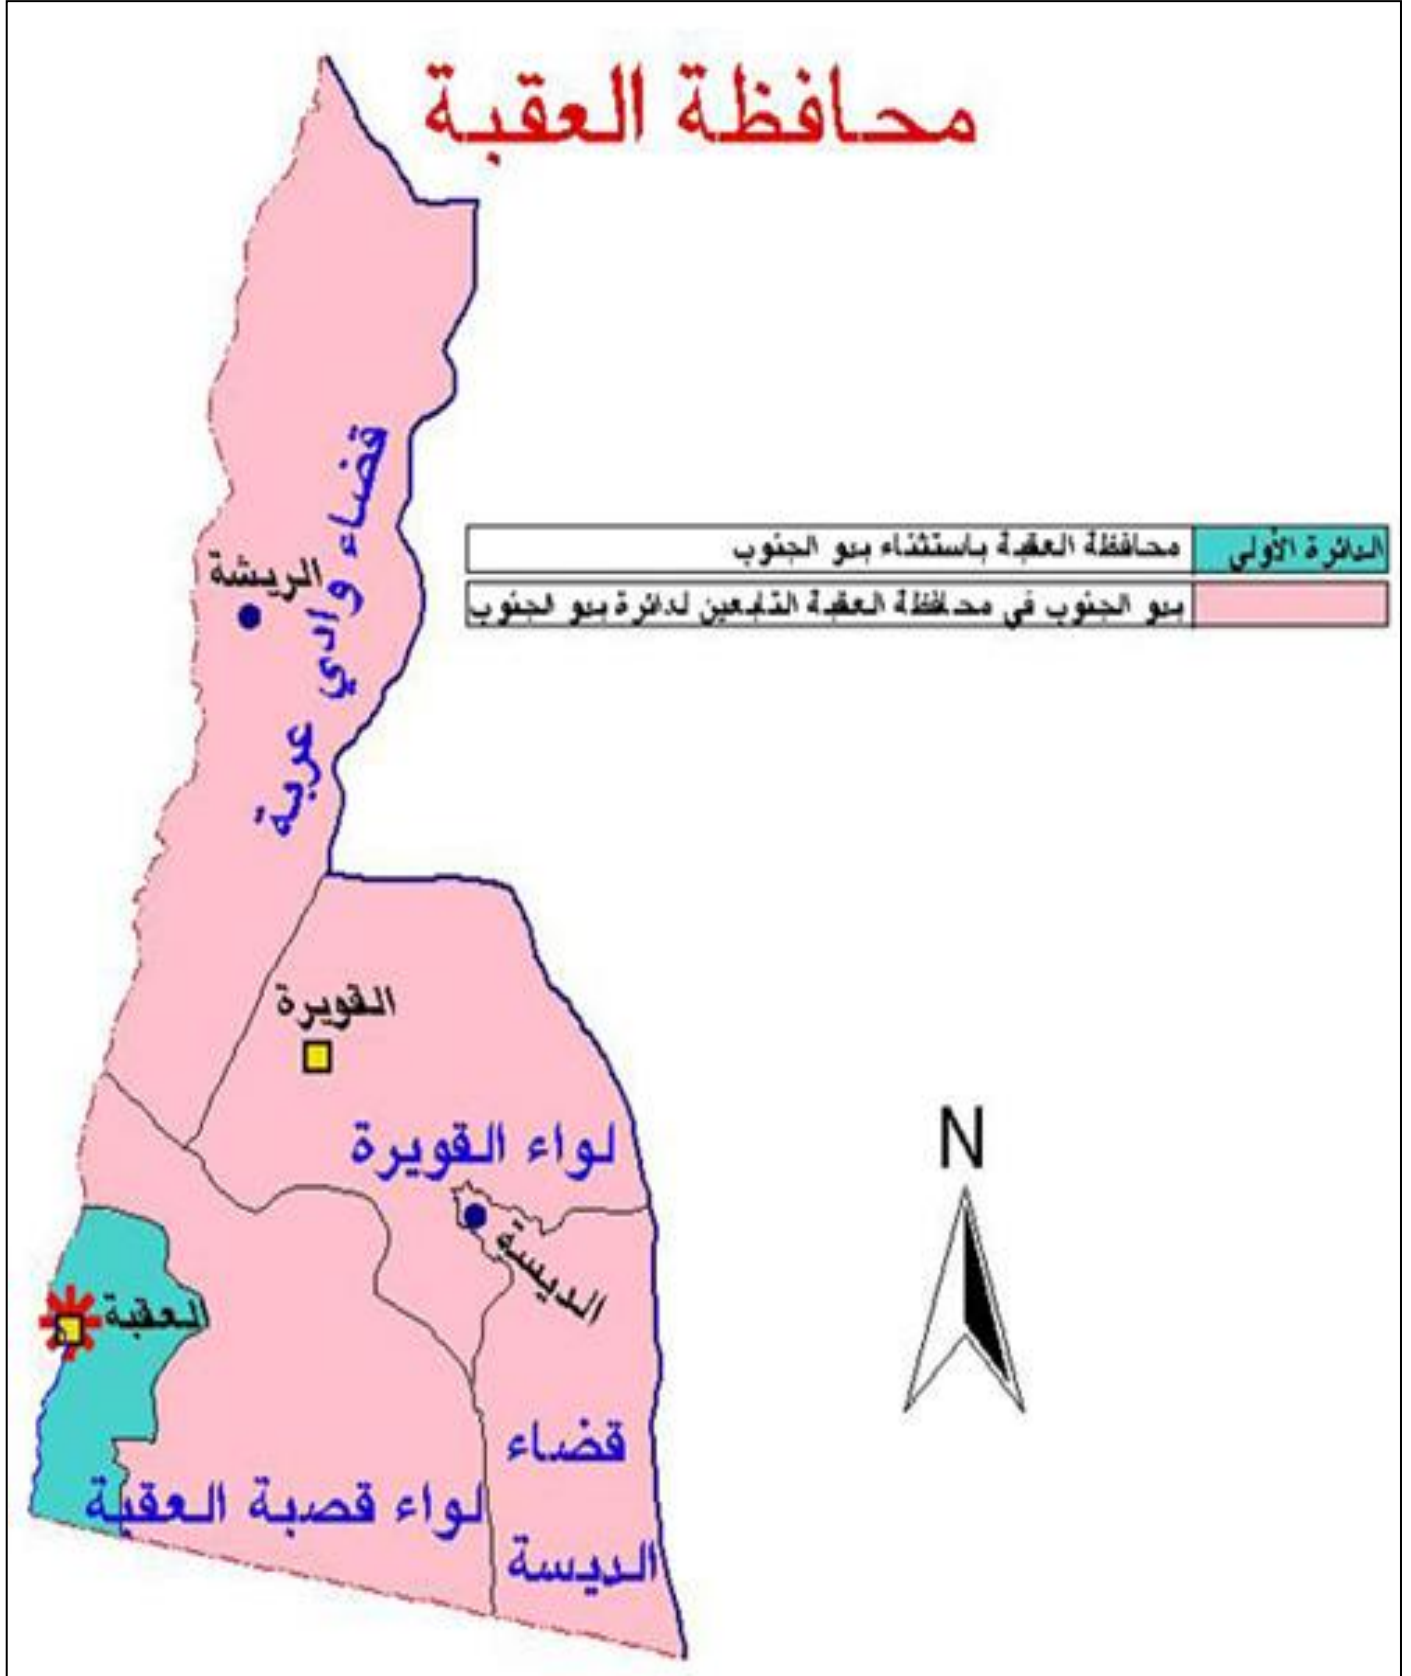

## أبرز المشاريع الرأسمالية لمحافظة العقبة

(بالألف دينار)

الرقم	اسم المشروع	الجهة المنفذة	مخصصات ٢٠٠٩	نسبة الإنفاق %	نسبة الإنجاز %	الملاحظات
	مجموع المشاريع الرأسمالية للمحافظة منها المشاريع التالية:		٢٢٠٨٠.٦	٣٨.١		
١.	إنشاء طابق إضافي لمحكمة بداية العقبة.	وزارة العدل	٢٥٠	١٧.٢	٣٠	في مرحلة التشطيبات ومن المتوقع الانتهاء في نهاية شهر آب
٢.	إنشاء مبنى متصرفية لواء القويرة وسكن المتصرف.	وزارة الداخلية	٥٠٠	٦٦.٥	٩٤	في مرحلة التشطيبات ومن المتوقع الانتهاء في نهاية شهر آب.
٣.	مشروع تطوير وادي عربية.	وزارة المالية	١٧٥٠	٠	-	تم تحويل ملف هذا المشروع إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
٤.	دعم مشاريع المجلس الاعلى للشباب	وزارة المالية	١٠٠٠	٣٦	٥٠	اعمال تشطيبات لنادي الامير حمزة
٥.	مستشفى العقبة الجديد.	وزارة التخطيط	٤٣٠٠	٧٣.٣	١٨	تم تغيير اسم المستشفى ليصبح مستشفى الأمير هاشم العسكري.
٦.	مشروع تعزيز الانتاجية	وزارة التخطيط	١٩٢٢	٣٢.١		يهدف المشروع الى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال بناء القدرات والدورات التدريبية وتقديم دراسات الجدوى للمشاريع الصغيرة
٦.	تطوير موقع الشلالة الجنوبي في العقبة.	وزارة التخطيط	١٥٠	٠	-	هناك لجان لتحديد الاسر المستحقة للسكن في الموقع البديل
٧.	طريق العقبة الساحلي.	وزارة التخطيط	٢٠٠	٢٥	١٠٠	المشروع منتهي.
٨.	تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي	وزارة التخطيط	٤٧٤	٩٧	٥٠	اضافات مدارس العقبة، مدرسة الكرامة، مدرسة المنطقة الثامنة الثانوية، مدرسة المنطقة العاشرة، الهاشمية (منحة امريكية)

٩	بناء مدارس اساسية	وزارة التخطيط	١١٥٠	٩٩.٧	٥٣	مدرسة عبدالله سراج الاساسية العقبة(منحة المانية)
١٠	صيانة الطرق الرئيسية والنافذة والجسور في إقليم الجنوب.	وزارة الأشغال	١٠٠٠	٦١	٧٥	عبارة عن اعمال صيانة روتينية وتوسعة للطرق وبناء الاطاريق
١١	انشاء نفق الحميمة على الطريق الصحراوي	وزارة الأشغال	٨٠٠	٠	-	تم ايقاف المشروع .
١٢	الطريق الواصل الى مركز حدود الدرہ	وزارة الأشغال	٢٠٠٠	٠	٠	في مرحلة طرح العطاء
١٣	مشروع زيادة دخل الاسر الفقيرة/الامن الغذائي	وزارة الزراعة	١٧٢	٥٥	٥٠	مشروع الفقر لريفي
١٤	دعم زراعة المحاصيل الحقلية .	وزارة الزراعة	١٥٠	٠	٠	يتم دعم المزارعين من خلال هذا المشروع بمقدار (٥) دنانير لكل دونم مزروع بالمحاصيل الحقلية
١٥	إنشاء مركز للمعوقين/ القوية.	وزارة التنمية الاجتماعية	٤٢	٠	١٠٠	تم الاستلام الأولي للمشروع.
١٦	إنشاء مديرية التنمية الاجتماعية .	وزارة الثقافة	٢٥٨	٨١.٤	٤٢	البناء عوضا عن المبنى القديم
١٧	نشاء مبنى مركز مصادر التعلم	وزارة التربية	٦٥٠	٠	٠	دراسات وتصاميم وفي مرحلة طرح العطاء
١٨	انشاء مخيمات كشفية	وزارة التربية	٥٠	٣٢.١	٩٥	البلغ الرصود لغاية شراء مولد كهرباء وتأثيث المبنى
١٩	حزمة مشاريع وزارة التربية	وزارة التربية	٧٦٥	٣٠	٥٠	صيانة مدرسة الطويل والمزفر /العقبة،صيانة مدرسة قاع النقب/دبة حانوت

## خلاصة التقييم لأهم المشاريع التنموية والرأسمالية لمحافظة العقبة

خلاصة المشاريع الرأسمالية المرصودة في محافظة العقبة لعام ٢٠٠٩



قدرت النفقات الرأسمالية لمشاريع محافظة العقبة لعام ٢٠٠٩ بمبلغ (٢٢٠٨٠,٦) ألف دينار موزعة حسب الفصول للوزارات والدوائر الحكومية حيث تم إنفاق (٨٤١٢,٨) ألف دينار بنسبة (٣٨,١%) حتى تاريخ ٢٠٠٩/٦/٣٠ ويعزى سبب تدني مستوى الإنفاق إلى عدم الإنفاق على مشروع تطوير وادي عربة حيث حول ملف هذا المشروع الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وايقاف مشروع نفق الحميمة على الطريق لصحراوي.

(بالالف دينار)

البيان	مقدر ٢٠٠٩	الإنفاق حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠	نسبة الإنفاق الفعلي %
المشاريع الرأسمالية	٢٢٠٨٠,٦	٨٤١٢,٨	٣٨,١

الشكل رقم (١)

ويشير توزيع المخصصات المالية لمحافظة العقبة حسب القطاعات الوظيفية إلى أن قطاع الشؤون الاقتصادية إستأثر على ما نسبته (٣٢,٨%) من إجمالي مخصصات المحافظة لعام ٢٠٠٩ وذلك من أجل تنمية المحافظة والمساهمة في تخفيض معدلات البطالة، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصحة والذي حاز على ما نسبته (٢٣,٦%) من إجمالي مخصصات المحافظة وتلاه قطاع الترفيه والثقافة والشؤون الدينية كما هو واضح في الشكل رقم (٢).

الشكل رقم (٢)

وفي ما يلي تحليل موجز لأهم مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب الفصول:-

### الإشغال العامة والإسكان :-

بلغ حجم المخصصات المرصودة في وزارة الأشغال العامة والإسكان في قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٠٩ (٣٨٠٠) ألف دينار مشكلة ما نسبته (١٧,٢%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ (٦١٠) ألف دينار أي ما نسبته (١٦,١%) من المخصصات المرصودة في الوزارة، وهي ضمن النسب المتدنية ويعود ذلك الى ايقاف مشروع انشاء نفق الحميمة على الطريق الصحراوي وعدم البدء في مشروع الطريق الواصل الى مركز حدود الدرة وهو في انتظار مرحلة طرح العطاء.

### التربية والتعليم :-

تم رصد مبلغ (٢٩٤٥,١) ألف دينار مشكلة ما نسبته (١٣,٣%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ (٤٩٥,٩) ألف دينار أي ما نسبته (١٦,٨%) من المخصصات المرصودة لقطاع التعليم في المحافظة وهي ضمن النسب

المتدنية وذلك لتأخر في تنفيذ بعض المشاريع التي رصد لها مبالغ كبيرة في وزارة التربية،  
انشاء صالات رياضية مشروع انشاء مراكز للتشخيص وانشاء مراكز مصادر التعلم.


### وزارة التخطيط والتعاون الدولي :-

بلغت المخصصات المرصودة لوزارة التخطيط في المحافظة ما مقداره (٨١٩٦) ألف دينار مشكلة ما نسبته (٣٧,١%) من إجمالي المخصصات للمشاريع الرأسمالية للمحافظة وتم إنفاق ما مقداره (٥٤٢٤) ألف دينار أي ما نسبته (٦٦,٢%) من المخصصات الرأسمالية حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ وهي ضمن النسب الجيدة في مثل هذا الوقت من العام حيث بوشر العمل في مشروع مستشفى العقبة الجديد(مستشفى الامير هاشم) وبنسبة انفاق(٧٣,٣%) ومشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي وبنسبة انفاق(٩٧%) ومشروع بناء المدارس الاساسية وبنسبة انفاق (٩٩,٧%).

### وزارة التنمية الإجتماعية :-

بلغت المخصصات المرصودة لوزارة التنمية الإجتماعية في المحافظة ما مقداره (٣٣٣) ألف دينار مشكلة ما نسبته (١.٥%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمشاريع الرأسمالية في المحافظة تم إنفاق (٢٢٥) ألف دينار أي ما نسبته (٦٧,٦%) من المخصصات المرصودة للوزارة وذلك لتنفيذ مشروع انشاء مبنى مديرية التنمية الاجتماعية.

## ١ - انشاء طابق اضافي لمحكمة بداية العقبة

	<p>٢٥٠ ١٢ شهرا ٢٥٠ ٤٣,١ %١٧.٢ %٣٠</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:</p>
<p>تمت المباشرة بالتنفيذ بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٥ ومن المتوقع ان ينتهي المشروع في نهاية شهر أ ب - %٣٠</p>	<p>سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية:</p>	

وفيما يلي بطاقة وصف لاهم المشاريع الرأسمالية التي تم تقييمها :-  
بالألف دينار

المشروع يسير ضمن البرنامج المخطط له	تقييم المشروع
	ملاحظات

### بالآلاف دينار


٢- مشروع إنشاء مبنى متصرفية لواء القويرة وسكن المتصرف	
	<p>١٠٤٠ ٢٤ ٥٠٠ ٣٣٢.٨ ٦٦,٥ %٦٠</p>
<p>لا توجد أي معوقات مالية أو فنية ويسير ضمن البرنامج وهو يشتمل على سكن مستقل للمتصرف بالإضافة إلى غرفة منامة للموظفين وغرفة للحارس وخزان ماء بسعة (٦١) متر مكعب. ومن المتوقع الإنتهاء من المشروع قبل الفترة المحددة في نهاية شهر أرب ٢٠٠٩ وهو الآن في مرحلة التشطيبات</p> <p>- %٩٤ المشروع يسير ضمن البرنامج المخطط له</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩</p> <p>سير العمل في المشروع</p> <p>الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع</p>
عوضاً عن المبنى القديم في اللواء	الملاحظات

### بالآلاف دينار



٣- دعم مشاريع المجلس الاعلى للشباب	
<p>١٠٠٠ ٦ شهور ١٠٠٠ ٣٦٠ %٣٦ %٥٠</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩</p> <p>سير العمل في المشروع</p> <p>الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية:</p>
<p>اعمال تشطيبات لنادي الامير حمزة بنسبة انجاز (٨٧%) وهي جز من الدعم المقدم للمجلس الاعلى للشباب.</p> <p>- %٥٠</p>	

المشروع يسير ضمن المخطط له	تقييم المشروع
تمت المباشرة في ٢٠٠٩/٢/٥ ومن المتوقع ان ينتهي في شهر أب ٢٠٠٩	ملاحظات

### بالألف دينار

٤- مشروع مستشفى العقبة الجديد	
	<p>٤٩١٦٥ ٤٨ شهر ٤٣٠٠ ٣١٥٠,٦ ٣,٣% ٩%</p>
<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الانفاق لغاية ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:</p>	
<p>سير العمل في المشروع</p> <p>احيل العطاء على شركة الفاضل للهندسة والتعهدات وشركة عبر المتوسط للتجارة والتعهدات، بلغت قيمة العطاء (٤٩١٦٥) الف دينار وبموجب الاتفاقية تم دفع ١٠% كدفعة مقدما من كلفة العطاء على دفعتين حيث تم دفع القسط الاول وقيمته (٢٤٨٣) الف دينار بعد ٦/٣٠ على ان يتم دفع القسط الثاني والمساوي للدفعة الأولى في وقت لاحق، المشروع يحظى بأهتمام كبير ويتم تنفيذه حسب أعلى المواصفات العالمية (وسمي باسم مستشفى الامير هاشم العسكري)</p> <p>الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية</p> <p>المشروع يسير حسب المخطط له.</p>	
<p>تقييم المشروع</p> <p>تبلغ مساحة ارض المشروع (١٥٠) دونم ومساحة البناء (٣٣) دونم</p>	
<p>ملاحظات</p>	

### بالألف دينار

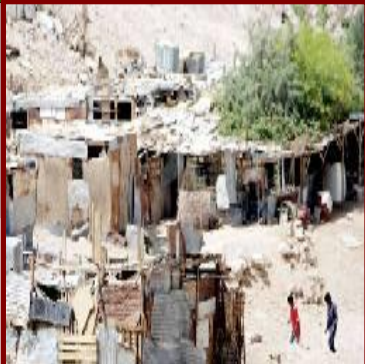
٥- مشروع تطوير موقع الشلالة الجنوبي في العقبة	
	
<p>٢١٢٣٠ ١٢ شهرا ١٥٠ ٠</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠</p>

	%٠	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩
	%٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
لم يتم البدء بتنفيذ المشروع حتى يتم ترحيل كل الأسر. - الشقق السكنية في الكرامة منجزة ١٠٠% وهو الموقع البديل لسكان المنطقة		سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية:
هناك لجان لتحديد الاسر المستحقة للشقق في الموقع البديل		تقييم المشروع
يوجد معوقات نقل المواطنين إلى مواقع سكنهم الجديدة تتمثل في تحديد الأسر المستحقة لهذه الشقق .		ملاحظات

### بالألف دينار


٦- مشروع طريق العقبة الساحلي		
	٣١٠٠٠ منتهي ٢٠٠ ٥٠ ٢٠٠ %١٠٠	الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
تم إنجاز المشروع وتم تسليمه، المبلغ المرصود يمثل اعمال صيانة - %١٠٠ تم الانتهاء من المشروع		سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع
		ملاحظات

### بالألف دينار

٧- تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي	
	٢٧٠٠٠٠ الكلية


	مستمر ٤٧٤ ٤٥٩,٩ %٩٧ %٥٠	مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
اضافات مدارس العقبة، مدرسة الكرامة، مدرسة المنطقة الثامنة الثانوية، مدرسة المنطقة العاشرة، الهاشمية (منحة امريكية) - %٥٠ المشروع يسير حسب المخطط له	سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع	
مصدر التمويل USAID	ملاحظات	

### بالآلف دينار

٨- بناء ٢٥ مدارس اساسية		
	٢١٠٠٠ ١٢ ١١٥٠ ١١٤٦,٦ %٩٩,٧ %٥٣	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
المشروع يسير بشكل جيد وهو عبارة عن بناء مدرسة عبدالله بن سراج الاساسية/العقبة - %٥٣ المشروع يسير حسب ما هو مخطط	سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع	
مصدر التمويل منحة المانية	ملاحظات	



بالآلف دينار

٩ - مشروع صيانة الطرق الرئيسية والناظفة في إقليم الجنوب		
	١٠٠٠	الكلفة الكلية
	سنوي	مدة التنفيذ
	١٠٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٩
	٦١٠	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
	%٦١	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩
	%٧٥	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
الصيانة الروتينية لطريق العقبة الخلفي /تحويلة راس النقب/ قيد الاستلام الصيانة الروتينية لطريق البحر الميت وادي عربة/ تم التسليم عمل جدران استنادية وصيانة لحمايات مدخل العقبة السياحي/منجز - %٧٥ المشروع يسير حسب المخطط.		سير العمل في المشروع
		الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع
		ملاحظات

بالآلف دينار


١٠ - انشاء نفق الحميمة على الطريق الصحراوي		
٨٠٠	الكلفة الكلية	
سنة	مدة التنفيذ	
٨٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٩	
٠	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠	
%٠	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩	
%٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:	
في مرحلة الدراسات واعداد التصاميم	سير العمل في المشروع	
- تغيير موقع المشروع	الأوامر التغييرية	
-	نسبة الانجاز التراكمية:	
المشروع يسير دون المستوى المخطط له حيث تم رصد المشروع منذ عام ٢٠٠٨ ولم يتم التنفيذ لغاية الان	تقييم المشروع	
لم تتم المباشرة بالعمل لاعتراض الاهالي على موقع المشروع	ملاحظات	

بالآلف دينار

١١ - مشروع الطريق الواصل الى مركز حدود الدره		
٢٠٠٠	الكلفة الكلية	
٣٦ شهر	مدة التنفيذ	

٢٠٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٩
٠	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
%٠	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩
%٣	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
دراسات وتصاميم وفي مرحلة طرح العطاء.	سير العمل في المشروع .
-	الأوامر التغييرية .
%٣	نسبة الانجاز لتراكمية:
المشروع يسير حسب المخطط	تقييم المشروع .
يربط المملكة مع الحدود السعودية من الجنوب.	ملاحظات .
<b>١٢- مشروع زيادة دخل الاسر الفقيرة/الامن الغذائي</b>	
١٧٢	الكلفة الكلية
مستمر	مدة التنفيذ
١٧٢	مخصصات عام ٢٠٠٩
٩٤.٦	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
%٥٥	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩
%٥٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
المشروع عبارة عن تقديم البيوت البلاستيكية ودعم الاسر من خلال تقديم ثلاثة رؤوس من الماعز و(٥٠) دجاجة وعلف لمدة ٦ اشهر.	سير العمل في المشروع .
-	الأوامر التغييرية .
%٥٠	نسبة الانجاز لتراكمية:
المشروع يسير حسب المخطط	تقييم المشروع .
مشروع الفقر الريفي	ملاحظات .

### بالآلف دينار


<b>١٣ - مديرية التنمية الاجتماعية</b>		
	١٠٠٠٠	الكلفة الكلية
	سنة	مدة التنفيذ
	٢٥٨	مخصصات عام ٢٠٠٩
	٢١٠	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
	%٨١.٤	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩
	%42	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
المشروع عوضا عن المبنى القديم ولا يوجد اية معوقات فنية او مالية	سير العمل في المشروع	
-	الأوامر التغييرية	

		نسبة الانجاز التركمية:	42%
١٤ - مشروع إنشاء مركز للمعوقين / القويرة			
	٦٩٠	الكلفة الكلية	
	٣٦ شهرا	مدة التنفيذ	
	٤٢	مخصصات عام ٢٠٠٩	
	٠	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠	

المشروع يسير حسب المخطط	تقييم المشروع
	ملاحظات

بالألف دينار

	%٠ %١٠٠	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
تبلغ مساحة البناء ١٦٠٠ متر مربع ويتكون المبنى من طابقين وطابق تسوية ومبنى للحركة وغرفة للحرس بالإضافة للأعمال الخارجية الجدران والأسوار وخزان ماء بسعة (٥٠) متر مربع والمبلغ المرصود يمثل مطالبات مالية.	- %١٠٠ تم الإستلام الأولي للمشروع	سير العمل في المشروع  الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية: تقييم المشروع
يخدم أهالي المنطقة والقرى المجاورة		ملاحظات

١٥ - / إنشاء مخيمات كشفية		
	٧٤٠ ٢٤ شهر ٥٠ ١٦ %٣٢,١ %٦٠	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الانفاق لغاية ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
المشروع بحاجة الى مولد كهرباء وتأثيث. لا توجد %٩٥ المشروع يسير حسب المخطط		سير العمل في المشروع. الأوامر التغييرية: نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع .
		ملاحظات

١٦ - مشروع تعزيز الانتاجية	
٢٢٠٠٠ /محافظات	الكلفة الكلية

<p>سنتري / مستمر ١٩٢٢ ٦١٧ %٣٢.١ %٤٠</p> <p>المشروع عبارة عن دعم لتحسين الظروف المعيشية من خلال بناء وتعزيز القدرات وتقديم التدريب للخريجين الجدد وتقديم دراسات الجدوى للمشاريع الجديدة.</p> <p>- %٦٠ المشروع يسير حسب المخطط</p>	<p>مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع .</p> <p>الأوامر التغييرية . نسبة الانجاز لتراكمية: تقييم المشروع .</p>
--	--

ملاحظات .

### ١٧- مشروع دعم زراعة المحاصيل الحقلية

<p>١50 مستمر ١50 0 %0 %5</p> <p>يمثل دعم زراعة المحاصيل الحقلية بواقع (٥) دنانير عن كل دونم مزروع.</p> <p>- %٥٠ المشروع يسير حسب المخطط</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع .</p> <p>الأوامر التغييرية . نسبة الانجاز لتراكمية: تقييم المشروع .</p>
---	--

ملاحظات .

### ١٨- مشروع انشاء مبنى مراكز مصادر التعلم

<p>١٢٣٤ ١٨ شهر ٦٥٠ ٠ %٠ %٣</p> <p>دراسات وتصاميم وفي مرحلة طرح العطاء.</p> <p>- %٣</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع .</p> <p>الأوامر التغييرية . نسبة الانجاز لتراكمية:</p>
--	--

المشروع يسير دون المستوى المخطط له	تقييم المشروع .
	ملاحظات .
<b>١٩ - حزمة مشاريع وزارة التربية</b>	
٧٦٥	الكلفة الكلية
مستمر	مدة التنفيذ
٧٦٥	مخصصات عام ٢٠٠٩
٢٢٩	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
%٣٠	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩
%٥٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩ :
المشروع عبارة عن انشاءات مختلفة واضافات غرف صفية وصيانة واصلاحات المباني اضافة الى التأثيث والتجهيز.	سير العمل في المشروع .
-	الأوامر التغييرية .
%٥٠	نسبة الانجاز لتراكمية:
المشروع يسير حسب المخطط	تقييم المشروع .
	ملاحظات .

## نظرة سريعة حول الإنجازات التنموية في محافظة العقبة

نورد فيما يلي تحليلاً موجزاً لأبرز الإنجازات في محافظة العقبة وفقاً للقطاعات الاقتصادية :-

### أولاً : البنية التحتية والخدمات الحكومية الأساسية :

#### ١) الأشغال العامة والإسكان :

نظراً لخصوصية مدينة العقبة و دورها في الاقتصاد الوطني من حيث اعتبار ميناء العقبة المنفذ البحري الوحيد للمملكة، وما ينتج عن ذلك من عمليات لتصدير البضائع والصناعات الوطنية واستيراد حاجات الأردن من الخارج، أو لإعادة التصدير وعمليات الترانزيت، ولهذا فترتبط محافظة العقبة بباقي مدن الملكة بشبكة طرق حديثة وتتولى مديرية أشغال العقبة الإشراف عليها من حيث التنفيذ والصيانة وذلك للطرق النافذة التي خارج نطاق اختصاص البلديات.

وتتوفر في المحافظة شبكة من الطرق الرئيسية والقروية والزراعية الجيدة يبلغ مجموع أطوالها حوالي (٥٦٩) كم والجدول التالي يبين أطوال الطرق بالـ(كم) حسب نوعها في محافظة العقبة :-

## الجدول رقم (١-١)

### أنواع الطرق الداخلية وأطوالها

نوع الطريق	طول الطريق (كم)
رئيسية	٣٥٢
ثانوية	٩٨
قروية	٨٩
زراعية	٣٠
المجموع	٥٦٩

المصدر :- مديرية الأشغال العامة ومحافظة العقبة، ٢٠٠٧.

## (٢) المياه الري والسدود :

تعتبر المياه الجوفية في محافظة العقبة هي المصدر الأساسي للمياه، حيث يوجد حوض الديسة الذي يعتبر من أهم الأحواض المائية في المملكة، تصل المياه إلى مدينة العقبة بالانسياب الطبيعي بواسطة خط ناقل رئيسي بطول (٦٥) كم يتزود بالمياه من الآبار مغذياً في طريقه بعض البلدات والقرى وخزانات التجميع المائي وصولاً للخزان الرئيسي لمدينة العقبة. تتميز محافظة العقبة عن باقي مناطق المملكة بفاعلية خدمات المياه حيث تصل نسبة المخدومين بالمياه عن طريق الشبكات حوالي (٩٩%) من سكان المحافظة، وتضخ المياه لكافة المواطنين على مدار الساعة وهذه الحالة تكاد تنفرد بها هذه المحافظة عن بقية المحافظات الأخرى.

تعتبر مدينة العقبة التجمع السكاني الوحيد في المحافظة الذي توجد به شبكة للصرف الصحي وهذه الشبكة تخدم ما نسبته (٩٠%) من سكان مدينة العقبة يستثنى من المدينة منطقتي الشلالة الجنوبية والبلد القديمة كونهما تحت التطوير حالياً، إذ يتم معالجة هذه المياه في محطات التنقية حيث يستفاد من المياه المعالجة في ري الأشجار الحرجية في منطقة الحزام الأخضر الذي يقع إلى الشمال من المدينة باعتباره مصدراً للغبار.

تخدم مدينة العقبة محطتين للتنقية الأولى ميكانيكية بطاقة استيعابية تصل إلى (١٢) ألف م<sup>٣</sup> يومياً والثانية محطة تنقية طبيعية بطاقة استيعابية تصل إلى (٩) آلاف م<sup>٣</sup> يومياً وتبلغ كمية

المياه الداخلة إلى المحطة (٤.٥٩٧.٣٠٣) مليون م<sup>٣</sup>/سنة والمياه الخارجة للمعالجة (٤.٠٤٧.١٤٦) مليون م<sup>٣</sup>/سنة تستخدم لغايات الزراعة والصناعة، ويتم تزويد محافظة العقبة ما يقارب (١٥) مليون متر مكعب لعام ٢٠٠٨.

### ٣) قطاع الكهرباء :

تصل نسبة المخدومين بالتيار الكهربائي في المحافظة إلى (٩٩.٩%) من سكان المحافظة ونسبة استمرارية التيار الكهربائي تصل إلى (٩٩.٨%).  
تتزود المحافظة بالكهرباء من محطة العقبة الحرارية التي تعتبر واحدة من محطات التوليد التي تزود المملكة باحتياجاتها من الطاقة الكهربائية، حيث يتم تزويد مناطق المحافظة من خلال (٨) محطات تحويل رئيسية منتشرة في المحافظة.

### ٤) البريد والاتصالات :

يشمل قطاع البريد (٨) مراكز منتشرة في أرجاء المحافظة ويعمل هذا القطاع من خلال استراتيجية جديدة تهدف إلى تطوير وتحسين مراكز الخدمات.  
وفي قطاع الاتصالات تتولى شركة الاتصالات الأردنية تقديم خدمات الهواتف الأرضية التي تخدم جميع التجمعات السكانية في المحافظة، حيث يتبع للشركة مقسم رئيسي و(١٧) مقسم تابع منتشرة في أنحاء المحافظة،

### ٥) النقل والمواصلات العامة : \*لم تحدث

- يعمل على خط عمان العقبة (٨) شركات نقل من خلال (٣٤) حافلة وعدد من سيارات النقل المتوسطة .

## ثانياً : التنمية الاجتماعية والموارد البشرية :

### ١) قطاع الصحة :

يوجد في المحافظة ثلاث مستشفيات هي مستشفى الأميرة هيا العسكري، ومستشفيان خاصان هما مستشفى الإسلامي ومستشفى العقبة الحديث، حيث يبلغ عدد الأسرة فيها (٢٠٦) سريراً، أي بمعدل سريراً لكل (٦٠٠) مواطن، كما ويتم الان بناء مستشفى الامير هاشم العسكري والذي ينفذ حسب اعلى المواصفات العالمية، ويوجد في المحافظة المرافق والخدمات الطبية التالية التابعة لوزارة الصحة:

الجدول رقم(1-2)

البيانات الاحصائية لقطاع الصحة في محافظة العقبة

قطاع الصحة	المجموع على مستوى المحافظة
عدد المستشفيات	٣*
عدد الأسرة	٢٠٦
عدد المراكز الصحية	٣ شامل



٧	أولي	
١٢	فرعي	
٢٢	المجموع	
٨	عدد مراكز الامومة والطفولة	
*١٧	مختبر	عدد المختبرات
*٩	اشعة	
١٠	اسنان	عيادات الاسنان
٣٠	العامة والخاصة	عدد الصيدليات
٢٦	طبيب عام	
٢	طبيب اختصاص	
٢١	طبيب اسنان	
٢٨	صيدلي/مساعد صيدلي	
٧٥	ممرض/ممرضة	
٢٩	فني مختبر /اشعة	

المصدر :- مديرية الصحة، ٢٠٠٧م.

## (٢١) قطاع التعليم :

بلغ عدد المدارس في محافظة العقبة في عام ٢٠٠٧ (١٠٩) مدرسة ما بين مدرسة ثانوية وأساسية ورياض الأطفال كما هي موضحة بالجدول التالي :-

### الجدول رقم (٢-٢)

عدد المدارس والشعب الصفية في المحافظة حسب المراحل التعليمية والجنس

عدد الشعب			عدد المدارس			عدد المدارس والشعب
مختلط	إناث	ذكور	مختلط	إناث	ذكور	
٤٥٢	٤٠٧	٤٠٥	٦٣	١٩	٢٧	المجموع

المصدر :- مديرية التربية والتعليم، التقرير السنوي ٢٠٠٧.

والجدول التالي يبين أعداد المعلمين والطلبة حسب المراحل التعليمية والجنس خلال عام ٢٠٠٧.

### الجدول رقم (٣-٢)

توزيع الطلبة والمعلمين ونسبة الطلبة حسب المراحل التعليمية والجنس

معلم لكل طالب	عدد الطلبة		عدد المعلمين		النواء
	إناث	ذكور	إناث	ذكور	
١٧.٨	١٧١٤٢	١٧٦١٩	١٢٨٠	٦٦٨	المجموع الكلي

المصدر :- وزارة التربية والتعليم، التقرير السنوي ٢٠٠٦.

### ٣) التنمية الاجتماعية :

تتوفر في محافظة العقبة مديرية للتنمية الاجتماعية تقدم خدماتها للأسر المحتاجة والفقيرة من خلال صندوق المعونة الوطنية وتتولى المديرية الإشراف على الجمعيات الخيرية والتي يبلغ عددها (٣٠) جمعية منها (٦) متخصصة و(٢٤) جمعية متعددة الأغراض، ينتسب إليها ما يقارب (١١٣٠٠) عضو بالإضافة الى وجود (٥٠) جمعية تعاونية منها جمعيتين نسائية، ويبلغ عدد لاءءاء المنتسبين لهذه الجمعيات التعاونية اكثر من (٧٠٠٠) عضو.

تتوفر. في المحافظة المرافق والخدمات الاجتماعية التالية :

#### مكاتب التنمية الاجتماعية في محافظة العقبة :

١- مكتب التنمية الاجتماعية / القويره

٢- مكتب التنمية الاجتماعية / الريشة

٣- مركز تنمية الديسه

٤- مكتب الخدمة الاجتماعية / حماية الاسره

أ) صندوق المعونة الوطنية :- يقدم الصندوق عدداً من الخدمات مثل معونة نقدية متكررة وتأهيل جسماني ويقدم الصندوق ايضا مساعدات للاسر التي لديها ابناء معاقين غير قادرين على خدمة نفسهم وذلك بتقديم معونة نقدية شهرية متكررة لهذه الاسر وقد بلغ عددهم (١١٧) حالة . وقدم الصندوق ايضا معونات نقدية طارئة الى (٢٦) حالة في المحافظة.

ب) الصندوق الأردني الهاشمي : يوجد للصندوق (٦) مراكز في المحافظة، بواقع مركز في كل من العقبة والديسه والقويره والريشة ودبة حانوت والحميمة.

#### ٤) قطاع العمل والتدريب المهني:

بلغت نسبة المشتغلين والناشطين إقتصادياً في المحافظة (٤٣.٧%) من إجمالي سكان المحافظة ، حيث بلغت نسبة الناشطين إقتصادياً من الذكور (٦٩.٥%) ومن الإناث (١٤.٦%) من إجمالي المشتغلين في المحافظة، في حين بلغ معدل البطالة للمحافظة

(١١.٧%) منهم (٩.٥%) ذكور و(٢٢.٨%) إناث من إجمالي العاطلين عن العمل في المحافظة لعام ٢٠٠٧،  
دائرة الإحصاءات العامة، التقرير السنوي ٢٠٠٧.

### مراكز التدريب المهني :

مؤسسة التدريب المهني هي إحدى المؤسسات الحكومية ذات الاستقلال المالي والإداري ويتبع لها المراكز الثلاثة التالية :

- ١- مركز التدريب المهني/العقبة – ذكور .
- ٢- مركز التدريب المهني/الخران- إناث .
- ٣- مركز تدريب مهني وادي عربة .

## ٥) قطاع الرعاية الشبابية :

تتولى مديرية شباب محافظة العقبة متابعة جميع النشاطات الرياضية والشبابية التي تقام في محافظة العقبة بشكل مباشر أو غير مباشر، يتبع للمديرية (٤) مراكز للشباب ومركز واحد للشابات ومجمع رياضي واحد وهو مجمع الأمير حمزة الرياضي إضافة إلى معسكر الحسين للشباب وبيت شباب العقبة، تشرف المديرية على (٨) أندية رياضية في المحافظة .

## ٦) الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية :

تعمل مديرية أوقاف محافظة العقبة على تقديم الخدمات والتوعية والتوجيه والتنظيف ونشر رسالة الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة.

### الجدول رقم (٢-٤)

#### عدد المساجد والوعاظ والأئمة في المحافظة

العدد	على مستوى المحافظة
المساجد	٨٨
الواعظات والمرشدات	١٥
الوعاظ والأئمة	٥٥
مؤذن وخادم	٥٥

المصدر :- وزارة الأوقاف، ٢٠٠٨.

## المراكز الإسلامية التابعة للمديرية :

- ١- المركز الإسلامي الثقافي للرجال .
- ٢- المركز الإسلامي الثقافي للنساء .

تتولى هذه المراكز مهام (نشر الوعي الديني ، محاضرات ، ندوات ، ورش عمل، الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية) . ويقع ضمن المركز الإسلامي الثقافي للنساء قاعة لدار القرآن النموذجية تعمل على تدريس مناهج من وزارة الأوقاف في اللغة العربية والسيرة والفقه والحديث والتلاوة والتجويد .

## ثالثاً : التنمية الاقتصادية :

### (١) الزراعة :

تبلغ مساحة الأراضي الزراعية الإجمالية في محافظة العقبة حوالي (١٥٠.٠٠٠) دونماً، المستغل من هذه الأراضي حوالي (٤٣٤١٩) دونماً، وجميعها زراعية مروية واهم الأشجار في المحافظة شجرة النخيل لتمييزها بدرجة حرارة عالية ويبين الجدول المساحات الزراعية المختلفة حسب نوع المحصول :-

الجدول رقم (١-٣)  
المساحات المزروعة حسب نوع المحاصيل

نوع المحصول	المساحات (دونم)
محاصيل حقلية	٨٨٠٠
أشجار مثمرة	٩٣٨٩
الخضروات	٢٥٢٣٠
المجموع	٤٣٤١٩

المصدر :- الإحصاءات العامة، التقرير السنوي ٢٠٠٢.

وبالنسبة للثروة الحيوانية فقد تم إجراء تعداد عام للمواشي في جميع مناطق المحافظة ويبين الجدول التالي أنواع الثروة الحيوانية وعددها.

### الجدول رقم (٢-٣)

#### الثروة الحيوانية

النوع	ضان	ماعز	ابل	أبقار	مزرعة/دجاج	خلايا النحل
العدد	٧١١٠	١٩٧٢٠	م.غ	م.غ	م.غ	م.غ

المصدر :- الإحصاءات العامة، التقرير السنوي ٢٠٠٧.

### (٢) قطاع السياحة والآثار:

تعتبر مدينة العقبة بشكل خاص معلماً سياحياً بارزاً في منطقة الشرق الأوسط ، ومحط أنظار السياحة الداخلية والخارجية لسهولة الوصول إليها براً وبحراً وجواً. لقد تركز الاهتمام في التنمية السياحية على منطقة رم وذلك لافتقار المنطقة للخدمات الأساسية، وتهدف هذه المشاريع إلى توفير البنية التحتية للمواطنين وكذلك توفير الخدمات للسياح والزوار القادمين إلى وادي رم.

ويوجد في المحافظة (١٠) مواقع أثرية وسياحية وهي (مدينة أيلة الإسلامية ، الكنيسة البيزنطية ، قلعة العقبة ، منزل ومتحف قصر الشريف الحسين بن علي، تل الخليفة ، تل المقص ، حجيرة الغزلان ، محطة العلوم البحرية ، وادي رم ، الحميمة) .

## مطالب واحتياجات محافظة العقبة

١. إنشاء مبنى لمحافظة العقبة وسكن المحافظ.
٢. إنشاء مبنى لمديرية الأحوال المدنية والجوازات العامة في محافظة العقبة.
٣. تزويد مكتب الأحوال المدنية في لواء القويرة بجهاز إصدار جوازات سفر.
٤. بناء مدرسة مكونه من (٢٤) غرفة صفية في المنطقة السكنية التاسعة.
٥. بناء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة مكونة من (٢٠) غرفة صفية في محافظة العقبة.
٦. إضافة (٨) غرف صفية لمدرسة فينان الأساسية الجديدة.
٧. إضافة مختبرات فيزياء وكيمياء وحاسوب وقاعة متعددة الأغراض لمدرسة قاع النقب الثانوية للبنات.
٨. بناء مركز صحي قطر / وادي عربية بمساحة (١٥٠)م<sup>٢</sup> (عيادة قروية).
٩. بناء مركز صحي في منطقة حي الكرامة / العقبة بمساحة (٣٥٠)م<sup>٢</sup> (عيادة قروية).
١٠. بناء عيادة فرعية في منطقة أغال / الديسة بمساحة (١٥٠)م<sup>٢</sup>.
١١. بناء عيادة فرعية في منطقة المزفر / العقبة بمساحة (١٥٠)م<sup>٢</sup>.
١٢. أعمال توسعة وتحسين ووضع خلطة إسفلتية لطريق الديسة-سهل الصوان - المدورة على مراحل.
١٣. أعمال تنفيذ وتوسعة لأجزاء من طريق العقبة الخلفي وأعمال إنارة وحمايات.
١٤. اعمل أكتاف لطريق ( العقبة - وادي عربية).
١٥. بناء مركز شباب القريقرة / وادي عربية بمساحة (٤٥٠)م<sup>٢</sup>.
١٦. إنشاء ملاعب لمركز شباب رحمة / وادي عربية.
١٧. إنشاء مبنى لمركز زراعي القويرة وتجهيزه بالأثاث ورفده بالكوادر والآليات.
١٨. تفعيل محطة الديسة الزراعية بإقامة أبنية واستصلاح أراضي وحفر أبار وتزويدها بالكادر والآليات ولوازم الري.
١٩. تفعيل مركز زراعي الريشة ورفده بالكوادر والأثاث والآليات وعيادة بيطرية وبناء سكن وظيفي.
٢٠. إنشاء مركز زراعي في منطقة القريقرة ورفده بالكوادر والآليات.
٢١. ترميم المدخل الرئيسي وواجهة المسجد في مدينة العقبة.
٢٢. إقامة بوابة لمدينة آيلة الإسلامية.
٢٣. تنفيذ مشروع ري الفيدان.
٢٤. إنشاء جدران حماية من القابيون في موقع سد رحمة.
٢٥. فتح وتعبيد الطرق الزراعية المؤدية إلى عيون المياه في القريقرة.
٢٦. إقامة مستودع مركزي للاعلاف في منطقة الراشدية بمساحة (٦٠٠)م<sup>٢</sup>.

مشاریع



# المستوى الوطني

## أبرز المشاريع الرأسمالية على المستوى الوطني

(بالألف دينار)

الرقم	اسم المشروع	الجهة المنفذة	مخصصات ٢٠٠٩	نسبة الإنفاق %	نسبة الإنجاز %	الملاحظات
	مجموع المشاريع الرأسمالية على المستوى الوطني منها المشاريع التالية		٧٣١٥٥٣.٠	٤٧.٤	-	
١.	نقل مياه الديسي لعمان/دراسات	وزارة المياه والري	٣٨٧٠٠	٨٠.١	٢٥	الدراسات والتصاميم انتهت والان الاعداد بالتنفيذ وهذا المشروع تساهم فيه الخزينه بمبلغ ٣٠٠ مليون دولار لمدة اربع سنوات ٢٠٠٩-٢٠١٢.
٢.	دراسة استكشاف الطبقات العميقة.	وزارة المياه والري	٥٠٠	١٠.٢		تم الانتهاء من حفر بئرين استكشافيين في منطقة سواقة.
٣.	إنشاءات مختلفة وإضافات غرف صفية.	وزارة التربية	٣٤٥	١٤٢.٦		المشروع يسير حسب المخطط له.
٤.	تطوير ربط المدارس إلكترونياً.	وزارة التربية	١٥٩٠	٣١.٩		المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات.
٥.	قناة البحرين	وزارة المياه والري	١٣٤٦	٩٩.٨	-	تم توقيع اتفاقيه مع شركه اجنبيه لاعداد الدراسات والتصميم.
٦.	إنشاء مبنى دار القضاء العالي.	وزارة العدل	٧٠٠	-	-	المشروع في مرحلة الدراسات وإعداد التصاميم وتم تأجيله.
٧.	إنشاء مبنى محكمة الجنايات الكبرى.	وزارة العدل	١٨٠٠	٢٩.٦	٤٠	العمل جارٍ في موقع المشروع.
٨.	مبنى دائرة قاضي القضاة.	دائرة قاضي القضاة	١٠٠٠	٩٩.٨	٤	العمل جارٍ في موقع المشروع.
٩.	استملاك أراضي لمخيم الحسين ومخيم مادبا.	الشؤون الفلسطينية	١٠٠٠	٧٢.٢	-	تم الاتفاق مع المالك على قيمة سعر المتر المربع والعمل جاري لتسجيل القطع باسم الخزينه لاغراض دائرة الشؤون الفلسطينية.

١٠.	البرنامج الوطني لإنشاء المباني الحكومية.	وزارة المالية	٢٠٥٠٠	٢٠.٠	المشروع يسير حسب المخطط له.
١١.	المجلس الأعلى لشؤون المعوقين.	وزارة المالية	٣٠٠٠	٤١.٧	المشروع هو دعم من الخزينة للنفقات الرأسمالية للمجلس.
١٢.	تأهيل مكاب النفايات.	وزارة الشؤون البلدية	١٣٠٥	٩.٨	المشروع في طور طرح العطاء.
١٣.	تأسيس صندوق كفاءة الطاقة.	وزارة الطاقة	١٠٠٠	-	بانتظار اقرار القانون الجديد
١٤.	تحديث مرصد الزلازل.	سلطة المصادر الطبيعية	٣٥٠	-	تم انتهاء المرحلة الاولى وتم احالة العطاء على شراء الاجهزة المرحلة الاولى.
١٥.	التقييب عن البترول من خلال تسويق المناطق الاستكشافية.	سلطة المصادر الطبيعية	١٠٠٠	٤٦.٩	انتهاء المرحلة الاولى من انشاء قاعدة معلومات في السلطة.
١٦.	صيانة وتأهيل المبنى الجديد/دائرة مراقبة الشركات.	وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات	٢٠٠	١٨.٣	٩٠ صيانة المبنى في طور التشطيبات النهائية
١٧.	حزمة الأمان الاجتماعي.	وزارة التخطيط	١٠٠	٤٠.٤	المشروع يسير حسب المخطط له.
١٨.	تطوير السياحة الثالث.	وزارة التخطيط	٢٠٤	٧٤.٣	المشروع يسير حسب المخطط له.
١٩.	إنشاء صندوق التراث.	وزارة السياحة والآثار/السياحة	٢٢٠	-	المشروع يسير حسب المخطط له.
٢٠.	إنشاء شركة إدارة وتطوير المواقع السياحية.	وزارة السياحة والآثار/السياحة	٢٠٠	-	بانتظار الموافقة النهائية من دولة رئيس الوزراء لتأسيس الشركة.
٢١.	التنمية الإقليمية والمحلية.	وزارة الشؤون البلدية	١٣٠٠٠	١.٢	تم طرح العطاءات بهذا الخصوص.
٢٢.	إنشاء مبنى جديد لوزارة النقل.	وزارة النقل	١٩٠٠	٢٦.٣	٨ العمل جاري في موقع المشروع.
٢٣.	إنشاء مبنى مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.	وزارة الإتصالات	٩٠٠	٢.٤	تم انجاز ما نسبته ٩٥% من مرحلة اعداد الدراسات والتصاميم

ووثائق عطاء تنفيذ المبنى.						
٢٤. إنشاء مبنى ديوان الخدمة المدنية.	ديوان الخدمة المدنية	١٩٥٠	٣٥.٨	٣٥	العمل جارٍ في موقع المشروع .	
٢٥. نظام تبريد لقصر العدل	وزارة العدل	١٠٠٠	١٥.٦	٢٥	العمل جاري في موقع العمل	
٢٦. معهد الرقابة العربي	ديوان المحاسبة	٩٧٠	-	-	العمل لايسير حسب المخطط.	
٢٧. انشاء نظام ادارة المعلومات الالكترونية EMIS	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	١٢٠	٩٩.٨	٨٥	العمل يسير حسب المخطط.	
٢٨. مشروع تطوير التعليم العالي نحو اقتصاد المعرفة.	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	٨٠٠	٨.٣	٩	العمل يسير حسب المخطط.	
٢٩. دعم الجامعات الحكومية الاردنية	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	١٢٠٠٠	٤١.٧	٢٥	العمل يسير حسب المخطط.	
٣٠. اصدار شهادة عدم محكومة الكترونيا	وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	١٥٠	٨.٦	٥٣	تم الانتهاء من مرحلة اعادة هندسة الاجراءات الخاصة بالمشروع وجاري العمل على تطوير الخدمة الكترونيا.	
٣١. خدمة اصدار تصاريح العمل الكترونيا	وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	٤٠٦	-	١٥	من المتوقع الانتهاء من مرحلة التقييم الفني في شهر آب ٢٠٠٩.	
٣٢. انشاءات مختلفة وازافات صفيه	وزارة التربية والتعليم	٣٤٥	١٣٤.٨	٧٥	اضافات مدارس المجموعه (٣٠،٣٨) عمان الثالثه والرابعه	
٣٣. مشروع قناة البحرين	وزارة المياه والري	١٣٤٦	٩٩.٨		تم توقيع اتفقيه مع شركة اجنبية لاعداد الدراسات والتصاميم.	
٣٤. تطوير وتحديث الابنية/ الأمن العام.	مديرية الأمن العام	١٣٠٠	٨٨.٥	٨٠	المشروع يسير حسب ما خطط له	

## خلاصة المشاريع (الرأسمالية) المرصودة على المستوى الوطني

### مخصصات النفقات الرأسمالية للمشاريع التنموية في قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٠٩

قدرت النفقات الرأسمالية للمشاريع التنموية على المستوى الوطني بمبلغ (٧٣١٥٥٣.٠) ألف دينار موزعة على مختلف القطاعات وحسب الفصول للوزارات والدوائر الحكومية أنفق منها (٣٤٦٦١٩.٨) ألف دينار اي ما نسبته (٤٧.٤%) لغاية ٢٠٠٩/٦/٣٠ وترصد هذه المشاريع في مراكز الوزارات والدوائر الحكومية .

### (بالالف دينار)

البيان	مقدر ٢٠٠٩	الانفاق حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠	نسبة الانفاق الفعلي %
المشاريع - النفقات (الرأسمالية)	٧٣١٥٥٣.٠	٣٤٦٦١٩.٨	٤٧.٤

المصدر: دائرة الموازنة العامة، ٢٠٠٩.

## وزارة المالية :-

بلغت مخصصات وزارة المالية على المستوى الوطني حيث تم تخصيص مبلغ (١٨٠١٤٥.٠) الف دينار مشكل ما نسبته (٢٤.٦%) من اجمالي المخصصات المرصودة للمركز حيث تم انفاق (٨١٦٦٠.٤) الف دينار اي ما نسبته (٤٥.٣%) من المخصصات المرصودة للوزارة حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠، وهي ضمن النسب المستهدفة للانفاق في مثل هذا الوقت من السنة.

## وزارة التخطيط والتعاون الدولي/المجلس القومي للتخطيط:-

بلغت مخصصات وزارة التخطيط والتعاون الدولي/المجلس القومي للتخطيط على المستوى الوطني حيث تم تخصيص (١٠٢٨١.٠) الف دينار مشكلة ما نسبته (١.٤%) من اجمالي المخصصات المرصودة على المستوى الوطني وتم انفاق (٤١٠٦.٨) الف دينار اي ما نسبته (٤٠.٠%) من المخصصات المرصودة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ وهي ضمن النسب المستهدفة للانفاق في مثل هذا الوقت من السنة.

## وزارة الصحة :-

تم تخصيص مبلغ (٣٦٥٦٠.٦) الف دينار لوزارة الصحة على المستوى الوطني مشكله ما نسبته (٥.٠%) من اجمالي المخصصات المرصودة على المستوى الوطني حيث تم انفاق (١٩٥٢٢.٠) الف دينار اي ما نسبته (٥٣.٤%) من المخصصات المرصودة للوزارة حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠، وهي ضمن النسب المستهدفة للانفاق في مثل هذا الوقت من السنة.

## وزارة الاشغال العامة والاسكان:-

تم تخصيص مبلغ (١٠٩٩١٨.٠) الف دينار لوزارة الاشغال العامة والاسكان على المستوى الوطني مشكلة ما نسبته (١٥.٠%) من اجمالي المخصصات المرصودة على المستوى الوطني وتم انفاق (٥٧٦٤٧.٦) الف دينار اي ما نسبته (٥٢.٥%) من المخصصات المرصودة لوزارة الاشغال العامة والاسكان حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠، وهي ضمن النسب المستهدفة للانفاق في مثل هذا الوقت من السنة.

## وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات :-

تم تخصيص مبلغ (٢٦١٥٠.٠) الف دينار لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطني مشكل ما نسبته (٣.٦%) من اجمالي المخصصات المرصودة على المستوى الوطني حيث تم انفاق (١٧١٢٨.٥) الف دينار اي ما نسبته (٦٥.٥%) من المخصصات المرصودة للوزارة حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ .

## وزارة التربية والتعليم :-

تم تخصيص مبلغ (١٧٣٥٣.٠) الف دينار لوزارة التربية والتعليم على المستوى الوطني مشكل ما نسبته (٢.٤%) من اجمالي المخصصات المرصودة حيث تم انفاق (٥٢٦١.٦) الف دينار اي ما نسبته (٣٠.٣%) من المخصصات المرصودة للوزارة حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ .

## وزارة الزراعة :-

تم تخصيص مبلغ (١٠٠١٩.٥) الف دينار لوزارة الزراعة مشكل ما نسبته (١.٤%) من اجمالي المخصصات المرصودة على المستوى الوطني حيث تم انفاق (٣٩٠٤.٤) الف دينار اي ما نسبته (٣٩.٠%) من المخصصات المرصودة للوزارة حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ .

## وزارة الطاقة والثروة المعدنية :-

تم تخصيص مبلغ (١٢٠٥٤.٥) الف دينار لوزارة الطاقة والثروة المعدنية على المستوى الوطني مشكل ما نسبته (١.٦%) من اجمالي المخصصات المرصودة للمركز حيث تم انفاق (٤١٦٢.٨) الف دينار اي ما نسبته (٣٤.٥%) من المخصصات المرصودة للوزارة حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ .

## وزارة التنمية الاجتماعية :-

تم تخصيص مبلغ (١٣٨٥٢.٠) الف دينار لوزارة التنمية الاجتماعية على المستوى الوطني مشكل ما نسبته (١.٩%) من اجمالي المخصصات المرصودة للمركز حيث تم انفاق (٣٧٨٩.٤) الف دينار اي ما نسبته (٢٧.٤%) من المخصصات المرصودة للوزارة حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ .

## وزارة العدل :-

تم تخصيص مبلغ (٩٤٥٦.٥) الف دينار لوزارة العدل على المستوى الوطني مشكل ما نسبته (١.٣%) من اجمالي المخصصات المرصودة للمركز حيث تم انفاق (٢٧٩٧.٧) الف دينار اي ما نسبته (٢٩.٦%) من المخصصات المرصودة للوزارة حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠.

## الوزارات والدوائر الاخرى:-

تم تخصيص مبلغ ( ٣٠٥٧٦٢.٩ ) ألف دينار لباقي الوزارات والدوائر الحكومية على المستوى الوطني او ما نسبته (٤١.٨%) من اجمالي المخصصات المرصوده على المستوى الوطني والمركز حيث تم انفاق (١٧٨٩٣٧.٩) ألف دينار اي ما نسبته (٥٨.٥%) من المخصصات المرصودة للوزارات والدوائر الاخرى حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠.



وفيما يلي تقرير مفصل عن أهم المشاريع التي تم تقييمها :-

بالآلف دينار

١ - مشروع نقل مياه الديسي لعمان	
٣٠٠٠٠٠	الكلفة الكلية
٦٠ شهراً	مدة التنفيذ
٣٨٧٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٩
٣١٠١٠.٧	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
٨٠.١%	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩
٢٠.٠%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
تساهم الخزينه بمبلغ (٣٠٠) مليون دولار تدفع على مدى (٥) سنوات ٢٠٠٩-٢٠١٣ تم طرح العطاء وإحالتها على شركة جاما إنيرجي التركية من خلال نظام الـ BOT وعلى عمق ٥٠٠ متر يتم حفر (٥٥) بئر في منطقة الديسي فيما يستهلك ما يقدر (٢٥٠) ألف طن من الحديد.	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
٢٠%	نسبة الانجاز التراكمية
المشروع يسير حسب البرنامج الزمني المعدل سيتم بعد الإنتهاء من تصميم المخططات والتصاميم اللازمة للمشروع إلى المباشرة باعمال الحفر ومد الخطوط الناقلة للمياه بداية شهر آذار ٢٠٠٩	تقييم المشروع
-	ملاحظات


بالآلف دينار

٢ - مشروع دراسة إستكشاف الطبقات العميقة	
٥٠٠	الكلفة الكلية
مستمر	مدة التنفيذ
٥٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٩
٠	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
٠%	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩
٠%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
تم الإنتهاء من حفر بئرين إستكشافيين في منطقة سواقه.	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
٠%	نسبة الانجاز التراكمية
المشروع يسير حسب ما خطط له	تقييم المشروع
مشروع سنوي يهدف إلى إيجاد مصادر مائية إضافية لأغراض الشرب من خلال حفر بئرين وسط المملكة يصل عمق البئر إلى حوالي (١٠٠٠) متر .	ملاحظات

بالآلف دينار

٣- مشروع تطوير ربط المدارس إلكترونياً	
٩٠٠	الكلفة الكلية
مستمر	مدة التنفيذ
١٥٩٠	مخصصات عام ٢٠٠٩
٥٠٦.٩	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
٣١.٩%	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩
%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
مشروع سنوي لربط المدارس إلكترونياً بشبكة الإنترنت لتسهيل عملية التعليم ونقل المعرفة لكافة المدارس	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية :
%	نسبة الانجاز التراكمية:
يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات	تقييم المشروع
-	ملاحظات

بالآلف دينار


٤- مشروع إنشاء مبنى جديد لوزارة النقل		
	٣١١٦	الكلفة الكلية
	١٦ شهراً	مدة التنفيذ
	١٩٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٩
	٥١١.٦	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
	٢٦.٩%	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩
	٧%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
	قيد التنفيذ	سير العمل في المشروع
	-	الأوامر التغييرية :
	٧%	نسبة الانجاز التراكمية:
المشروع يسير حسب المخطط المعدل له بسبب التأخر في طرح وإحالة العطاء		تقييم المشروع
يهدف المشروع إلى إنشاء مبنى إضافي جديد مناسب لوزارة		ملاحظات

النقل بمساحة إجمالية تبلغ (٥٠٠٠) متر (٨) طوابق بالإضافة  
إلى إعادة تأهيل البناء القديم بحدود (٢٠٠٠) م .


بالآلف دينار

٥- مشروع إنشاء مبنى مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني	
٦٠٠٠	الكلفة الكلية
٢٤ شهراً / جديد	مدة التنفيذ
٩٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٩
	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
٢١.٧%	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩
٢.٤%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
انجاز ٩٥% من مرحلة اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق عطاء تنفيذ المركز.	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
٥%	نسبة الانجاز التراكمية
المشروع يسير حسب المخطط له	تقييم المشروع
يهدف المشروع إلى إنشاء مبنى يخدم مهام المركز	ملاحظات

بالآلف دينار

٦- مشروع إنشاء مبنى ديوان الخدمة المدنية		
	٤٠٠٠	الكلفة الكلية
	٣٦ شهراً	مدة التنفيذ
	١٩٥٠	مخصصات عام ٢٠٠٩
	٦٩٨.٠	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
	٣٥.٨%	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩
	١٥%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
تم إحالة العطاء على المقاول شركة يوسف سمارة والعمل جارٍ في موقع المشروع		سير العمل في المشروع
-		الأوامر التغييرية
	٣٩%	نسبة الانجاز التراكمية
يسير حسب ما خطط له ولا يوجد معوقات.		تقييم المشروع
		ملاحظات

بالآلف دينار

٧- مشروع تطوير وتحديث الأبنية / الأمن العام		
	١.٤٥٠	الكلفة الكلية
	سنوي	مدة التنفيذ
	مستمر	مخصصات عام ٢٠٠٩
	٨٢٠٠	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
	٨٢٠٠	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩
	١٠٠%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
	١٠٠%	

العمل مستمر في المشروع - ١٠٠% لمبنى القيادة والسيطرة ٢٥% لمبنى مديرية الأمن العام يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات	سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية تقييم المشروع
يهدف المشروع إلى إنشاء مراكز ومديريات الشرطة وتوسعة القائم منها	ملاحظات

بالآلاف دينار

٨- مشروع تحديث الأبنية / وزارة الداخلية / الأمن العام	
١٣٠٠ مستمر ١٣٠٠ ١١٥٠ ٨٨.٥% ١٠٠% العمل مستمر في المشروع - ٨٥% يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية تقييم المشروع ملاحظات
يهدف المشروع إلى إنشاء وتوسعة مديريات ومراكز الترخيص	

بالآلاف دينار

٩- مشروع إنشاء مبنى دار القضاء العالي	
٧٢٠٠ ٣٦ شهراً ٧٠٠ - - المشروع في مرحلة الدراسات وإعداد التصاميم. تم تحديد قطعة الأرض في منطقة الرونق وبعدها تم تغيير قطعة الأرض إلى منطقة أخرى / شارع الإستقلال - -	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية

<p>المشروع يسير دون المستوى المخطط له بسبب تغيير الموقع وأصبح بحاجة لدراسات وتصاميم جديدة حيث طرح عطاء الدراسات من جديد (مسابقة معمارية)</p>	<p>تقييم المشروع</p>
<p>يهدف المشروع إلى إنشاء مبنى جديد لدار القضاء العالي ضمن خطة وزارة العدل لأن تكون مباني المحاكم حديثة ومستقلة لتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة والإستقلال القضائي</p>	<p>ملاحظات</p>


بالآلف دينار

### ١٠ - مشروع إنشاء مبنى محكمة الجنايات الكبرى

	٦١٦٦ ٣٦ شهراً ١٨٠٠ ٥٠١.٤ %٢٩.٦ %٢٥	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع
تم طرح العطاء وإحالته على شركة اللفداوي للمقاولات وتمت المباشرة بأعمال التنفيذ بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٢٣ والإشراف على مكتب هندسي مهيب مدانات، والعمل مستمر على أرض الواقع.	- %٤٠ يسير بنسب أعلى من المخطط له	الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية تقييم المشروع
-	-	ملاحظات

بالآلف دينار

### ١١ - مشروع مبنى دائرة قاضي القضاة

	١٢٥٠٠ ٣٠ شهراً ١٠٠٠ ٩٩٧.٨ %٩٩.٨ %٤	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع
تم المباشرة بالعمل بتاريخ ٢٠٠٩/١/٣	- %٤ المشروع يسير حسب المخطط له .	الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية تقييم المشروع
-	-	ملاحظات

بالف دينار

١٢ - مشروع إستملاك أراضي لمخيم الحسين و مخيم مادبا	
١٠٠	الكلفة الكلية
سنوي	مدة التنفيذ
١٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٩
٧٢.٢	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
%٧٢.٢	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩
%٥	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
تم إصدار قرارات من المحكمة المختصة بالإستملاك الفوري لصالح دائرة الشؤون الفلسطينية	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
%٥	نسبة الانجاز التراكمية
المشروع يسير في مراحل تسجيل المساحة المستملكة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية وتخصيصها لاغراض دائرة الشؤون الفلسطينية.	تقييم المشروع
-	ملاحظات

بالألف دينار

١٣ - مشروع البرنامج الوطني لإنشاء المباني الحكومية	
٢٠٥٠٠	الكلفة الكلية
سنوي	مدة التنفيذ
٢٠٥٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٩
٤١٠١.٣	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
%٢٠.٠	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩
%١٨	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
المشروع هو لتسديد أقساط وفوائد البرنامج الوطني لإنشاء المباني الحكومية	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
%١٨	نسبة الانجاز التراكمية
يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات	تقييم المشروع
مشروع سنوي يهدف إلى تنفيذ مجموعة من مشاريع الأبنية لعدد	ملاحظات



بالآلف دينار

١٤ - مشروع المجلس الأعلى لرعاية المعوقين	
١٣٥٠٠	الكلفة الكلية
٢٠١١-٢٠٠٨	مدة التنفيذ
٣٠٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٩
١٢٥٠	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
%٤١.٧	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩
%٣٥	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
المشروع هو دعم من الخزينة للنفقات الرأسمالية للمجلس	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
%٣٥	نسبة الانجاز التراكمية
يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات	تقييم المشروع
يهدف المشروع إلى مساهمة من الحكومة لإنشاء المجلس الأعلى لرعاية المعوقين لكافة مناطق ومحافظات المملكة	ملاحظات

بالآلف دينار

١٥ - مشروع تأهيل مكاب النفايات	
١٤٠٠٠	الكلفة الكلية
٦٠ شهراً	مدة التنفيذ
١٣٠٥	مخصصات عام ٢٠٠٩
١٢٧.٩	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
%٩.٨	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٩
%٥	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
-	سير العمل في المشروع
طرحت العطاءات المتعلقة بهذا المشروع والعمل جاري على احالة العطاءات.	الأوامر التغييرية
-	

نسبة الانجاز التراكمية	٥%
تقييم المشروع	يسير دون المخطط له
ملاحظات	يهدف المشروع إلى تأهيل وشراء آليات لمكاب النفايات البالغ عددها (١٦) مكب .

بالآلف دينار

١٦ - مشروع تأسيس صندوق كفاءة الطاقة	
٥٠٠٠ مستمر ١٠٠٠ . .	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع
بانتظار اقرار قانون جديد لدعم صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. - -	الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية تقييم المشروع
مشروع سنوي لتنفيذ عدد من الإجراءات الضرورية الواردة في الإستراتيجية الوطنية لتحسين كفاءة إستهلاك الطاقة وتحفيز الجهات المانحة الدولية لدعم صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة	ملاحظات

بالآلف دينار

١٧ - مشروع تحديث مرصد الزلازل	
٣٥٠ مستمر ٣٥٠ . %٠ %٩٠	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: اذن
تم الانتهاء من المرحلة الاولى من العطاء والمرحلة الثانيه تركيب الاجهزه علما بان الاجهزه موجوده في سلطة المصادر الطبيعية. - %٩٠ يسير حسب المخطط له	الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية تقييم المشروع
العمل على تحديث وتجهيز مرصد الزلازل الأردني وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات حسب التطورات العالمية الحالية .	ملاحظات

بالألف دينار

١٨ - مشروع التنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الإستكشافية	
١٠٠٠	الكلفة الكلية
مستمر	مدة التنفيذ
١٠٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٩
٤٦٩.٠	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
%٤٦.٩	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩
%١٠٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
الانتهاء من انشاء قاعدة معلومات لتسويق المناطق الاستكشافية.	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
%١٠٠	نسبة الانجاز التراكمية
يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات	تقييم المشروع
مشروع سنوي لدراسة المناطق الإستكشافية الحالية وتقييم المعلومات الفنية المتوفرة لغايات إعادة تقييمها مجدداً وحسب مساحات التراكيب الجيولوجية إلى مساحات أقل من المعتمدة حالياً	ملاحظات
.	

بالألف دينار

١٩ - مشروع صيانة وتأهيل المبنى الجديد / دائرة مراقبة الشركات	
٥٠٠	الكلفة الكلية
	مدة التنفيذ
٢٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٩
٣٦.٦	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
%١٨.٣	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩
%٩٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
التشطيبات النهائية لصيانة المبنى	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية

نسبة الانجاز التراكمية تقييم المشروع	٩٠% المشروع يسير دون المستوى المخطط له بسبب التأخير في طرح وإحالة العطاء
ملاحظات	يهدف المشروع إلى تأهيل مبنى مؤسسة المواصفات والمقاييس ليتناسب مع حجم وطبيعة عمل دائرة مراقبة الشركات

### بالألف دينار

٢٠ - مشروع حزمة الأمان الإجتماعي	
الكلية الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع	٤٥٠٠ لكل مشاريع حزمة الامان الاجتماعي مستمر ١٠٠ ٤٠.٤ ٤٠.٤% ٤٠.٤% - المشروع قيد التنفيذ
الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية تقييم المشروع	- % يسير حسب المخطط له
ملاحظات	يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الفقيرة

### بالألف دينار

٢١ - مشروع تطوير السياحة الثالث	
الكلية الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع	٥٠٠٠٠ ٢٠١٢-٢٠٠٦ ١٠٠٠٠ (خزينه وقروض) ١٥١.٥ خزينه ٧٤.٣% ٣٥% - يجري حالياً العمل على تقييم العروض الخاصة بعطاء إعداد التصاميم والإشراف على مشروع تطوير وإعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية في عجلون وتأهيل مجمع الباصات في جرش - يتم حالياً تنفيذ تأهيل مسجد السلط وتأهيل شبكة الطرق والبنية

<p>التحتية وصيانة مبنى السرايا في وسط مدينة مادبا</p> <p>- تم إحالة عطاء تنفيذ تأهيل شبكة الطرق والبنية التحتية في وسط مدينة جرش .</p> <p>-</p> <p>٢٠% لمواقع السلط</p> <p>١٥% لمواقع مادبا</p> <p>يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات</p>	<p>الأوامر التغييرية</p> <p>نسبة الانجاز التراكمية</p> <p>تقييم المشروع</p>
<p>يهدف المشروع إلى تطوير وسط كل من مدن جرش ، مادبا ، الكرك ، السلط وعجلون وذلك بالتعاون مع البلديات المعنية .</p>	<p>ملاحظات</p>

#### بالآلاف دينار

٢٢- مشروع إنشاء صندوق التراث	
<p>٣٠٠ سنوي</p> <p>مستمر</p> <p>٢٢٠</p> <p>٠</p> <p>٠%</p> <p>٠%</p> <p>تم فتح حساب للإنفاق على ترميم المباني التراثية في المملكة وتم وضع دراسات ومعايير لترميم هذه المباني من قبل الوزارة</p> <p>-</p> <p>٠%</p> <p>يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات</p>	<p>الكلية الكلية</p> <p>مدة التنفيذ</p> <p>مخصصات عام ٢٠٠٩</p> <p>الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠</p> <p>نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩</p> <p>نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:</p> <p>سير العمل في المشروع</p> <p>الأوامر التغييرية</p> <p>نسبة الانجاز التراكمية</p> <p>تقييم المشروع</p>
<p>يهدف إلى تأمين نفقات التأسيس لإنشاء صندوق التراث للمحافظة على التراث العمراني والحضري للمساهمة في تقدير وتنويع المنتج السياحي</p>	<p>ملاحظات</p>

#### بالآلاف دينار

٢٣- مشروع إنشاء شركة إدارة وتطوير المواقع السياحية	
<p>١٥٠٠</p> <p>٢٠٠٩-٢٠٠٨</p> <p>٢٠٠</p> <p>-</p>	<p>الكلية الكلية</p> <p>مدة التنفيذ</p> <p>مخصصات عام ٢٠٠٩</p> <p>الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠</p>

<p>- يوجد قرار مبدئي من دولة رئيس الوزراء لتأسيس الشركة:</p> <p>- تم استكمال الدراسات والتصاميم وتم عرضها على دولة الرئيس</p> <p>- بانتظار الموافقة النهائية من دولة الرئيس لتأسيس الشركة</p> <p>-</p> <p>- يسير دون المخطط</p>	<p>نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع</p> <p>الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية تقييم المشروع</p>
<p>يهدف المشروع إلى إنشاء شركة لإدارة وتطوير المواقع السياحية لتوفير أفضل الخدمات في المواقع السياحية وإدارة وتشغيل المواقع بكفاءة عالية</p>	<p>ملاحظات</p>

## بالألف دينار

٢٤ - مشروع التنمية الإقليمية والمحلية	
<p>٣٨٠٠٠</p> <p>٦٠ شهر</p> <p>١٣٦٦٥ خزينة وقروض</p> <p>٢٤٥.٤ خزينه</p> <p>١.٢ %</p> <p>%</p> <p>تم طرح العطاءات وبانتظار الاحاله ويبدأ الدفع في النصف الثاني من العام.</p> <p>-</p> <p>%</p> <p>يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٩ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩: سير العمل في المشروع</p> <p>الأوامر التغييرية نسبة الانجاز التراكمية تقييم المشروع</p>
<p>يهدف المشروع إلى بناء القدرات المؤسسية لوزارة الشؤون البلدية</p>	<p>ملاحظات</p>

بالألف دينار

٢٥- مشروع انشاءات مختلفة واضافات صفيه	
٩٣١٠	الكلفة الكلية
سنوي	مدة التنفيذ
٣٤٥	مخصصات عام ٢٠٠٩
٤٦٥	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
%١٣٤.٨	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩
%٦٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
اضافات مدارس المجموعه (٣٠،٣٨) عمان الثالثة والرابعه	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
%٧٥	نسبة الانجاز التراكمية
يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات	تقييم المشروع
	ملاحظات

بالألف دينار

٢٦- مشروع قناة البحرين	
١٨٠٠	الكلفة الكلية
٤٨ شهر	مدة التنفيذ
١٣٤٦	مخصصات عام ٢٠٠٩
١٣٤٣.٦	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
%٩٩.٨	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩
%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
تم توقيع اتفاقية مع شركة اجنبية لاعداد الدراسات والتصميم.	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
%	نسبة الانجاز التراكمية
يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات	تقييم المشروع
	ملاحظات



بالألف دينار

٢٧- مشروع نظام تبريد لقصر العدل	
١٥٠٠	الكلفة الكلية
١٢ شهر	مدة التنفيذ
١٠٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٩
١٥٥.٥	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٩/٦/٣٠
%١٥.٦	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٩
%٢٥	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٩:
العمل جاري في قصر العدل ويبدأ العمل في المشروع بعد دوام الموظفين	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
%٢٥	نسبة الانجاز التراكمية
يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات	تقييم المشروع
	ملاحظات

تم بحمد الله .
