

محافظة البلقاء

محافظة البلقاء

لمحة عامة:



تتميز محافظة البلقاء بطبيعتها الجبلية وبتنوع المناخ والتضاريس، فهي تقع في الجزء الغربي من المملكة حيث تكتسب موقعاً متوسطاً بين كافة محافظات المملكة إشتهرت بطبيعتها الخلابة وكرومها الجميلة وآثارها القديمة.

التضاريس والمناخ:

تتميز المحافظة بتنوع المناخ والتضاريس إذ تنخفض منطقة الأغوار لتصل إلى (٢٢٤)م تحت سطح البحر، أما الجبال فيصل ارتفاعها إلى (١١٣٠)م ، حيث أن مناطقها المرتفعة تمتاز بمناخ ماطر وبارد شتاءً ومعتدل صيفاً، ويبلغ معدل هطول الأمطار فيها (٦٠٠) ملم، أما المناطق المنخفضة (الأغوار) فتتميز باعتدال درجات الحرارة شتاءً وإرتفاع درجات الحرارة صيفاً ويبلغ معدل هطول الأمطار فيها (١٥٠-٢٠٠) ملم، مما يعطي المحافظة ميزة زراعية نسبية تساعدها على التنوع في الزراعات على مدار العام، فضلاً عن الأهمية السياحية بفصلها الشتاء والصيف.

الموقع والمساحة:

تقع محافظة البلقاء في الجزء الغربي من المملكة، وتمتاز محافظة البلقاء بموقعها الوسطي بين محافظات المملكة ويبعد مركز المحافظة عن العاصمة عمان حوالي (٢٥) كم، وتبلغ مساحة محافظة البلقاء حوالي (١١١٩) كم^٢ وبهذا تشكل المحافظة ما نسبته (١.٣%) من المساحة الكلية للمملكة.

الواقع السكاني والكثافة السكانية:

يبلغ عدد السكان في المحافظة حوالي (٣٨٣٤٠٠) نسمة (دائرة الإحصاءات العامة ٢٠٠٧)، ويتوزع سكان المحافظة على ألوية المحافظة الخمسة، ويلاحظ بأن هناك تركز سكاني في لوائي عين الباشا وقصبة السلط بنسبة (٣٧%، ٣٢%) على التوالي، فيما يلاحظ الكثافة السكانية البارزة على مستوى المحافظة في لواء عين الباشا إذ تبلغ (١٤٥٦.٥) نسمة/كم^٢.

الجدول رقم (١)

التوزيع السكاني حسب الجنس واللواء والكثافة السكانية في محافظة البلقاء

معدل الكثافة السكانية فرد/كم ^٢	النسبة %	المساحة كم ^٢	النسبة من المحافظة %	عدد السكان (نسمة)		اللواء
				ذكور	إناث	
٢٦٨	٤٠	٤٥٤	٣١.٧	٥٨٩٨٠	٦٢٦٥٠	لواء القصبة
٨٢٣	٣	٣٠	٦.٤	١١٩٤٠	١٢٧٤٠	ماحص والفحيص
٢١٢	٢١	٢٤٣	١٣.٤	٢٤٥٨٠	٢٦٨٧٠	دير علا
١٤٦	٢٧	٢٩٤	١١.٣	١٩٦٩٠	٢٣٢١٠	الشنونة الجنوبية
١٤٥٦.٥	٩	٩٨	٣٧.٢	٦٩١١٠	٧٣٦٣٠	عين الباشا
٣٤٢.٦	١٠٠	١١١٩	١٠٠	٣٨٣٤٠٠		المجموع

المصدر :- دائرة الإحصاءات العامة، ٢٠٠٧.

التقسيمات الإدارية:

تقسم المحافظة إدارياً إلى خمسة ألوية هي :-

- أولاً : لواء قصبة السلط :
- قضاء العارضة
 - قضاء عيرا ويرقا
 - قضاء علان
 - قضاء زي

ثانياً : لواء الشنونة الجنوبية.


ثالثاً : لواء دير علا.

رابعاً : لواء عين الباشا.

خامساً : لواء الفحيص.

الخارطة رقم (١)

خارطة محافظة البلقاء حسب الألوية والقرى

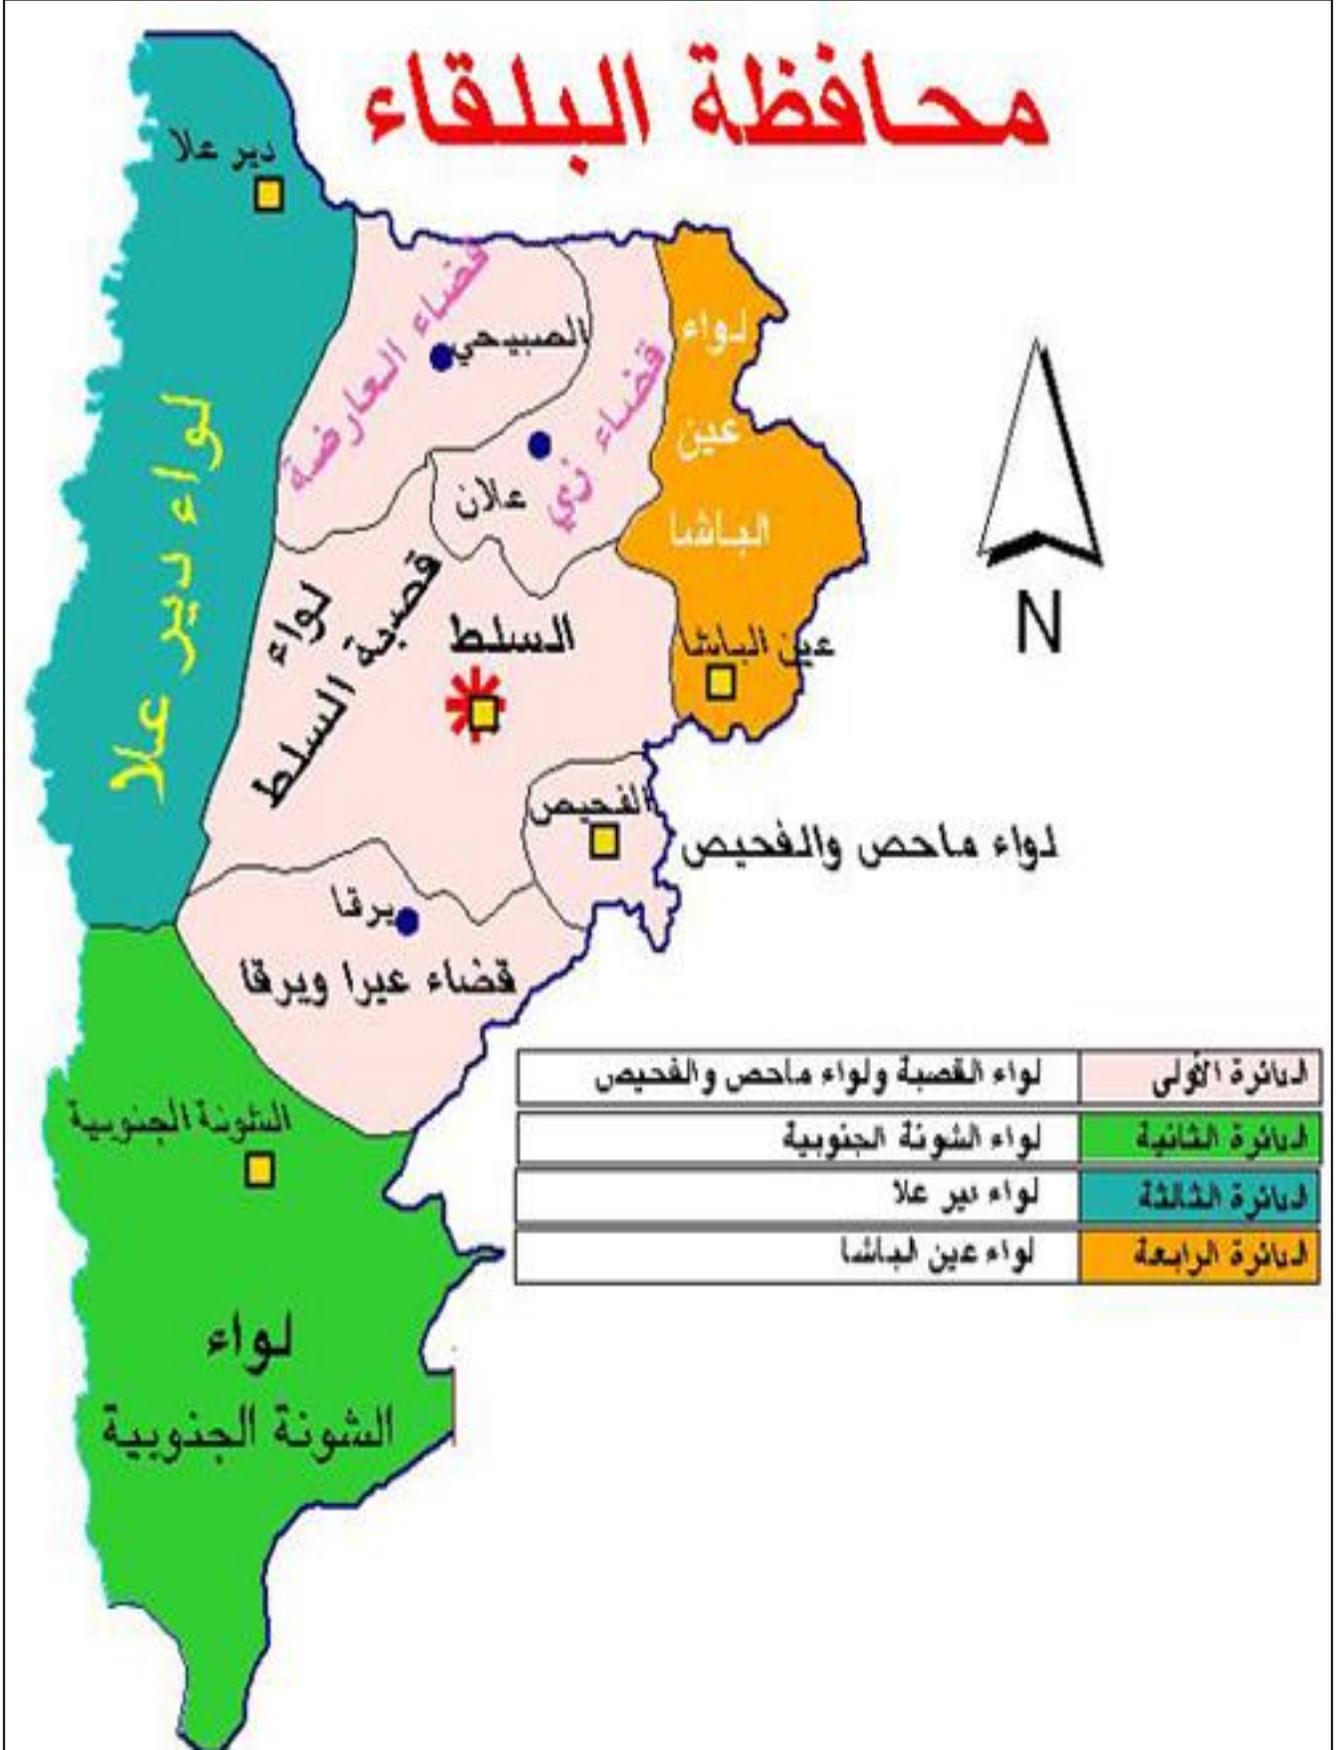

أبرز المشاريع الرأسمالية لمحافظة البلقاء

(بالألف دينار)

الرقم	اسم المشروع	الجهة المنفذة	مخصصات ٢٠٠٨	نسبة الإنفاق %	نسبة الإنجاز %	الملاحظات
	مجموع المشاريع الرأسمالية للمحافظة منها المشاريع التالية		٣٨٢٢٢.٦	٩٩.٨		
١.	إنشاء مبنى محافظة البلقاء وسكن المحافظ. مستشفى البقعة.	وزارة الداخلية	٢٠٥٠	٩٦.٥	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع وتم الاستلام الأولي.
٢.	مستشفى البقعة.	وزارة التخطيط	-	-	٤٠	العمل جارٍ في موقع المشروع-تم الإنفاق على المشروع من أصل القرض الصيني
٣.	إكمال طريق السلط الدائري/ الجزء الأول.	وزارة الأشغال	١٢٠٠	١٠٠	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع وتم الاستلام الأولي.
٤.	تنفيذ طريق الشونة الشمالية/الجنوبية/ منطقة كريمة .	وزارة الأشغال	١٥٠٠	١٠٠	٧٠	العمل جارٍ في موقع المشروع مع ملاحظة أن المشروع يسير دون المستوى المخطط له بسبب انتهاء فترة المشروع.
٥.	تقاطعات البقعة.	وزارة الأشغال	٤٩٠٠	١٠٠	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع وتم استلامه أولياً.
٦.	تحسين وتنفيذ تقاطع أم النعاج.	وزارة الأشغال	٢٠٠	١٠٠	١٠	تم طرح العطاء وتمت إحالته والمشروع يسير دون المستوى المخطط له بسبب التأخر في طرح وإحالة العطاء.
٧.	تنفيذ جسر على تقاطع عين الباشا.	وزارة الأشغال	٣٤٠٠	١٠٠	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع/ قيد الاستلام الأولي .
٨.	طريق السلط/الأغوار.	وزارة الأشغال	٢٥٠٠	١٠٠	٩٢	العمل جارٍ في موقع المشروع.
٩.	إنشاء طريق عيرا/الكرامة.	وزارة الأشغال	٢٥٠	٨٨	٥٥	العمل جارٍ في موقع المشروع.
١٠.	ري دامية.	سلطة وادي الأردن	١١٧٢	٩٩	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع/ قيد الاستلام الأولي.
١١.	مدرسة علي بن أبي طالب الشرعية.	وزارة التربية	٥٣٠	١٠٠	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع/ قيد الاستلام الأولي.
١٢.	إنشاء مستشفى السلط الجديد.	وزارة الصحة	-	-	-	المشروع في مرحلة الدراسات وإعداد التصاميم

ويسير دون المستوى المخطط له - تم نقل جميع المخصصات لمشاريع أخرى					
---	--	--	--	--	--

(بالآلف دينار)

الرقم	اسم المشروع	الجهة المنفذة	مخصصات ٢٠٠٨	نسبة الإنفاق	نسبة الإنجاز %	الملاحظات
١٣.	تنفيذ كيبيل للمشاريع الاستثمارية في منطقة الزارة.	سلطة وادي الأردن	١٢١٣	١٠٠	٢٠	العمل جارٍ في موقع المشروع ويسير دون المستوى المخطط له بسبب تأخر وزارة الأشغال من تحديد المسار الآمن للكوابل.
١٤.	إسكان الأسر الفقيرة .	وزارة الأشغال	٧٦١	١٠٠	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع وتم الاستلام الأولي.
١٥.	القرى الحضرية.	وزارة الأشغال	-	-	-	المشروع في مرحلة الدراسات وإعداد التصاميم ويسير دون المستوى المخطط له وتم إجراء مناقشات من المخصص لمشاريع أخرى

خلاصة التقييم لأهم المشاريع التنموية والرأسمالية لمحافظة البلقاء

مخصصات النفقات الرأسمالية للمشاريع التنموية في قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٠٨

بلغت مخصصات المشاريع الرأسمالية لمحافظة البلقاء (٣٨٢٢٢.٦) ألف دينار لعام ٢٠٠٨ موزعة على القطاعات وحسب الفصول للوزارات والدوائر الحكومية في حين بلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ (٣٨١٥٨.٦) ألف دينار أي ما نسبته (٩٩.٨%) من إجمالي المخصصات الرأسمالية المقدرة للمحافظة وهي نسبة ضمن المستوى المستهدف للإنفاق ، وتعتبر نسبة مرتفعة بالمقارنة مع بعض المحافظات الأخرى كما في الشكل رقم (١).


(بالآلف دينار)

البيان	مقدر ٢٠٠٨	الانفاق حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	نسبة الإنفاق الفعلي %
المشاريع الرأسمالية	٣٨٢٢٢.٦	٣٨١٥٨.٦	٩٩.٨

المصدر: دائرة الموازنة العامة.

شكل رقم (١)


مقارنة الاتفاق الفعلي للمشاريع الرأس مالية حسب القطاعات
لمحافظة ماديا

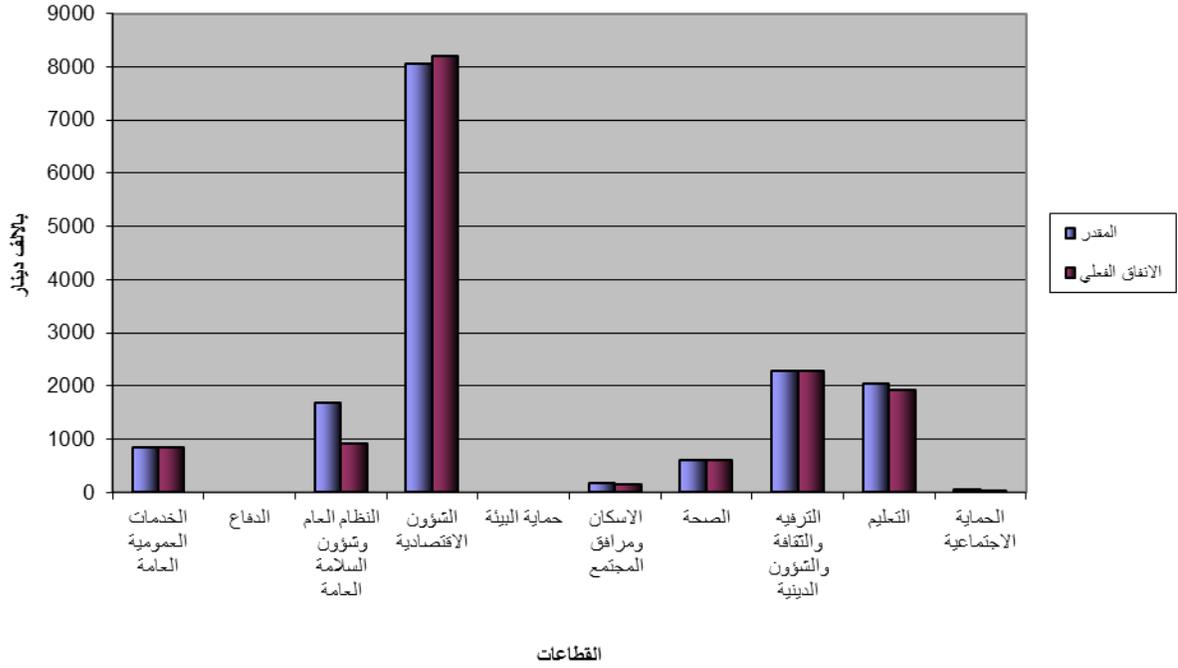

ويشير توزيع المخصصات المالية لمحافظة البلقاء حسب القطاعات الوظيفية إلى أن قطاع الشؤون الاقتصادية إستأثر على ما نسبته (٥٠.٩%) من إجمالي مخصصات محافظة البلقاء لعام ٢٠٠٨ وذلك من أجل تنمية المحافظة إقتصادياً والمساهمة في تخفيض معدلات البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة من مشاريع البنية التحتية ومشاريع تعزيز الإنتاجية وتحفيز الإستثمارات المحلية، ويأتي في المرتبة الثانية قطاع الإسكان ومرافق المجتمع والذي حاز على ما نسبته (٢٦.٦%) من إجمالي مخصصات محافظة البلقاء وتلاه قطاع التعليم وقطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة كما هو واضح في الشكل رقم (٢) .

شكل رقم (٢)

التوزيع القطاعي للمشاريع الرأسمالية لمحافظة مادبا

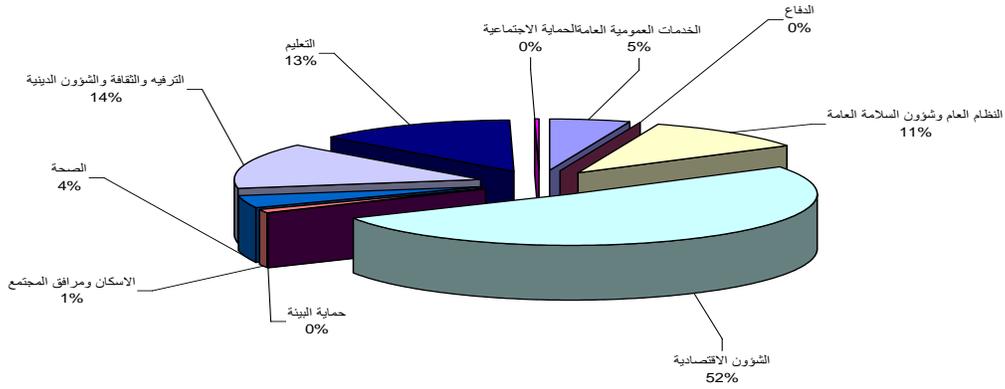

■ الحماية الاجتماعية ■ التعليم ■ الترفيه والثقافة والشؤون الدينية ■ الصحة ■ الاسكان ومرافق المجتمع ■ حماية البيئة ■ الشؤون الاقتصادية ■ النظام العام وشؤون السلامة العامة ■ الدفاع ■ الخدمات العمومية العامة

وفي ما يلي تحليل موجز لأبرز مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب الفصول:-

الإشغال العامة والإسكان :-

احتلت وزارة الأشغال العامة والإسكان المرتبة الأولى من حيث حجم المخصصات المرصودة للمحافظة وحجم الإنفاق حيث تم تخصيص (١٨٤٣١.٧) الف دينار مشكلة ما نسبته (٤٨.٢%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ (١٨٣٩٨.٣) الف دينار اي ما نسبته (٩٩.٨%) من المخصصات المرصودة لوزارة الأشغال العامة والإسكان في المحافظة وتعتبر من النسب المرتفعة في مثل هذا الوقت من السنة.

وزارة المياه والري /سلطة وادي الاردن :-

تم تخصيص مبلغ (١٠١٥٩) الف دينار لسلطة وادي الاردن في محافظة البلقاء مشكلة ما نسبته (٢٦.٦%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، حيث تم انفاق (١٠٢٦٣.٧) الف دينار اي ما نسبته (١٠١%) من المخصصات المرصودة للسلطة في المحافظة، حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١، وهي نسبة ضمن المستوى المستهدف في مثل هذا الوقت من السنة .

الصحة :-

تم تخصيص مبلغ (١٤٤٩.٥) الف دينار لوزارة الصحة في محافظة البلقاء مشكلة ما نسبته (٣.٨%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، حيث تم انفاق (١٤١٥.٨) الف دينار اي ما نسبته (٩٧.٧%) من المخصصات المرصودة للوزارة في المحافظة حتى

تقييم المشروع :	يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات.
ملاحظات :	-

بالآلف دينار

٢- مشروع مستشفى البقعة	
<p>تشرين أول ٢٠٠٨</p>  <p>21/10/2008</p>	<p>كانون أول ٢٠٠٨</p> <p>١٥٠٠٠ ٢٠ شهراً ١٧٠٠ تم إجراء مناقلات بكامل المخصص</p> <p>- - -</p>
<p>المشروع في مرحلة التنفيذ والعمل مستمر على أرض الواقع.</p> <p>- ٤٠%</p> <p>المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات.</p> <p>تم الإنفاق على المشروع من أصل القرض الصيني.</p>	<p>الكلفة الكلية : مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨</p> <p>الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:</p> <p>سير العمل في المشروع: الأوامر التغييرية : نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الإجمالية: تقييم المشروع : ملاحظات :</p>

بالآلف دينار

٣- مشروع إكمال طريق السلط الدائري/ الجزء الأول	
<p>تشرين أول ٢٠٠٨</p>  <p>21/10/2008</p>	<p>١٣٢٥٠ ٦٠ شهرا ١٢٠٠</p> <p>١٢٠٠ %١٠٠ %١٠٠</p>
<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨</p> <p>الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:</p>	<p>١٢٠٠ %١٠٠ %١٠٠</p>

سير العمل في المشروع:	تم الانتهاء من المشروع وتم استلامه حيث تم افتتاحه من قبل دولة رئيس الوزراء بتاريخ ٢٨/٧/٢٠٠٨.
الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع	- ١٠٠% المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات
ملاحظات:	يقع المشروع في لواء قصبة السلط ويخدم سكان المحافظة.

بالألف دينار

٤- مشروع تنفيذ طريق الشونة الشمالية-الجنوبية (منطقة كريمة)

١٠٥٠٠	الكلفة الكلية
٢٤ شهراً	مدة التنفيذ
١٥٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
١٥٠٠	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
١٠٠%	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
٩٠%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية
٧٠%	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع
المشروع يسير حسب المخطط المعدل له بسبب انتهاء فترة المشروع حيث هناك تأخر بمشروع توسعة طريق الشونة الجنوبية-الكفرين الذي يجري العمل به حالياً الأمر الذي يتسبب بوقوع حوادث سير على الطريق ومشاكل عديدة جراء هذا التأخير الملحوظ.	
ربط محافظة إربد في محافظة البلقاء.	ملاحظات

بالألف دينار

٥- مشروع تقاطعات البقعة

١٠٥٠٠	الكلفة الكلية
٢٤ شهراً	مدة التنفيذ
٤٩٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
٤٩٠٠	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
١٠٠%	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
١٠٠%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
تشرين أول ٢٠٠٨	كثون أول ٢٠٠٨
	
21/10/2008	

تم الانتهاء من المشروع وتم استلامه وتم افتتاحه من قبل دولة رئيس الوزراء وهو على مرحلتين :- ١- مرحلة الجسر. ٢- مرحلة ربط المخيم مع الشارع الرئيسي. (١) مليون دينار لربط المخيم وأعمال توسعة للطرق والخدمات. ١٠٠% المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات	سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع ملاحظات
-	-

بالآلف دينار

٦- مشروع تحسين وتنفيذ تقاطع أم النعاج	
٦٠٠٠ ٢٤ شهراً (٢٠٠) إجراء مناقلة مالية بمبلغ (٥٠٠) ألف دينار ٢٠٠ ١٠٠% ١٠% تم طرح العطاء وتمت إحالته. - ١٠% المشروع يسير دون المستوى المخطط له بسبب التأخر في طرح وإحالة العطاء.	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع: الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع
يقع المشروع في لواء قصبة السلط وهو مشروع حيوي جداً بسبب كثرة الحوادث التي تقع على هذا الطريق مما يساعد في التخفيف منها .	ملاحظات

بالآلف دينار

٧- مشروع تنفيذ جسر على تقاطع عين الباشا

تشرين أول ٢٠٠٨	كانون أول ٢٠٠٨	٤٣٩٥	الكلفة الكلية
		٢٢ شهراً	مدة التنفيذ
		٣٤٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
		٣٤٠٠	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
		%١٠٠	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
		%١٠٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
			سير العمل في المشروع
			الأوامر التغييرية
		%١٠٠	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:
			تقييم المشروع
			ملاحظات

تم الانتهاء من المشروع/ قيد الاستلام الأولي وهو على مرحلتين :-

١- مرحلة الجسر.

٢- مرحلة الخدمات.

%١٠٠

المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات

بالألف دينار

٨- مشروع طريق السلط الأغوار

تشرين أول ٢٠٠٨	كانون أول ٢٠٠٨	٢٥٠٠	الكلفة الكلية
		٢٢ شهراً	مدة التنفيذ
		٢٥٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
		٢٥٠٠	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
		%١٠٠	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
		%٩٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
			سير العمل في المشروع
			الأوامر التغييرية
		%٩٢	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:
			تقييم المشروع

المشروع في مرحلة التنفيذ والعمل جار في موقع المشروع ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال شهر شباط ٢٠٠٩. بناء جدران استنادية على جوانب الطريق.

المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات.

بالألف دينار

٩- مشروع إنشاء طريق عيرا - الكرامة

٧٥٠	الكلفة الكلية
١٠ شهراً	مدة التنفيذ
٢٥٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
٢٢٢	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
%٨٨	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨
%٤٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
المشروع في مرحلة التنفيذ حيث تمت معالجة الانزلاقات التي حصلت للتربة.	سير العمل في المشروع
حدوث أوامر تغييرية لمعالجة الانزلاقات .	الأوامر التغييرية
%٥٥	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:
المشروع يسير حسب المخطط بعد صدور الأوامر التغييرية.	تقييم المشروع
يقع المشروع في لواء قصبه السلط قضاء عيرا ويرقا ويربط القضاء بلواء الشونة الجنوبية ويخدم أهالي المنطقة.	ملاحظات :

بالألف دينار

١٠- مشروع ري دامية

١٥٢٠	الكلفة الكلية
١٤ شهراً	مدة التنفيذ
١١٧٢	مخصصات عام ٢٠٠٨
١١٦١	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
%٩٩	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨
%١٠٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
تم الانتهاء من المشروع / قيد الاستلام الأولي.	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
%١٠٠	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:
المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات	تقييم المشروع

بالآلف دينار

١١- مشروع مدرسة علي بن أبي طالب الشرعية

تشرين أول ٢٠٠٨	كانون أول ٢٠٠٨	١٦٧١	الكلفة الكلية
		٣٦ شهرا	مدة التنفيذ
		٥٣٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
		٥٣٠	الإففاق الفعلي حتى
			٢٠٠٨/١٢/٣١
		%١٠٠	نسبة الإففاق من المخصص
			٢٠٠٨
		%١٠٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
			سير العمل في المشروع
			الأوامر التغييرية
		%١٠٠	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة
			الاجمالية:
			تقييم المشروع
			ملاحظات
			المشروع يسير حسب المخطط له ولا يوجد معوقات
			ينفذ المشروع في كافة المحافظات ويخدم القطاع التعليمي من خلال توفير
			بيئة تعليمية مناسبة للطلبة.

بالألف دينار

١٢- مشروع إنشاء مستشفى السلط الجديد

٤٥٠٠٠	الكلفة الكلية
٤٨ شهراً	مدة التنفيذ
٢١٠٠ تم نقل جميع مخصصات ٢٠٠٨ لمشاريع أخرى.	مخصصات عام ٢٠٠٨
-	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
-	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨
-	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
المشروع في مرحلة الدراسات وإعداد التصاميم.	سير العمل في المشروع:
-	الأوامر التغييرية
-	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:
المشروع يسير دون المستوى المخطط له.	تقييم المشروع
-	ملاحظات

بالألف دينار

١٣- مشروع تنفيذ كيبيل للمشاريع الاستثمارية في منطقة الزارة

٢٧٠٠	الكلفة الكلية
١٨ شهراً	مدة التنفيذ
١٢١٣	مخصصات عام ٢٠٠٨
١٢١٣	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
١٠٠%	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨
١٠%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
المشروع في مرحلة التنفيذ والعمل جارٍ في الموقع	سير العمل في المشروع .
-	الأوامر التغييرية .
٢٠%	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:
المشروع يسير حسب المخطط امعدل بسبب تأخر وزارة الأشغال العامة والإسكان من تحديد المسار الأمن للكوابل.	تقييم المشروع .
يقع المشروع في لواء الشونة الجنوبية	ملاحظات

بالآلف دينار

١٤ - مشروع إسكان الأسر الفقيرة

<p>تشرين أول ٢٠٠٨</p>  <p>تم الاستلام الأولي للمشروع وهو على مرحلتين :- ١- إسكان يرقا (٢٠) وحدة سكنية . ٢- إسكان الصبيحي (١٦) وحدة سكنية . - ١٠٠% المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات. المشروع يخدم الأسر الفقيرة في المحافظة.</p>	<p>٢٢٥٠٠</p> <p>٢٤ شهراً</p> <p>٧٦١</p> <p>٧٦١</p> <p>١٠٠%</p> <p>١٠٠%</p>	<p>الكلفة الكلية</p> <p>مدة التنفيذ</p> <p>مخصصات عام ٢٠٠٨</p> <p>الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١</p> <p>نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨</p> <p>نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:</p> <p>سير العمل في المشروع .</p> <p>الأوامر التغييرية .</p> <p>نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:</p> <p>تقييم المشروع .</p>
<p>ملاحظات .</p>		<p>ملاحظات .</p>

بالآلف دينار

١٥ - مشروع القرى الحضرية

<p>٢١٠٠٠</p> <p>٢٤ شهراً</p> <p>تم تخصيص (١) مليون دينار لمحافظة البلقاء وتم إجراء مناقلات بكامل المخصص لمشاريع أخرى . - - - المشروع في مرحلة الدراسات وإعداد التصاميم. - تم تحديد قطعة الأرض .</p>	<p>الكلفة الكلية</p> <p>مدة التنفيذ</p> <p>مخصصات عام ٢٠٠٨</p> <p>الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١</p> <p>نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨</p> <p>نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:</p> <p>سير العمل في المشروع .</p>
--	---

-	الأوامر التغييرية .
-	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:
المشروع يسير دون المستوى المخطط له.	تقييم المشروع .
-	ملاحظات .

مطالب واحتياجات محافظة البلقاء

١. إستملاك قطعة أرض في منطقة بيوضة الشرقية لإقامة المركز الصحي/العارضة.
٢. تحويل مركز صحي زي الشامل الى مركز إسعاف وطوارئ على مدار الساعة وتزويده ببعض الأسرة وجهاز أشعة وسيارة إسعاف وإكمال الطابق الأرضي وعمل سور للمركز.
٣. إنشاء مركز صحي فرعي في منطقة الديرة علماً بأن الأرض موجودة ومسجلة بإسم وزارة الصحة.
٤. تمديد دوام مركز صحي الصيحي الشامل ليصبح ٢٤ ساعة .
٥. إنشاء مبنى مركز صحي سيحان/العارضة .
٦. بناء مبنى للعيادات الخارجية/دير علا .
٧. تأمين منطقة زي بخدمات الصرف الصحي حفاظاً على البيئة والصحة العامة.
٨. تنفيذ مشروع الطريق السياحي الذي يربط قضاء زي بمحافظة جرش بواسطة إنشاء جسر محادي لجسر سد الملك طلال وبذلك يتم ربط محافظة البلقاء بمحافظة جرش بطريق مختصر وسريع .
٩. توسيع الشارع الرئيسي الذي يربط قضاء زي بمدينة السلط من مثلث جسر زي وحتى منطقة علان وبطول ٤ كم تقريباً نظراً لكثرة الحوادث المتكررة عليه وخاصة في فصل الشتاء ويعتبر طريق بديل حالياً عن الشارع المؤدي الى الأغوار بالإضافة لوجود المسارع النووي في منطقة علان .
١٠. إعادة إنشاء طريق بدر / ماحص و معالجة تصريف المياه كون المياه تنحدر باتجاه البلده وتشكل خطورة على البيوت السكنية.
١١. توسعة طريق طباعة العواملة / أم جوزة وعمل جدران إستنادية/ قضاء زي .
١٢. زيادة مخصصات الطرق الزراعية لقضاء العارضة .
١٣. ربط مناطق قضاء العارضة بقضاء برما - محافظة جرش عن طريق تكملة طريق سوميا - برما .
١٤. إعادة تأهيل طريق عرقوب الراشد / سيل الزرقاء
١٥. تكملة طريق البكالوريا لغاية دوار ماحص مع إنارة الطريق .

١٦. توسعة الطريق الرئيسي / الأغوار .
١٧. توسعة الجسر على طريق وادي راجب .
١٨. تكملة توسعة طريق الطوال الجنوبي - ديرعلا .
١٩. توسعة طريق الأغوار الرئيسي - ديرعلا بطول ٤ كم .
٢٠. تكملة توسعة طريق العارضة من مثلث العارضة .
٢١. تحسين طريق الشونة الجنوبية / مثلث الكفرين .
٢٢. إضافة غرف صفية لمدرسة أم جوزة الثانوية للبنين في زي لتصبح مدرسة شاملة.
٢٣. إضافة غرف صفية لمدرسة زي الأساسية للبنات لتصبح مدرسة شاملة .
٢٤. إنشاء ١٢ غرفة صفية لمدرسة أم كثير المختلطة .
٢٥. إنشاء ١٢ غرفة صفية لمدرسة عين الباشا للبنين .
٢٦. إنشاء ٤ غرف صفية لمدرسة الرمان الأساسية للبنين/ عين الباشا.
٢٧. إنشاء ٤ غرف صفية لمدرسة حليلة السعدية الأساسية المختلطة/ عين الباشا.
٢٨. بناء غرف صفية وسور لمدرسة ميسرا الأساسية للبنين /العارضة.
٢٩. عمل بناء حديث لمدرسة جلعد الأساسية للبنات، علماً بأن البناء الحالي مستأجر وغير صالح/زي.
