

محافظة جرش

# محافظة جرش

## لمحة عامة:



تعتبر مدينة جرش من أهم المدن الأثرية في العالم ، ويعود تاريخ هذه المدينة إلى زمن تأسيسها في عهد الاسكندر الكبير في القرن الرابع قبل الميلاد، وقد نعمت هذه المدينة بالهدوء والاستقرار والسلام وتأثرت كثيراً بالحضارة الرومانية وهي من المدن العشرة (الديكابوليس).

## التضاريس والمناخ:

يسود المحافظة مناخ البحر المتوسط الماطر شتاءً الجاف صيفاً، ويتراوح معدل هطول الأمطار السنوي في المحافظة بين (٢٩٠ – ٥٥٠) ملم ، ويبلغ معدل الرطوبة النسبية لشهر كانون الثاني ما بين (٧٠ – ٨٠) % ، ينخفض بالمتوسط إلى (٤٥ %) في شهر تموز، أما معدل درجة الحرارة الصغرى فينخفض بالمتوسط إلى (٣) درجات مئوية شتاءً، ويرتفع معدل الحرارة العظمى السنوي إلى (٣٧) درجة مئوية صيفاً.

## الموقع والمساحة:

تقع محافظة جرش ضمن إقليم الشمال، وتبلغ مساحة محافظة جرش حوالي (٤١٠) كم<sup>٢</sup> تعادل مانسبته (٤٦.٠ %) من مساحة المملكة، وتأتي في المرتبة الأخيرة من حيث المساحة بين محافظات المملكة، وتمتاز محافظة جرش بموقعها السياحي والإستراتيجي وتوسطها بين محافظات إقليم الشمال والوسط.

## الواقع السكاني والكثافة السكانية:

بلغ عدد سكان محافظة جرش (١٧١٧٠٠) نسمة لعام ٢٠٠٦، أي ما نسبته (٣%) من إجمالي سكان المملكة، وتبلغ نسبة السكان في الحضر (٦٢.٧ % )، بينما تبلغ نسبة السكان في الريف (٣٧.٣%)، ويبلغ متوسط حجم الأسرة في المحافظة حوالي (٥.٩) فرداً.

بلغت الكثافة السكانية في المحافظة (٤١٨.٨) شخص/كم<sup>٢</sup>. وهي ثاني أعلى نسبة كثافة سكانية في المملكة، وإذا أخذنا بعين الاعتبار بأن (٢٣%) من مساحة المحافظة هي أراضٍ حرجية يمنع استغلالها لأغراض السكن، فإن الكثافة السكانية ستصل إلى (٥٣٢) شخص/كم<sup>٢</sup>.

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار التزايد في عدد السكان و محدودية الأراضي الزراعية وكبر مساحة الأراضي الحرجية، فإن الأمر يتطلب وضع تصور مستقبلي يتفادي الاعتداء على الأراضي الزراعية ويساعد في المحافظة عليها لأغراض الزراعة ويضمن توزيع سكاني أمثل ضمن الأراضي التنظيمية، والجدول التالي يبين التوزيع السكاني حسب الجنس واللواء والكثافة السكانية في محافظة جرش.

### الجدول رقم (١)

#### التوزيع السكاني حسب الجنس واللواء والكثافة السكانية في محافظة جرش

الكثافة السكانية (فرد/كم <sup>٢</sup> )	النسبة %	المساحة (كم <sup>٢</sup> )	النسبة %	عدد السكان		التقسيمات الإدارية
				ذكور	إناث	
٥٥٨.١	٦٥	٢٦٥	٨٦.١	٧١٩٣٠	٧٥٩٩٠	قصبه جرش
٢٦٨.٦	١٢	٤٩	٧.٧	٦٣٥٠	٦٨١٠	قضاء المصطبة
١١٤.٢	٢٣	٩٦	٦.٢	٥١٢٠	٥٥٠٠	قضاء برما
٤١٨.٨	١٠٠	٤١٠	١٠٠	١٧١٧٠٠		المجموع الكلي

المصدر دائرة الإحصاءات العامة ٢٠٠٧.

## التقسيمات الإدارية:

يوجد في محافظة جرش لواءً واحداً وهو لواء القصبه ويضم قضاء المصطبة وقضاء برما.



الخارطة رقم (١)

خارطة محافظة جرش حسب الألوية والقرى



## أبرز المشاريع الرأسمالية لمحافظة جرش

(بالألف دينار)

الرقم	اسم المشروع	الجهة المنفذة	مخصصات ٢٠٠٨	نسبة الإنفاق %	نسبة الإنجاز %	الملاحظات
	مجموع المشاريع الرأسمالية للمحافظة منها المشاريع التالية		٣٧٨١٧.٥	٧٨.٤		
١.	إنشاء مركز ثقافي جرش.	وزارة الثقافة	٣٩٥	٨٤.٨	-	المبلغ مدور وموجود في حساب الأمانات لدى وزارة المالية والمشروع متعثر.
٢.	ترميم وتعمير آثار جرش.	دائرة الآثار	٢٠٠	٧١.٨	١٠٠	المشروع سنوي ومن المتوقع أن يستمر لأكثر من عشر سنوات.
٣.	تحسين مدخل مدينة جرش.	وزارة الأشغال	١٥٠٠	١٠٠	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع واستلامه.
٤.	إنشاء مبنى محافظة جرش وسكن المحافظ.	وزارة الداخلية	١٥٠٠	١٠٠	٦٩	المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات.
٥.	تطوير حوض نهر الزرقاء.	وزارة الزراعة	١٠٢.٩	٩٩.٩	٧٥	المشروع يسير حسب المخطط.
٦.	إنشاء مستشفى جرش-عجلون.	الخدمات الطبية	٥٠٠٠	٠.٠٣	-	المشروع يسير دون المستوى المخطط له.
٧.	إسكان الأسر الفقيرة.	وزارة الأشغال	٨٣٠.٤	١٠٠	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع وتسليم بعض المناطق.
٨.	إنشاء مبنى مديرية التربية والتعليم في جرش.	وزارة التربية	٦٥٠	٢٧%	٣٥	تأخر المشروع بسبب وجود بعض المعوقات وتم إزالتها والمشروع قيد التنفيذ.
٩.	إنشاء مبنى مديرية قضاء برما.	وزارة الداخلية	٤٠٠	٩٩.٤	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع ومن المتوقع تسليمه.
١٠.	توسعة وتحديث مستشفى	وزارة	١٠٥٠	٩٨.٩	٩٨	تم الانتهاء من

المشروع وتم الاستلام الأولي.			الصحة	جرش.
------------------------------	--	--	-------	------

## خلاصة التقييم لأهم المشاريع التنموية والراسمالية لمحافظة جرش

### مخصصات النفقات الراسمالية للمشاريع التنموية في قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٠٨


قدرت النفقات الراسمالية للمشاريع التنموية لمحافظة جرش بمبلغ (١٨١٣٢.٧) ألف دينار موزعة على مختلف القطاعات وحسب الفصول للوزارات والدوائر الحكومية، بلغ حجم الأنفاق الفعلي (١٢٢٢٤) ألف دينار أي ما نسبته (٦٧.٤%) حتى تاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١، وهي نسب دون المستوى المستهدف كما هو واضح في الشكل رقم (١).

(بالآلاف دينار)

البيان	مقدر ٢٠٠٨	الانفاق حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	نسبة الانفاق الفعلي %
المشاريع الراسمالية	١٨١٣٢.٧	١٢٢٢٤	٦٧.٤

الشكل رقم (١)


مقارنة النفقات الفعلية مع مخصصات المشاريع الرأسمالية لمحافظة جرش

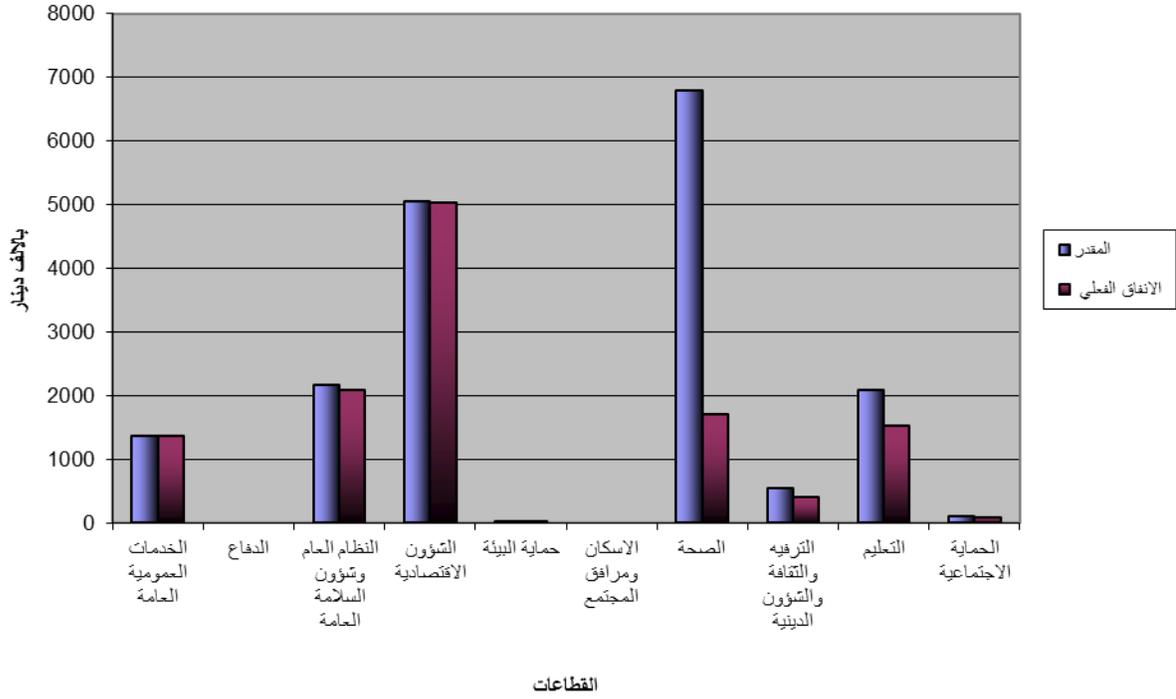

ويشير توزيع المخصصات المالية للمحافظة حسب القطاعات الوظيفية إلى إستثمار قطاع الصحة في محافظة جرش بالنصيب الأكبر وما نسبته (٣٧.٥%) من إجمالي مخصصات محافظة جرش لعام ٢٠٠٨ وجاء في المرتبة الثانية قطاع الشؤون الاقتصادية حيث حصل على ما نسبته (٢٧.٨%) والشكل رقم (٢) يوضح التوزيع القطاعي للمشاريع الرأسمالية في محافظة جرش.

الشكل رقم (٢)

## التوزيع القطاعي للنفقات الرأسمالية لمحافظة جرش

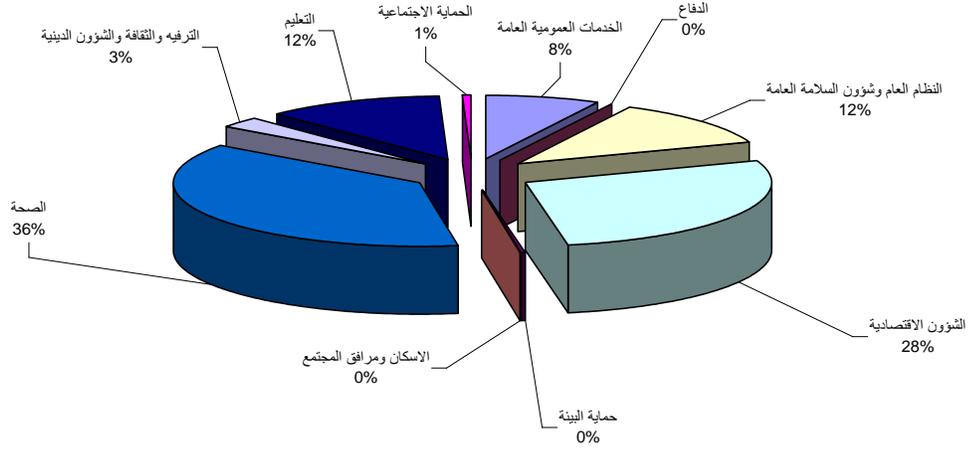

■ الحماية الاجتماعية ■ التعليم والترفيه والثقافة والشؤون الدينية ■ الصحة ■ الاسكان ومرافق المجتمع ■ حماية البيئة ■ الشؤون الاقتصادية ■ النظام العام وشؤون السلامة العامة ■ الدفاع ■ الخدمات العمومية العامة

وفي ما يلي تحليل موجز لأهم مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب الفصول:-

### وزارة الأشغال العامة والإسكان:-

احتلت وزارة الأشغال العامة والإسكان المرتبة الأولى من حيث حجم المخصصات المرصودة للمحافظة وحجم الإنفاق حيث تم تخصيص مبلغ (5330.7) ألف دينار أي ما نسبته (29.4%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ (٥٣٢٧) ألف دينار أي ما نسبته (99.9%) من المخصصات المرصودة لوزارة الأشغال العامة والإسكان في المحافظة وتعتبر نسبة الإنفاق مرتفعة وهي من أعلى النسب على مستوى محافظات المملكة ويعود السبب في ذلك إلى الانتهاء من مشاريع الأسر الفقيرة وتحسين مدخل مدينة جرش ومشروع صيانة الطرق الرئيسية والنافذ .

### وزارة الصحة :-

تم تخصيص مبلغ (1795.2) ألف دينار لوزارة الصحة في محافظة جرش أي ما نسبته (9.9%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ (1692.9) ألف دينار أي ما نسبته (94.3%) من المخصصات المرصودة للوزارة في المحافظة، ويعود ذلك إلى تسديد جزء من المطالبات المالية لمشروع توسعة مستشفى جرش.

## وزارة الداخلية :-

تم تخصيص مبلغ (١٩١٢) ألف دينار لوزارة الداخلية في محافظة جرش أي ما نسبته (١٠.٦%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ (١٩٠٩.٦) ألف دينار أي ما نسبته (٩٩.٩%) من المخصصات المرصودة للوزارة في المحافظة، وهي من النسب المرتفعة ويعود ذلك الى سرعة تنفيذ مبنى المحافظة وسكن المحافظ في محافظة جرش بالإضافة الى انجاز مبنى مديرية قضاء برما وسكن مدير القضاء.

## وزارة التربية والتعليم :-

تم تخصيص مبلغ (٢٢٠١.٩) ألف دينار لوزارة التربية والتعليم في محافظة جرش مشكله ما نسبته (١٢.٢%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ (١٥٨٤.٧) ألف دينار أي ما نسبته (٧٢%) من المخصصات المرصودة للوزارة في المحافظة، وهي نسبة دون المستوى المطلوب ويعود سبب تدني مستوى الإنفاق إلى أن معظم عطاءات الإنشاءات والإضافات للغرف الصفية في بداية تنفيذها، بالإضافة إلى وجود معوقات وأوامر تغييرية على مشروع مديرية تربية جرش بحيث تم التوقف لفترة تزيد عن الثمانية شهور.

وفيما يلي تقرير مفصل عن أهم المشاريع التي تم تقييمها:-

بالآلف دينار

١- مشروع إنشاء مركز ثقافي - جرش	
٥٠٠٠	الكلفة الكلية
٤٨ شهراً	مدة التنفيذ
٣٩٥	مخصصات عام ٢٠٠٨
٣٣٥	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
٨٤.٨%	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
١٠%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
تم تحديد قطعة الأرض وبانتظار قرار الاستملاك ومن المتوقع طرح العطاء نهاية عام ٢٠٠٨.	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
١٠%	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية
لم يتم تنفيذ المشروع ويسير دون المستوى المطلوب	تقييم المشروع
يهدف المشروع إلى توفير فرص اللقاء مع الحضارات الانسانية الأخرى وإبراز دور الأردن عالمياً.	ملاحظات

بالآلف دينار

٢- مشروع ترميم وتعمير آثار جرش	
٢٠٠	الكلفة الكلية
١٢ شهراً	مدة التنفيذ
٢٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
١٤٣.٦	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
٧١.٨%	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
١٠٠%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>٢٠٠٨ أيار</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>كانون أول ٢٠٠٨</p>  </div> </div>	
المشروع مستمر.	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
١٠٠%	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية
المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات.	تقييم المشروع
يهدف المشروع إلى المحافظة على آثار جرش من خلال القيام بأعمال الترميم والصيانة للمواقع الأثرية.	ملاحظات

بالآلف دينار

٣- مشروع تحسين مدخل مدينة جرش			
أيار ٢٠٠٨	تشرين أول ٢٠٠٨	٣٠٠٠ ١٨ شهراً ١٥٠٠ ١٥٠٠	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
		١٠٠% ١٠٠%	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
تم الانتهاء من المشروع حيث أحيل العطاء على المقاول مؤسسة الشوعاني وبقي تشجير المدخل.		- ١٠٠%	سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية تقييم المشروع
تم الإستلام الأولي للمشروع.			ملاحظات
المتبقي من المشروع هو تحسين بستنة المدخل.			

بالآلف دينار

٤- مشروع إنشاء مبنى محافظة جرش وسكن المحافظ			
أيار ٢٠٠٨	كانون أول ٢٠٠٨	٢١٥٠ ١٧ شهراً ١٥٠٠ ١٥٠٠	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الانفاق الفعلي ٢٠٠٨/١٠/٣١
		١٠٠% ٦٩%	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
تم البدء بالمشروع في نهاية عام ٢٠٠٧ والعمل جار في موقع المشروع.			سير العمل في المشروع

<p>- %٦٩ المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات ومن المتوقع الإنهاء من المشروع في نهاية شهر ٤ لعام ٢٠٠٩</p>	<p>الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية تقييم المشروع</p>
<p>-</p>	<p>ملاحظات</p>

بالآلف دينار

٥- مشروع تطوير حوض نهر الزرقاء (المرحلة التكميلية)	
١٦٠٠٠ (البلقاء، الزرقاء، جرش، المفرق). ٤٨ شهراً ١٠٢.٩ ١٠٢.٧ ١٠٠% ١٠٠% المشروع مستمر على مراحل سنوية. - ٧٥% المشروع يسير حسب المخطط له ولا توجد معوقات.	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية تقييم المشروع
يهدف المشروع إلى استصلاح الأراضي الزراعية المرتفعة المحيطة بنهر الزرقاء ومنعها من الانجراف.	ملاحظات

بالآلف دينار

٦- مشروع إنشاء مستشفى جرش - عجلون	
١٥٠٠٠ ٣٦ شهراً ٥٠٠٠ ١٤.٨ ٠.٣% المشروع قيد الدراسة وإعداد التصاميم - ٠% المشروع يسير دون حسب المخطط ولا يوجد معوقات .	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية تقييم المشروع
يهدف المشروع إلى إقامة مستشفى متطور لخدمة أبناء محافظة جرش وعجلون / تم إجراء مناقلة مالية	ملاحظات

٧- مشروع إسكان الأسر الفقيرة (مشاريع الديوان الملكي)

<p>تشرين أول ٢٠٠٨</p> 	<p>(٢٢٥٠٠)</p> <p>٢٤ شهراً</p> <p>٨٣٠</p> <p>٨٣٠</p> <p>١٠٠%</p> <p>١٠٠%</p>	<p>الكلفة الكلية</p> <p>مدة التنفيذ</p> <p>مخصصات عام ٢٠٠٨</p> <p>الإتفاق الفعلي حتى</p> <p>٢٠٠٨/١٢/٣١</p> <p>نسبة الإنفاق من المخصص</p> <p>٢٠٠٨</p> <p>نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:</p>
<p>المشاريع قيد التنفيذ بناء على تقارير مديرية أشغال جرش وهي:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- مساكن الأسر الفقيرة في منطقة الحسينات/المرحلة الثانية - نسبة الإنجاز ٩٥%.</li> <li>- مساكن الأسر الفقيرة في منطقة جبة - نسبة الإنجاز ١٠٠%.</li> <li>- مساكن الأسر الفقيرة في منطقة المشيرفة- نسبة الإنجاز ١٠٠%.</li> <li>- مساكن الأسر الفقيرة في منطقة الخريشة-نسبة الإنجاز ١٠٠%.</li> <li>- مساكن الأسر الفقيرة في منطقة برممة-نسبة الإنجاز ١٠٠%.</li> <li>- مساكن الأسر الفقيرة في منطقة الكتة- نسبة الإنجاز ١٠٠%.</li> <li>- مساكن الأسر الفقيرة في منطقة سوف- نسبة الإنجاز ١٠٠%.</li> </ul> <p>١٠٠%</p> <p>تم الإنتهاء من المشروع وبعض المناطق تم التسليم</p>	<p>سير العمل في المشروع</p> <p>الأوامر التغييرية</p> <p>نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة</p> <p>الإجمالية</p> <p>تقييم المشروع</p>	
<p>يهدف المشروع إلى بناء مساكن للأسر الفقيرة في جميع محافظات المملكة .</p>	<p>ملاحظات</p>	

بالألف دينار

٨- مشروع إنشاء مبنى مديرية التربية والتعليم في جرش

تموز ٢٠٠٨	كانون اول ٢٠٠٨	٨٥٠	الكلفة الكلية
		٢٤ شهراً	مدة التنفيذ
		٦٥٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
		١٧٥.٦	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
		%٢٧	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
		%٣٥	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
تم الاحالة على المقاول مؤسسة نائل حداد للمقاولات الانشائية في شهر شباط/٢٠٠٧ حيث تم التنفيذ الفعلي في بداية شهر نيسان/٢٠٠٧.			سير العمل في المشروع
حدثت أوامر تغييرية بقيمة (٢٥٠) ألف دينار وذلك بناء على فحوصات التربة.			الأوامر التغييرية
- عزل الجدران الخارجية .			
- تعديل الأسعار بناء على التوقف الذي حدث ولغاية الآن لم يصدر قرار بالأوامر التغييرية (بناء على كلام المقاول).			
%٣٥			نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية
تم إزالة المعوقات والعمل جارٍ في المشروع			تقييم المشروع
يهدف المشروع إلى الاستغناء عن مبنى مديرية التربية المستأجر.			ملاحظات

بالألف دينار

٩- مشروع إنشاء مبنى مديرية قضاء برما وسكن مدير القضاء

٤٩٠	الكلفة الكلية
١٢ شهراً	مدة التنفيذ
٤٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
٣٩٥.٥	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
%٩٩.٤	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
%١٠٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
تم الانتهاء من المشروع ومن المتوقع تسليمه في نهاية هذا العام.	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
%١٠٠	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية
تم الإنتهاء من المشروع والمبلغ المتبقي مطالبات للمقاول	تقييم المشروع
-	ملاحظات



بالآلف دينار

١٠- مشروع استكمال توسعة (٢٥) مركز صحي قائم	
٤٧٠٠ (لكافة محافظات المملكة ) ٢٥٠ (لمركز صحي سوف) ٢٤ شهراً ١٨ ١٧.٦ ٩٩% - تمت المباشرة بتوسعة بعض المراكز الصحية. ٢٥% المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات.	الكلفة الكلية  مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية تقييم المشروع ملاحظات
-	-

بالآلف دينار

١١- مشروع استكمال إنشاء (١٨) مركز صحي أولي	
٦٥٠٠ (لكافة محافظات المملكة) ٢٤ شهراً (لمركز صحي المصطبة (جرش)) ٥٩ (لمركز صحي المصطبة ) ٥٨.٩ ٩٩.٨% ٩٠% تم إحالة العطاء وتم البدء بتنفيذ المشروع بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٨. - ٩٠% المشروع يسير ضمن المخطط ولا يوجد معوقات.	الكلفة الكلية  مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية تقييم المشروع ملاحظات
يهدف المشروع إلى خدمة (١١) ألف مواطن من قضاء المصطبة.	

بالآلف دينار

## ١٢ - مشروع إنشاءات مختلفة وإضافات غرف صفية

٤٥٣٠ (لكافة المحافظات) مستمر ٨٢.٥ ٨٢.٥ %١٠٠ %١٠٠ - المشروع مستمر والعمل جار في موقع المشروع - المدارس قيد التنفيذ: * مبنى مدرسة نحلة الثانوية للبنات- نسبة الإنجاز ٩٥%. * مدرسة جبة الثانوية للذكور- نسبة الإنجاز ٢٢% تنتهي في عام ٢٠٠٩. * إضافة (٦) غرف لمدرسة المشيرفة الثانوية- نسبة الإنجاز ١٠٠% استلمت بتاريخ ٢٠٠٨/٥/١٥. - %٧٢ المشروع يسير ضمن الخطة ولا يوجد معوقات.	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ (لمحافظة جرش) الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع  الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية تقييم المشروع ملاحظات
-	-

بالآلف دينار

## ١٣ - مشروع توسعة وتحديث مستشفى جرش

٢٠٠٨ أيار 	تشرين أول ٢٠٠٨ 	٣٨٠٠ ٣٦ شهرًا ١٠٥٠ ١٠٣٨.٩ %٩٨.٩ %٩٨	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع
تم تنفيذ المشروع من قبل مؤسسة القدس للصناعات الهندسية حيث تم الانتهاء من الأعمال الانشائية للمبنى وبقى تركيب المصاعد وتنفيذ الساحات الخارجية وبعض التعديلات البسيطة من الداخل.			

الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية تقييم المشروع	درج حديدي %٩٦ تم الإنتهاء من المشروع وتم الإستلام الأولي.
ملاحظات	يهدف المشروع إلى توسعة المستشفى القديم بـ (٦٠) سرير إضافي وتحديث المبنى القائم

## احتياجات ومطالب محافظة جرش حسب القطاعات

- (١) تحسين البيئة المدرسية بإنشاء أبنية مدرسية نموذجية لمواجهة التوسعات واستبدال الأبنية المستأجرة .
- (٢) تحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين لتتلاءم مع الجهد المبذول من قبلهم وذلك لتحفيزهم على العطاء .
- (٣) توفير مخصصات مالية لاستملاك أراضٍ من أجل إنشاء مراكز صحية أولية بدلاً من المباني المستأجرة والتي لا تفي بالغرض المطلوب واستحداث مراكز صحية شاملة.
- (٤) تعزيز الكادر الطبي الموجود بالكفاءات الطبية كون العدد الحالي لا يفي بالحاجة.
- (٦) تجميل مداخل المدينة .
- (٧) ترحيل محلات الحرف الموجودة على مداخل وداخل المدينة إلى المنطقة الحرفية .
- (٨) إنشاء مواقف للباصات ووسائل النقل وسيارات الزوار .
- (٩) حل مشكلة السير والمشاة في وسط المدينة .
- (١٠) إيجاد آلية معينة من خلال التنسيق بين الهيئات العاملة في مجال السياحة من أجل إطالة مدة إقامة السائح في مدينة جرش .
- (١١) عقد دورات تدريبية في مجال التعامل مع السائح وكذلك دورات تدريبية لبعض الحرف المرتبطة بالإرث الحضاري والتركيز على إقامة المشاريع الصغيرة من خلال الجمعيات الخيرية والتعاونية .
- (١٢) تشجيع الاستثمار المشترك ما بين القطاع العام والخاص واستغلال الأماكن غير المستغلة كموقع البركتين ووادي النهر الذهبي .
- (١٣) إنشاء مركز متخصص للإرشاد الزراعي والتدريب .
- (١٤) المساعدة في إيجاد قنوات تسويقية للمنتجات الزراعية .
- (١٥) تفويض الأراضي الحرجية الصالحة للزراعة للمزارعين الذين لا يملكون أراضٍ زراعية .
- (١٦) تفعيل القوانين التي تحد من الزحف العمراني على الأراضي الزراعية .
- (١٧) التوسع في إنشاء الطرق الزراعية لخدمة الأراضي الزراعية غير المخدومة.

- (١٨) استبدال شبكات المياه القديمة.
- (١٩) توفير مصادر مياه جديدة .
- (٢٠) التوسع في شبكات الصرف الصحي لتشمل كافة مناطق المحافظة.
- (٢١) توسعة المدينة الحرفية والمباشرة بنقل محلات الحرف والمهن إليها.
- (٢٢) إقامة منطقة صناعية في محافظة جرش على غرار المعمول به في المحافظات الأخرى
- (٢٣) وضع خطة حكومية لإيجاد بيئة ملائمة للاستثمارات في قطاع السياحة من خلال إجراء دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية للفرص الاستثمارية ضمن هذا القطاع.
