

محافظة الكرك



محافظة الكرك

لمحة عامة:



تعتبر مدينة الكرك من المدن الدينية والسياحية الأثرية حيث يوجد بها مقامات القادة المسلمين الذين إستشهدوا في غزوة مؤتة، كما تشتهر بالرياضة مثل تسلق الجبال وصيد الغزلان، وتتميز المدينة بنقاء جوها، وتوفر المياه المعدنية الموجودة في عيونها لمعالجة الأمراض ومن أشهر المناطق الأثرية فيها قلعة الكرك، ورباح، والقصر، ومؤتة.

التضاريس والمناخ:

تشكل أراضي محافظة الكرك جزءاً من الهضبة الأردنية التي تتحدر على مسافة لا تزيد عن (٣٠) كم اتجاه البحر الميت، وتندرج محافظة الكرك ضمن مناخ البحر المتوسط الذي يتصف بشتاء ماطر بارد وصيف حار جاف، ويمتاز مناخ محافظة الكرك بالتنوع الذي ينعكس إيجاباً على الحركة السياحية في المحافظة حيث بإمكان السائح أن يلجأ إلى المناطق الغورية الدافئة شتاءً والسهلية في فصلي الربيع والصيف مما يجعلها منطقة جاذبة للسياحة على مدار السنة.

الموقع والمساحة:

تقع مدينة الكرك على بعد (١٣٠) كليومتراً جنوبي العاصمة عمان، وترتفع المدينة عن سطح البحر حوالي تسعمائة وثلاثين متراً، وتطل على البحر الميت ووادي الأردن، وتبلغ مساحة محافظة الكرك حوالي (٣٤٩٥) كم^٢ أي ما يعادل (٣.٩%) من المساحة الإجمالية للمملكة.

الواقع السكاني والكثافة السكانية :

قدر عدد سكان محافظة الكرك لعام ٢٠٠٧ بـ (٢٢٣٠٠٠) نسمة أي ما يعادل (٣.٩%) من إجمالي سكان المملكة و (٤٢.٢%) من إجمالي سكان إقليم الجنوب وتبلغ الكثافة السكانية

(٦٣.٨) شخص/كم^٢ ويتوزع السكان على (١١٤) تجمعاً سكانياً، أهمها مدينة الكرك مركز المحافظة/ ومدن المزار ومؤتة والقصر أما باقي السكان فيتوزعون على باقي التجمعات السكانية الأخرى، وتتألف محافظة الكرك من سبعة ألوية وثلاثة أفضية ويتواجد في المحافظة عشرة (١٠) بلديات تقدم كافة الخدمات الأساسية للمواطنين، ويتوزع سكان المحافظة على الفئات العمرية المختلفة ويتركز السكان في الفئات العمرية الدنيا حيث يشكل الأطفال (دون سن ١٥) ما نسبته (٣٦.٦%) من مجموع السكان أما كبار السن (٦٥ سنة فما فوق) فيشكلون (٤.١%)، وبذلك يمكن تقدير القوى البشرية في المحافظة (١٥ سنة-٦٤ سنة) بحوالي (٥٩.٣%) من السكان. والجدول التالي يبين توزيع السكان حسب الجنس واللواء والكثافة السكانية في محافظة الكرك.

الجدول رقم (١)

التوزيع السكاني حسب الجنس واللواء والكثافة السكانية في محافظة الكرك

معدل الكثافة السكانية فرد/كم ^٢	النسبة %	المساحة كم ^٢	النسبة من المحافظة %	عدد السكان (نسمة)		اللواء
				ذكور	إناث	
٩٢.٥	٢١.٩	٧٦٦	٣١.٨	٣٥٣٤٠	٣٥٥٤٠	لواء قصبة الكرك
١٢٦.٨	١٤	٤٩٣	٢٨	٣٠٨٣٠	٣١٦٩٠	لواء المزار الجنوبي
٩٣.٨	٧.١	٢٤٣	١٠	١١١٩٠	١١٦١٠	لواء القصر
٤٦	٢٢	٧٧١	١٦	١٧٣٣٠	١٨١٤٠	لواء الأغوار الجنوبية
٧.١	٣٠.٤	١٠٦٣	٣.٤	٣٧١٠	٣٨٨٠	لواء القطرانة
١٣٠.٦	٣	١٠٢	٦	٦٥٨٠	٦٧٤٠	لواء فقوع
١٨٦.٣	١.٦	٥٧	٤.٨	٥٢٢٠	٥٤٠٠	لواء عي
٦٣.٨	١٠٠	٣٤٩٥	١٠٠	٢٢٣٠٠٠		المجموع

المصدر :- دائرة الإحصاءات العامة، ٢٠٠٧.

التقسيمات الإدارية:

تتألف محافظة الكرك من الوحدات الإدارية التالية:

أولاً : لواء قصبة الكرك.

ثانياً : لواء المزار الجنوبي.

ثالثاً : لواء الأغوار الجنوبية.

رابعاً : لواء القطرانة.

خامساً : لواء القصر.

سادساً : لواء فقوع.

سابعاً : لواء عي .

الخارطة رقم (١)

خارطة محافظة الكرك حسب الألوية والقرى



أبرز المشاريع الرأسمالية لمحافظة الكرك

(بالألف دينار)

الرقم	اسم المشروع	الجهة المنفذة	مخصصات ٢٠٠٨	نسبة الإنفاق %	نسبة الإنجاز %	الملاحظات
	مجموع المشاريع الرأسمالية للمحافظة منها المشاريع التالية		٢٣٢٤٥.٥	٩٣.٨		
١.	القرى الحضرية.	وزارة الأشغال	-	-	-	تم وضع المخططات والتصاميم وتم إجراء مناقلات من المخصص لمشاريع أخرى.
٢.	إسكان الأسر الفقيرة.	وزارة الأشغال	٢٣١.٧	١٠٠	١٠٠	-
٣.	توسعة مستشفى الكرك.	وزارة الصحة	٢٨٤٠	١٠٠	٢٠	من المتوقع أن ينتهي المشروع في شهر أيلول/ ٢٠٠٩.
٤.	إنشاء طابق إضافي لمركز الكرك للتأهيل.	وزارة التنمية الاجتماعية	٤٣٢	٩٥.٥	٩٨	هناك استلام أولي للمشروع والأعمال المتبقية تركيب المصاعد.
٥.	تعديل خطوط مياه حوض (٤٧) الحديثة.	سلطة وادي الأردن	٥٠	٧١.١	٩٥	-
٦.	طريق محي-أم حماط.	وزارة الأشغال	١٠٠٠	٩٧.٧	٥٦	هناك مشاكل تواجه المشروع تتعلق بتباطؤ المتعهد.
٧.	إكمال طريق الكرك القطرانية شاملاً مدخل الكرك.	وزارة الأشغال	٢٥٠٠	١٠٠	٧	تم إنجاز طريق الكرك القطرانية بأربعة مسارب بطول (٣٠) كم أما جسر الثنية/المرج فقد تم المباشرة في تنفيذه هذا العام.
٨.	إنشاء جسر الشهابية/ الكرك.	وزارة الأشغال	٢٠	١٠٠	١٠٠	المشروع منتهي.
٩.	تحسين مدخل جامعة مؤتة.	وزارة الأشغال	١٠٠٠	٩٩.٥	٣٥	-
١٠.	ترميم وتعمير قلعة الكرك.	وزارة السياحة	١٠٠	١٠٠	٧٥	المشروع توقف في شهر (١٠) بسبب نفاد المخصصات.
١١.	شراء مبنى لمركز	وزارة	١٠٠٠	-	-	هناك اختلاف على قيمة مبلغ الشراء طرأت حديثاً.

				الثقافة	الحسن الثقافي/الكرك.
--	--	--	--	---------	----------------------

(بالآلف دينار)

الرقم	اسم المشروع	الجهة المنفذة	مخصصات ٢٠٠٨	نسبة الإنفاق %	نسبة الإنجاز %	الملاحظات
١٢.	ترميم آثار الأغوار الجنوبي.	دائرة الآثار	٤٠	١٠٠	٨٥	-
١٣.	طريق كثربا-الأغوار.	وزارة الأشغال	٧٠٠	١٠٠	٦٠	-
١٤.	إنشاء وتحسين الطرق القروية والثانوية.	وزارة الأشغال	١١٠.٢	١٠٠	١٠٠	-
١٥.	صيانة الطرق الزراعية.	وزارة الأشغال	٤٩٣.٨	١٠٠	١٠٠	-
١٦.	سد الكرك.	سلطة وادي الأردن	٥٠	٩٢	٥	في مرحلة الدراسات والتصاميم ومن المتوقع أن يتم البد في عام ٢٠٠٩
١٧.	حمايات مجرى وادي الموجب.	سلطة وادي الأردن	٧١٠	٩٩.٦	٥٠	-
١٨.	مشروع سد الموجب.	سلطة وادي الأردن	-	-	-	تم الانتهاء من المشروع حيث تم إجراء مناقلات من المخصص.
١٩.	سد وادي ابن حماد.	سلطة وادي الأردن	٦٤	٩٨.٧	٥	-

خلاصة التقييم لأهم المشاريع التنموية والرأسمالية لمحافظة الكرك

مخصصات النفقات الرأسمالية للمشاريع التنموية في قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٠٨

قدرت مخصصات المشاريع الرأسمالية لمحافظة الكرك لعام ٢٠٠٨ بمبلغ (٢٣٢٤٥.٥) ألف دينار حيث بلغ الإنفاق الفعلي على هذه المشاريع حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ (٢١٨١٤.٢) ألف دينار أي بنسبة إنفاق (٩٣.٨%) وهي نسبة جيدة بالمقارنة مع بعض المحافظات الأخرى.


(بالآلاف دينار)

البيان	مقدر ٢٠٠٨	الانفاق حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	نسبة الإنفاق الفعلي %
المشاريع الرأسمالية	٢٣٢٤٥.٥	٢١٨١٤.٢	٩٣.٨

المصدر: دائرة الموازنة العامة، ٢٠٠٨.

الشكل رقم (١)

مقارنة الانفاق الفعلي المشاريع الرأسمالية حسب القطاعات
لمحافظة الكرك

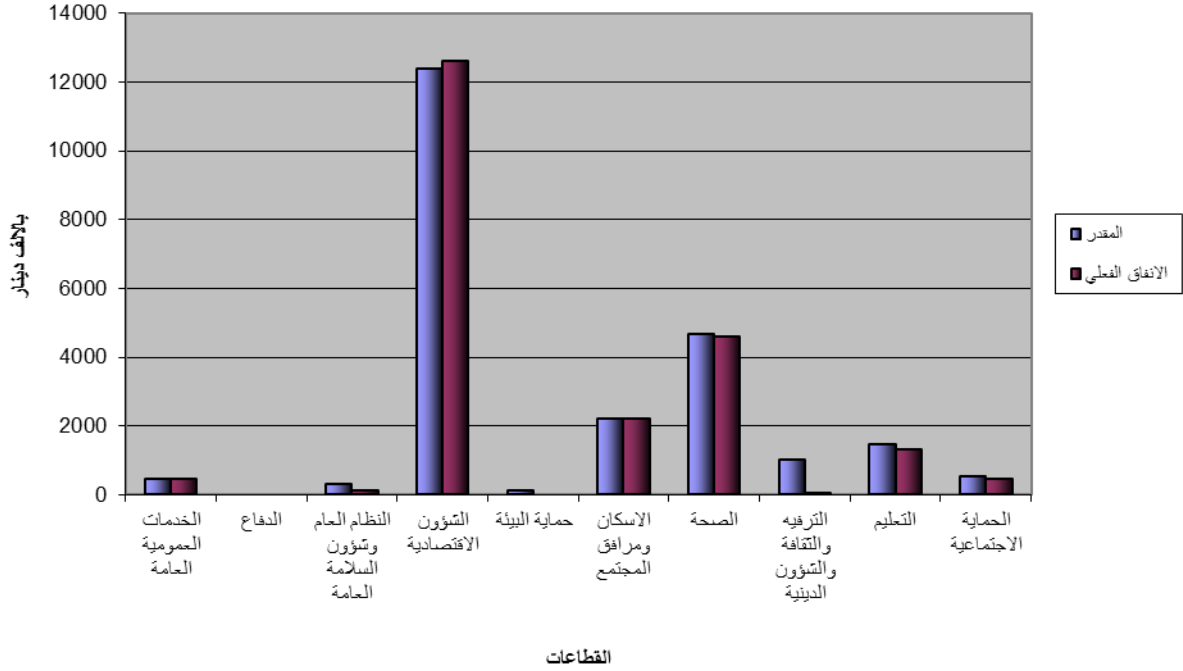


وي

شير توزيع مخصصات المحافظة حسب القطاعات الوظيفية إلى إستئثار قطاع الشؤون الاقتصادية على ما نسبته (٥٣.٤%) من إجمالي مخصصات محافظة الكرك لعام ٢٠٠٨ وذلك من أجل تنمية المحافظة إقتصادياً والمساهمة في تخفيض معدلات البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة عن طريق مشاريع البنية التحتية ومشاريع تعزيز الإنتاجية وتحفيز الإستثمارات المحلية ، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصحة والذي حاز على ما نسبته (٢٠%) من إجمالي مخصصات محافظة وتلاه قطاع الإسكان ومرافق المجتمع ثم قطاع التعليم كما هو واضح في الشكل رقم (٢).

الشكل رقم (٢)

التوزيع القطاعي للمشاريع الرأسمالية لمحافظة الكرك

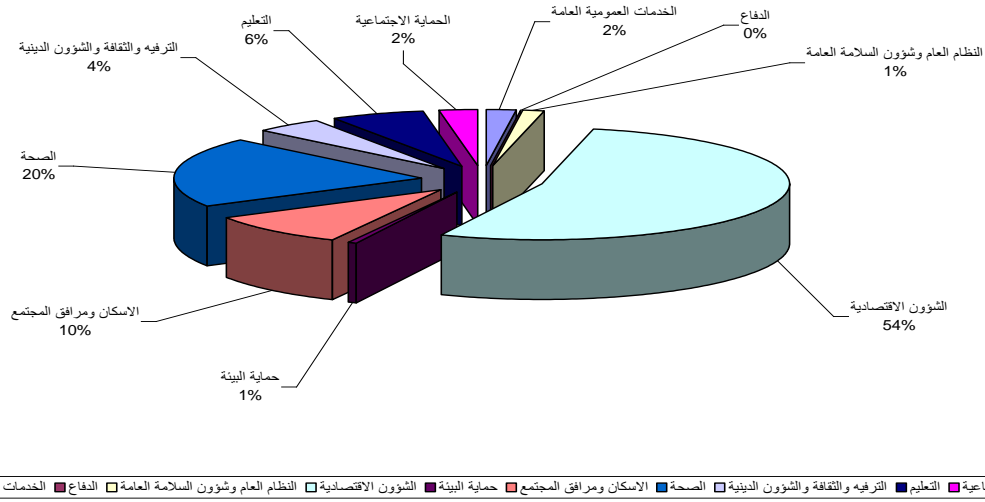

وفي ما يلي تحليل موجز لأهم مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب الفصول:-

وزارة الأشغال العامة والإسكان:-

حظيت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالمرتبة الأولى من حيث حجم المخصصات المرصودة للمحافظة وحجم الانفاق حيث تم تخصيص (٩٤٥١.٧) ألف دينار، مشكلة ما نسبته (٤٠.٧%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ (٩٤٢٥.١) ألف دينار أي ما نسبته (٩٩.٧%) من المخصصات المرصودة لوزارة الأشغال العامة والإسكان في المحافظة.

وزارة الصحة:-

تم تخصيص مبلغ (٤٣٥٠.٨) ألف دينار لوزارة الصحة في محافظة الكرك مشكله ما نسبته (١٨.٧%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ (٤٢٦٢.٩) ألف دينار أي ما نسبته (٩٨%) من المخصصات المرصودة للوزارة في المحافظة.

وزارة المياه والري /سلطة وادي الاردن:-

تم تخصيص مبلغ (٢٢٠٩.٦) الف دينار لسلطة وادي الاردن في محافظة الكرك مشكله ما نسبتة (٩.٥%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ (٢٢٠٨.١) الف دينار اي ما نسبتته (٩٩.٩%) من المخصصات المرصودة للسلطة في المحافظة.

وزارة التربية والتعليم :-

تم تخصيص مبلغ (١٢٩٩.٧) الف دينار لوزارة التربية والتعليم في محافظة الكرك مشكله ما نسبتة ٥.٦% من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة حيث تم انفاق (١١٧٠.٥) الف دينار اي ما نسبتة ٩٠% من المخصصات المرصودة للوزارة في المحافظة حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ .

وفيما يلي بطاقة وصف لأهم المشاريع التي تم تقييمها:-

بالألف دينار

١ - مشروع القرى الحضرية	
الكلفة الكلية	٢١٠٠٠ لكافة المحافظات.
مدة التنفيذ	٢٤ شهراً
مخصصات عام ٢٠٠٨	- تم اجراء مناقلة
الانفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	-
نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨	-
نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:	-
سير العمل في المشروع	تم تخصيص قطعة الأرض لإقامة المشروع من اراضي (قرية ميدين) وتم وضع المخططات والتصاميم ولم يطرح العطاء
الأوامر التغييرية	-
نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:	-
تقييم المشروع	- المشروع يسير دون المستوى المخطط له.
ملاحظات	

بالآلف دينار

٢- مشروع إسكان الأسر الفقيرة		
تشرين أول ٢٠٠٨	٦٦١ ١٢ شهراً ٢٣١.٧ ٢٣١.٧ %١٠٠ %١٠٠	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الاتفاق لغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
	المشروع في المراحل النهائية وتم الإنتهاء منه في عدة مواقع - %١٠٠ المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات.	سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع
ملاحظات		

بالآلف دينار

٣- مشروع توسعة مستشفى الكرك		
ايار ٢٠٠٨	كانون أول ٢٠٠٨ ١٢٠٠٠ ٣٠ شهراً ٢٨٤٠ ٢٨٤٠ %١٠٠ %٢٠	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
		سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع
العمل جارٍ في موقع المشروع وتمثل بأعمال إنشاء بمساحة (١١) الف متر وأعمال صيانة بمساحة (٤٠٠٠) متر علماً بأنه تم البدء بالعمل بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٦ - %٢٠ وهي أعلى من النسبة المتوقعة المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات ومن المتوقع أن ينهي في شهر أيلول ٢٠١٠		
يهدف المشروع إلى توسعة المستشفى القائم وتزويده بـ (١٢٠) غرفة		
ملاحظات		

إضافة وتجهيزه بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة.

بالآلف دينار

٤- مشروع إنشاء طابق إضافي لمركز الكرك للتأهيل	
<p>٢٠٠٨ أيار</p> 	<p>تشرين أول ٢٠٠٨</p>
<p>٨٨٠ ١٢ شهراً ٤٣٢ ٤١٢.٧ %٩٥.٥ %٩٨</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:</p>
<p>العمل جارٍ في موقع المشروع وهو في المراحل النهائية - %٩٨</p>	<p>سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع</p>
<p>المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات</p>	<p>ملاحظات</p>
<p>مساحة البناء ٢٠٠٠ متر مربع يحتوي على قسمين قسم للذكور وقسم للإناث ويقع في منطقة الوسية . الشركة المنفذة : المؤسسة الإقليمية للتعهدات العامة .</p>	

بالآلف دينار

٥- مشروع تبديل خطوط مياه حوض ٤٧ الحديثة	
<p>١٩١ ٤٨ شهراً ٥٠ ٣٥.٦ %٧١.١ %٦٢ تم الإستلام الأولي بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٢</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع</p>
<p>- %٩٥</p>	<p>ملاحظات</p>
<p>المشروع يسير حسب المخطط</p>	<p>المشروع يخدم منطقة الأغوار</p>

٦- مشروع طريق محي - أم حماط

<p>٢٠٠٨ أيار</p>  <p>تشرين أول ٢٠٠٨</p>  <p>٩٧٦.٧</p> <p>٢٠٠٠ ٢٠ شهراً ١٠٠٠</p> <p>٩٧.٧%</p> <p>٤٠%</p> <p>المشروع قيد التنفيذ حيث بدأ التنفيذ بتاريخ ٢٠٠٧/١/٢٠</p> <p>-</p> <p>٥٦%</p> <p>المشروع المفترض أن يتم تسليمه في بداسة شباط ٢٠٠٩ إلا أن هناك مشاكل تواجه المشروع تتعلق بالمقاول تتمثل بالبطء ومن غير المتوقع أن ينتهي المشروع في الفترة المحددة</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨</p> <p>الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١</p> <p>نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨</p> <p>نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية</p> <p>نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الإجمالية: تقييم المشروع</p>	<p>ملاحظات</p>
<p>المشروع يخدم المواطنين في منطقتي محي/أم حماط لواء المزار الجنوبي حيث سيعمل على تقليل نسبة الحوادث المتكررة في هذه المنطقة.</p>		

بالألف دينار

٧- مشروع إكمال طريق الكرك/القطرانة شاملاً مدخل الكرك

	<p>١٠٣٠٠ ٣٠ شهراً ٢٥٠٠ ٢٥٠٠ ١٠٠% ٦%</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: ٦%</p>
<p>- تم تسليم مشروع طريق الكرك القطرانة/المرحلة الرابعة وتم افتتاحه من قبل دولة رئيس الوزراء. - أما مشروع مدخل الكرك/الثنية- فهو في مرحلة التنفيذ الأولية حيث رصد لهذا المشروع هذا العام ٢٥٠٠ ألف دينار. المشروع في إطار إزالة العوائق ومعالجتها من مياه ومجاري وصرف صحي وأعمال القطع وعوائق الكهرباء ١٠٠% مشروع طريق الكرك-القطرانة أما نسبة الإنجاز للمشروع بشقيه فقد بلغت ٦٠%. المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات.</p>	<p>سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع</p>	
<p>- تم إنجاز طريق الكرك القطرانة بأربعة مسارب بطول ٣٠ كم. - أما جسر الثنية/المرج فقد تم المباشرة في تنفيذه هذا العام ويتوقع أن ينتهي العمل بتنفيذه خلال (٣٣) شهر.</p>	<p>ملاحظات</p>	

بالألف دينار

٨- مشروع إنشاء جسر الشهابية - الكرك	
٨١١	الكلفة الكلية
١٩ شهراً	مدة التنفيذ
٢٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
٢٠	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
%١٠٠	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
%١٠٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
المشروع منتهي	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
%١٠٠	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة
المشروع منتهي	الاجمالية:
	تقييم المشروع
ملاحظات	
المشروع يخدم المواطنين في بلدة الشهابية ويعمل على تقليل نسبة الحوادث التي تقع في هذه المنطقة، والمبلغ المرصود هو فاتورة متبقية للمقاول	

بالألف دينار

٩- مشروع تحسين مدخل جامعة مؤتة	
٣٠٠٠	الكلفة الكلية
٢٤ شهراً	مدة التنفيذ
١٠٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
٩٩٩.٥	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
%٩٩.٩	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
%٢٥	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
تم طرح العطاء للمرة الثانية	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
%٣٥ تتمثل في أعمال الإنارة للطريق	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة
المشروع يسير حسب المخطط له.	الاجمالية:
	تقييم المشروع
ملاحظات	
الهدف من المشروع هو تحسين مدخل جامعة مؤتة الشمالي (تحسين طرق+أرصفة وأطراف+مواقف+إنارة) لإعطاء المكان الناحية الجمالية التي تليق بهذا الصرح العلمي وتنظيم المواقع بشكل أفضل.	

بالآلف دينار

١٠ - مشروع ترميم وتعمير قلعة الكرك		
<p>تشرين أول ٢٠٠٨</p> 	<p>١٠٠ مستمر سنوي ١٠٠ ٩٩.٩ %٩٩.٩ %٧٥</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:</p>
<p>تم إنجاز ترميم الكنيسة والجدران الداخلية . جميع الأعمال كانت لإزالة الطمم - %٧٥ المشروع يسير حسب المخطط بالرغم من ازدحام الساحة الرئيسية لمدخل القلعة بالباصات السياحية.</p>		<p>سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع</p>
<p>المشروع توقف في نهاية شهر ١٠ بسبب نفاذ المخصصات</p>		<p>ملاحظات</p>


بالآلف دينار

١١ - مشروع شراء مبنى لمركز الحسن الثقافي / الكرك		
<p>تشرين أول ٢٠٠٨</p> 	<p>٤٠٠٠ ١٢ شهراً ١٠٠٠ - - -</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:</p>
<p>الإجراءات سارية لشراء المبنى الذي يعود ملكيته إلى بلدية الكرك. - المشروع منجز ١٠٠% و ينتظر الإنتهاء من إجراءات الشراء. تعثر إجراءات الشراء بين وزارة الثقافة وبلدية الكرك</p>		<p>سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع</p>
		<p>ملاحظات</p>

١٢ - مشروع ترميم آثار الأغوار الجنوبي

<p>تشرين أول ٢٠٠٨</p> 	<p>٤٠ / مستمر سنوي ٤٠ ٤٠ ١٠٠% ٧٣%</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:</p>
<p>ترميم موقع تل الشيخ عيسى - تم عمل مخططات طبوغرافية وكونتونية للموقع وتصويره حيث بدأ العمل بتصنيف الحجارة الأثرية المتناثرة وتم المباشرة بإزالة الطمم المتراكم داخل الموقع عبر سنوات طويلة.</p> <p>- ٨٥% المشروع يقسم إلى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى وهي مرحلة التنظيف نسبة الانجاز حوالي ٧٠%. المرحلة الثانية وهي التسييج فلم تبدأ بسبب التأخر في طرح العطاء ومن المتوقع أن تبدأ قريباً. المرحلة الثالثة وهي الصيانة والترميم فستبدأ بعد الانتهاء من تسييج الموقع وعمل بوابتين رئيسيتين له.</p>	<p>سير العمل في المشروع</p> <p>الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع</p>	
<p>يقع في غور الصافي/النقع.</p>		<p>ملاحظات</p>

بالآلف دينار

١٣ - مشروع طريق كثربا - الأغوار		
	٦٠٠	الكلفة الكلية
	١٥ شهراً	مدة التنفيذ
٧٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٨	
٧٠٠	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	
%١٠٠	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨	
%٦٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:	
<p>العمل جارٍ في موقع المشروع والمرحلة الأولى ٩ كيلومتر ويسير ضمن برنامج العمل وقد بدأ العمل بهذا المشروع بتاريخ ٢٠٠٨/١/١٠ وهو على عدة مراحل</p>		سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية	
%٦٠	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:	
<p>المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات .</p>		تقييم المشروع
<p>يخدم المشروع المواطنين الذي يسلكون الطريق المؤدية من كثربا وإلى الأغوار الجنوبية والعكس</p>		ملاحظات

بالآلف دينار

١٤ - مشروع إنشاء وتحسين الطرق القروية والثانوية		
٢٥٠	الكلفة الكلية	
٦ أشهر	مدة التنفيذ	
١١٠.٢	مخصصات عام ٢٠٠٨	
١١٠.٢	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	
%١٠٠	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨	
%١٠٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:	
<p>العمل جارٍ في موقع المشروع</p>		سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية	
%١٠٠	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:	
<p>المشروع يسير حسب المخطط</p>		تقييم المشروع
<p>المشروع عبارة عن إنشاء وتحسين الطرق القروية والثانوية والنافذة في كافة مناطق المحافظة بهدف خدمة المجتمع المحلي في هذه المناطق</p>		ملاحظات


بالألف دينار

١٥ - مشروع صيانة الطرق الزراعية	
الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع	مستمر ١٦ شهراً ٤٩٣.٨ ٤٩٣.٨ %١٠٠ %٩٥ العمل جارٍ في موقع المشروع - %١٠٠ المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات .
ملاحظات	مشروع سنوي متكرر الهدف منه إنشاء وصيانة الطرق الزراعية في مواقع مختلفة من المحافظة ويتضمن عبارات إمبوية ومواد مفروزة وفرشيات .


بالألف دينار

١٦ - مشروع سد الكرك	
الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع	٥٦٢٠ ٣٦ شهراً ٥٠ ٤٦ %٩٢ %١ تم طرح عطاء الدراسات وسيتم طرح عطاء الإنشاء بمطلع عام ٢٠٠٩ - %٥ المشروع في مرحلة إعداد الدراسات والتصاميم ومن المتوقع أن يتم البدء بالتنفيذ في مطلع العام القادم
ملاحظات	-

بالآلف دينار

١٧ - مشروع حمايات مجرى وادي الموجب		
<p>تشرين أول ٢٠٠٨</p> 	<p>١١٠٠ ٣٢٠ شهراً ٧١٠ ٧٠٧.٣ %٩٩.٦ %٢٥</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:</p>
<p>المشروع قيد التنفيذ والعمل جارٍ في موقع المشروع - %٥٠</p> <p>المشروع يسير حسب المخطط وهو مشروع مشترك ما بين وزارة الأشغال العامة وسلطة وادي الأردن</p>	<p>سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع</p>	<p>ملاحظات</p>
<p>يهدف المشروع إلى تنفيذ أعمال حماية لجسر الموجب والخطوط الناقلة</p>		

بالآلف دينار

١٨ - مشروع سد الموجب		
<p>تشرين أول ٢٠٠٨</p> 	<p>٤٥٠٠٠ ٧٢ شهراً - تم اجراء مناقلة - - -</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:</p>
<p>تم الإنتهاء من المشروع والمبلغ المرصود ضمن موازنة ٢٠٠٨ هي أعمال صيانة دورية للمشروع - %١٠٠ المشروع منتهي .</p>	<p>سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع</p>	<p>ملاحظات</p>
<p>-</p>		

١٩ - مشروع سد وادي ابن حماد	
١٨٦٦٠	الكلفة الكلية
٣٦ شهراً	مدة التنفيذ
٦٤	مخصصات عام ٢٠٠٨
٦٣	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
%٩٨.٧	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
%٢	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
المشروع في مرحلة الدراسات وإعداد التصاميم وقد تم طرح عطاء الدراسات على ائتلاف شركات سنوكي وبرنارد بمشاركة إتحاد المستشارين	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
%٥ (دراسات)	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:
من المتوقع أن يتم البدء في التنفيذ بعد إنتهاء الدراسات والتصاميم مع العلم أن هناك بطء في الدراسات وإعداد التصاميم	تقييم المشروع
سيتم طرح العطاء في عام ٢٠١٠	ملاحظات

مطالب واحتياجات محافظة الكرك

- ١- استملاك قطع أراضي لبناء مراكز صحية في كل من : المرج ، الثنية ، زحوم، مدين.
- ٢- ترفيع مركز صحي مؤاب إلى مركز شامل وتزويده بالكوادر الطبية اللازمة.
- ٣- إنشاء مركز صحي شامل في قضاء الموجب.
- ٤- رفد مركز صحي عي الشامل بدوام كامل واطباء مختصين واجهزة طبية وفني اشعة وفني مختبر ووحدة غسيل كلى.
- ٥- تكملة منشآت مجمع الأمير فيصل الرياضي ليصبح مدينة رياضية متكاملة.
- ٦- انشاء مدينة حرفية لمحافظة الكرك.
- ٧- استكمال مشروع البانوراما وخاصة فيما يتعلق ببرنامج الصوت والضوء.
- ٨- إنشاء شبكة صرف صحي لمناطق ابو حمور، الثنية، الصبقيات، الشهابية واستبدال خطوط و شبكات المياه القديمة والمهترئة.
- ٩- تكملة فتح وتعبيد طريق صرفا / الأغوار لاهميتها.
- ١٠- فتح طريق الطبية - الأغوار الجنوبية.
- ١١- توسعة الطريق الملوكي الربة / منشية ابو حمور ليصبح بأربعة مسارب.
- ١٢- توسيع طريق فقوع / البذية نظراً لخطورتها.
- ١٣- زيادة مخصصات الطرق الزراعية نظراً لكون منطقة لواء فقوع منطقة زراعية ووعرة.

