محافظة البلقاء

محافظة البلقاء

لمحة عامة:

تتميز محافظة البلقاء بطبيعتها الجبلية وبتنوع المناخ والتضاريس، فهي تقع في الجزء الغربي من المملكة حيث تكتسب موقعاً متوسطاً بين كافة محافظات المملكة إشتهرت بطبيعتها الخلابة وكرومها الجميلة وآثارها القديمة.

التضاريس والمناخ:

تتميز المحافظة بتنوع المناخ والتضاريس إذ تنخفض منطقة الأغوار لتصل إلى(٢٢٤)م تحت سطح البحر، أما الجبال فيصل ارتفاعها إلى (١١٣٠)م ، حيث أن مناطقها المرتفعة تمتاز بمناخ ماطر وبارد شتاءً ومعتدل صيفاً، ويبلغ معدل هطول الأمطار فيها (٦٠٠)ملم، أما المناطق المنخفضة (الأغوار) فتتميز بإعتدال درجات الحرارة شتاءً وإرتفاع درجات الحرارة صيفاً ويبلغ معدل هطول الأمطار فيها (١٥٠-٢٠٠)ملم، مما يعطي المحافظة ميزة زراعية نسبية تساعدها على التنوع في الزراعات على مدار العام، فضلاً عن الأهمية السياحية بفصليها الشتاء والصيف.

الموقع والمساحة:

تقع محافظة البلقاء في الجزء الغربي من المملكة، وتمتاز محافظة البلقاء بموقعها الوسطي بين محافظات المملكة ويبعد مركز المحافظة عن العاصمة عمان حوالي (٢٥) كم، وتبلغ مساحة محافظة البلقاء حوالي (١١١٩)كم٢ وبهذا تشكل المحافظة ما نسبته (١.٣%) من المساحة الكلية للمملكة.

الواقع السكاني والكثافة السكانية:

يبلغ عدد السكان في المحافظة حوالي (٣٨٣٤٠٠) نسمة (دائرة الإحصاءات العامة ٢٠٠٧)، ويتوزع سكان المحافظة على ألوية المحافظة الخمسة، ويلاحظ بأن هناك تركز سكاني في لوائي عين الباشا وقصبة السلط بنسبة (٣٧%، ٣٢%) على التوالي، فيما يلاحظ الكثافة السكانية البارزة على مستوى المحافظة في لواء عين الباشا إذ تبلغ (١٤٥٦.٥) نسمة/كم٢.

الجدول رقم (١)

التوزيع السكاني حسب الجنس واللواء والكثافة السكانية في محافظة البلقاء

اللواء	عدد السكان (نسمة)		النسبة من المحافظة %	المساحة كم٢	النسبة %	معدل الكثافة السكانية فرد/كم٢
	ذكور	اناث				
لواء القصبة	٦٢٦٥٠	٥٨٩٨٠	٣١.٧	٤٥٤	٤٠	٢٦٨
ماحص والفحيص	١٢٧٤٠	١١٩٤٠	٦.٤	٣٠	٣	٨٢٣
دير علا	٢٦٨٧٠	٢٤٥٨٠	١٣.٤	٢٤٣	٢١	٢١٢
الشونة الجنوبية	٢٣٢١٠	١٩٦٩٠	١١.٣	٢٩٤	٢٧	١٤٦
عين الباشا	٧٣٦٣٠	٦٩١١٠	٣٧.٢	٩٨	٩	١٤٥٦.٥
المجموع	**٣٨٣٤٠٠**		**١٠٠**	**١١١٩**	**١٠٠**	**٣٤٢.٦**

المصدر :- دائرة الإحصاءات العامة، ٢٠٠٧.

التقسيمات الإدارية:

تقسم المحافظة إدارياً إلى خمسة ألوية هي :-

أولا : لواء قصبة السلط :
- قضاء العارضة
- قضاء عيرا ويرقا
- قضاء علان
- قضاء زي

ثانيا : لواء الشونة الجنوبية.
ثالثا : لواء دير علا.
رابعاً : لواء عين الباشا.
خامساً : لواء الفحيص.

الخارطة رقم(١)

خارطة محافظة البلقاء حسب الألوية والقرى

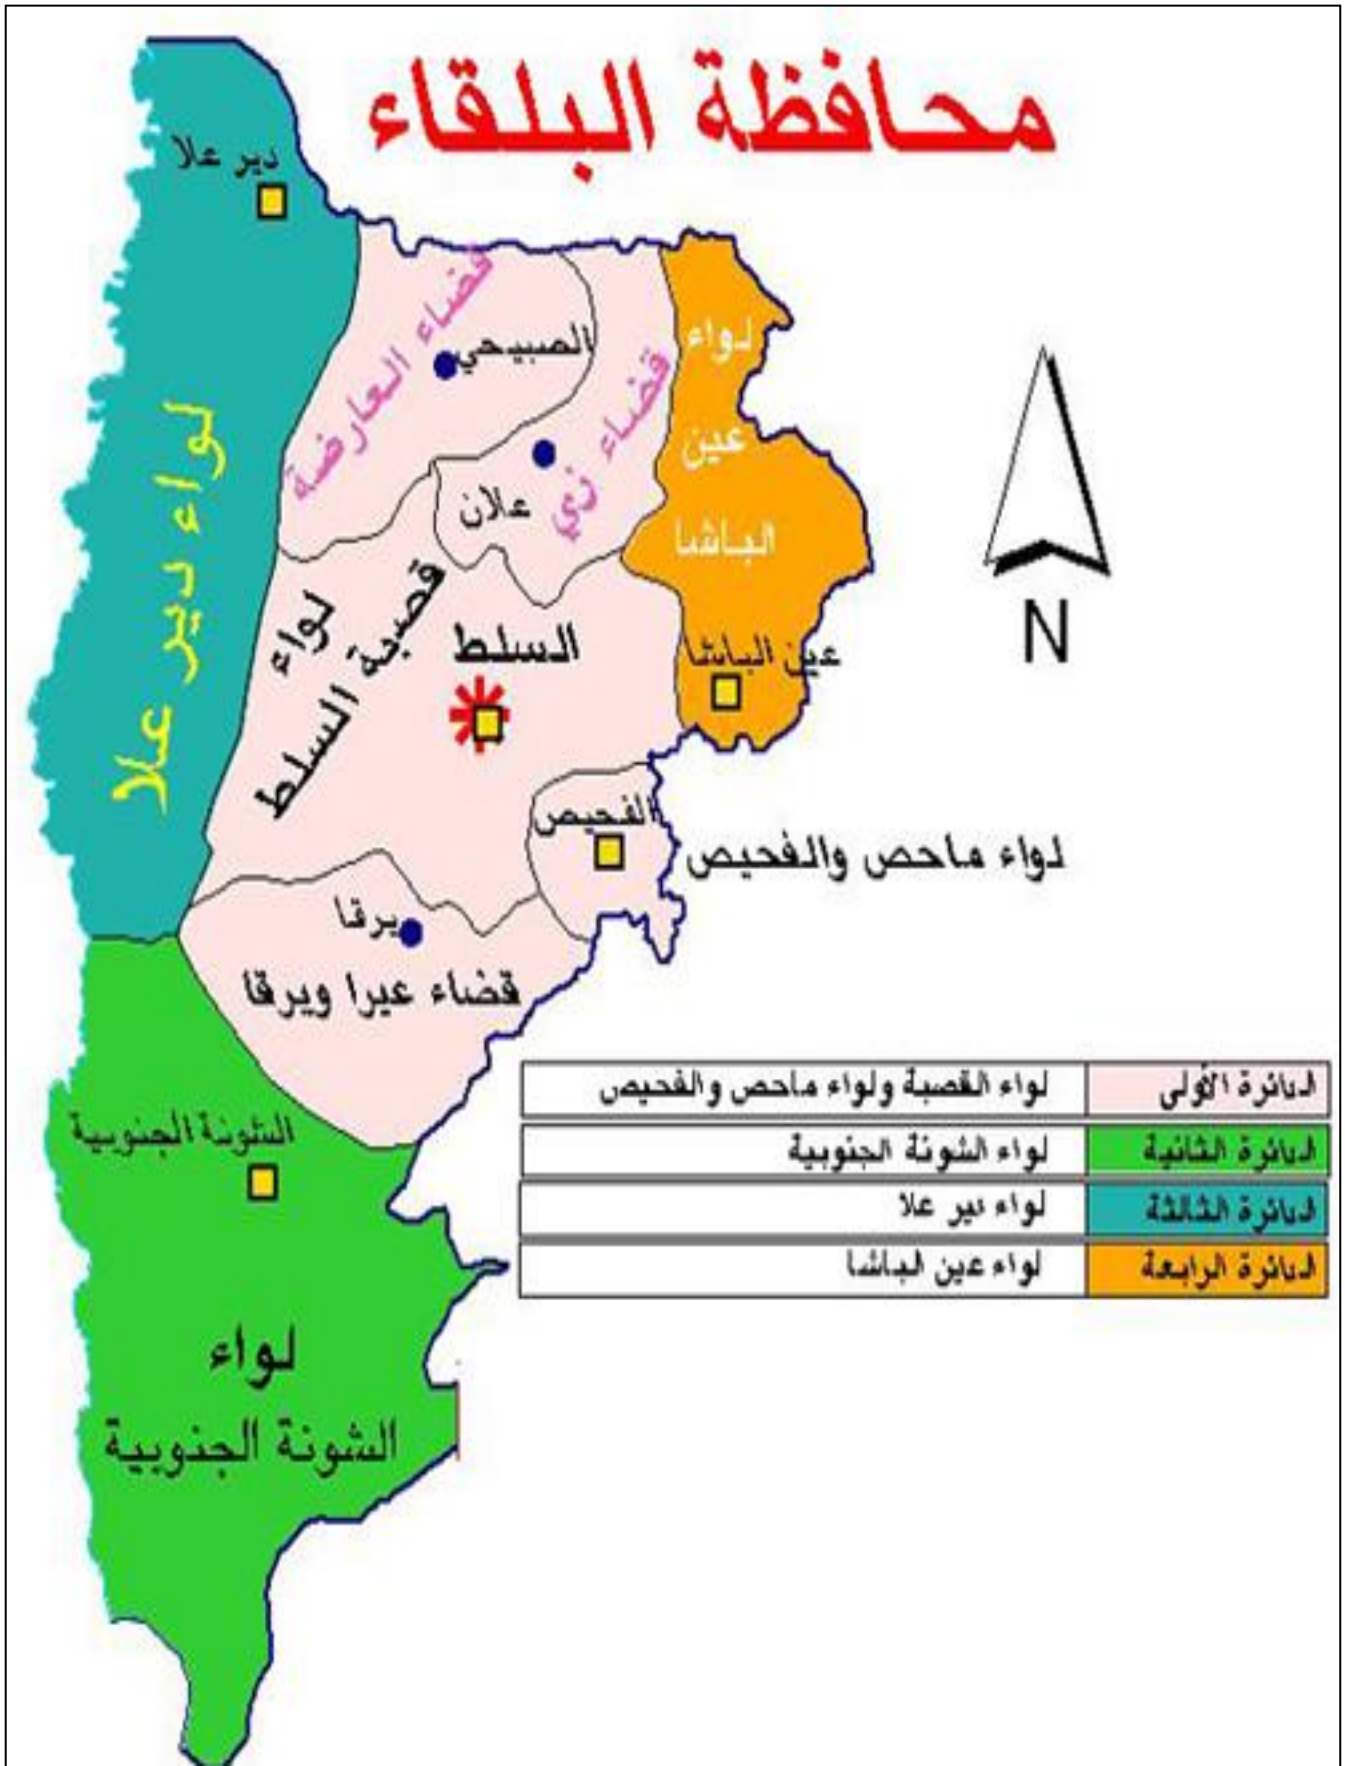

أبرز المشاريع الرأسمالية لمحافظة البلقاء

(بالألف دينار)

الرقم	اسم المشروع	الجهة المنفذة	مخصصات ٢٠٠٨	نسبة الإنفاق%	نسبة الإنجاز%	الملاحظات
	مجموع المشاريع الرأسمالية للمحافظة منها المشاريع التالية		**٣٨٢٢٢.٦**	**٩٩.٨**		
١.	إنشاء مبنى محافظة البلقاء وسكن المحافظ.	وزارة الداخلية	٢٠٥٠	٩٦.٥	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع وتم الاستلام الأولي.
٢.	مستشفى البقعة.	وزارة التخطيط	-	-	٤٠	العمل جارٍ في موقع المشروع-تم الإنفاق على المشروع من أصل القرض الصيني
٣.	إكمال طريق السلط الدائري/ الجزء الأول.	وزارة الأشغال	١٢٠٠	١٠٠	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع وتم الاستلام الأولي.
٤.	تنفيذ طريق الشونة الشمالية/الجنوبية/ منطقة كريمة .	وزارة الأشغال	١٥٠٠	١٠٠	٧٠	العمل جارٍ في موقع المشروع مع ملاحظة أن المشروع يسير دون المستوى المخطط له بسبب انتهاء فترة المشروع.
٥.	تقاطعات البقعة.	وزارة الأشغال	٤٩٠٠	١٠٠	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع وتم استلامه أولياً.
٦.	تحسين وتنفيذ تقاطع أم النعاج.	وزارة الأشغال	٢٠٠	١٠٠	١٠	تم طرح العطاء وتمت إحالته والمشروع يسير دون المستوى المخطط له بسبب التأخر في طرح وإحالة العطاء.
٧.	تنفيذ جسر على تقاطع عين الباشا.	وزارة الأشغال	٣٤٠٠	١٠٠	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع/ قيد الاستلام الأولي .
٨.	طريق السلط/الأغوار.	وزارة الأشغال	٢٥٠٠	١٠٠	٩٢	العمل جارٍ في موقع المشروع.
٩.	إنشاء طريق عيرا/الكرامة.	وزارة الأشغال	٢٥٠	٨٨	٥٥	العمل جارٍ في موقع المشروع.
١٠.	ري دامية.	سلطة وادي الأردن	١١٧٢	٩٩	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع/ قيد الاستلام الأولي.
١١.	مدرسة علي بن أبي طالب الشرعية.	وزارة التربية	٥٣٠	١٠٠	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع/ قيد الاستلام الأولي.
١٢.	إنشاء مستشفى السلط الجديد.	وزارة الصحة	-	-	-	المشروع في مرحلة الدراسات وإعداد التصاميم

						ويسير دون المستوى المخطط له – تم نقل جميع المخصصات لمشاريع أخرى

(بالألف دينار)

الرقم	اسم المشروع	الجهة المنفذة	مخصصات ٢٠٠٨	نسبة الإنفاق	نسبة الإنجاز%	الملاحظات
١٣.	تنفيذ كيبل للمشاريع الاستثمارية في منطقة الزارة.	سلطة وادي الأردن	١٢١٣	١٠٠	٢٠	العمل جارٍ في موقع المشروع ويسير دون المستوى المخطط له بسبب تأخر وزارة الأشغال من تحديد المسار الآمن للكوابل.
١٤.	إسكان الأسر الفقيرة .	وزارة الأشغال	٧٦١	١٠٠	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع وتم الاستلام الأولي.
١٥.	القرى الحضرية.	وزارة الأشغال	-	-	-	المشروع في مرحلة الدراسات وإعداد التصاميم ويسير دون المستوى المخطط له وتم إجراء مناقلات من المخصص لمشاريع أخرى

خلاصة التقييم لأهم المشاريع التنموية والرأسمالية لمحافظة البلقاء

مخصصات النفقات الرأسمالية للمشاريع التنموية في قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٠٨

بلغت مخصصات المشاريع الرأسمالية لمحافظة البلقاء (٣٨٢٢٢.٦) ألف دينار لعام ٢٠٠٨ موزعة على القطاعات وحسب الفصول للوزارات والدوائر الحكومية في حين بلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ (٣٨١٥٨.٦) ألف دينار أي ما نسبته (٩٩.٨%) من إجمالي المخصصات الرأسمالية المقدرة للمحافظة وهي نسبة ضمن المستوى المستهدف للإنفاق ، وتعتبر نسبة مرتفعة بالمقارنة مع بعض المحافظات الأخرى كما في الشكل رقم (١).

(بالألف دينار)

البيان	مقدر ٢٠٠٨	الانفاق حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	نسبة الإنفاق الفعلي %
المشاريع الرأسمالية	٣٨٢٢٢.٦	٣٨١٥٨.٦	٩٩.٨

المصدر: دائرة الموازنة العامة.

شكل رقم (١)

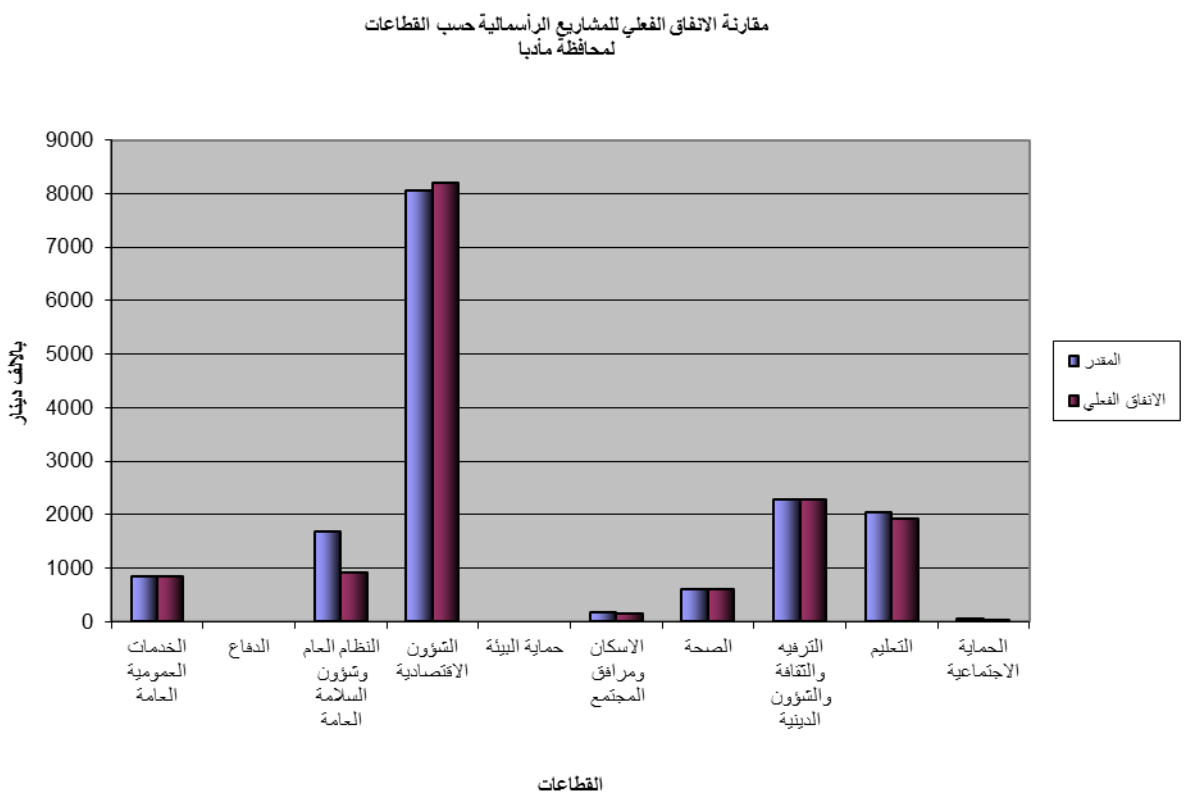

ويشير توزيع المخصصات المالية لمحافظة البلقاء حسب القطاعات الوظيفية إلى أن قطاع الشؤون الإقتصادية إستأثر على ما نسبته (٥٠.٩%) من إجمالي مخصصات محافظة البلقاء لعام ٢٠٠٨ وذلك من أجل تنمية المحافظة إقتصادياً والمساهمة في تخفيض معدلات البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة من مشاريع البنية التحتية ومشاريع تعزيز الإنتاجية وتحفيز الإستثمارات المحلية، ويأتي في المرتبة الثانية قطاع الإسكان ومرافق المجتمع والذي حاز على ما نسبته (٢٦.٦%) من إجمالي مخصصات محافظة البلقاء وتلاه قطاع التعليم وقطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة كما هو واضح في الشكل رقم (٢) .

شكل رقم (٢)

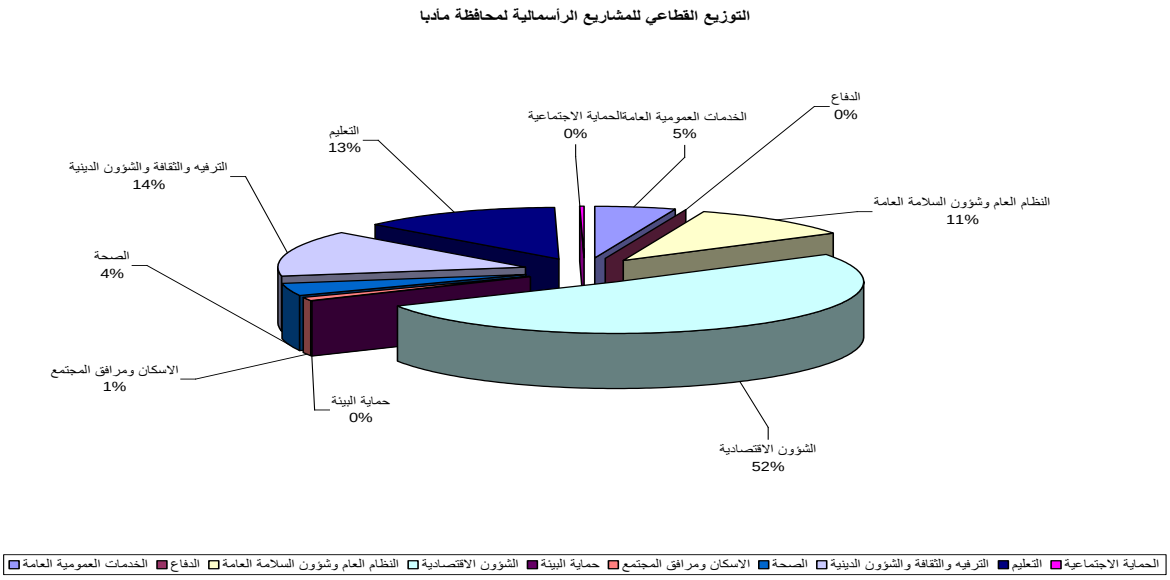

وفي ما يلي تحليل موجز لأبرز مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب الفصول:-

الإشغال العامة والإسكان :-

احتلت وزارة الاشغال العامة والاسكان المرتبة الاولى من حيث حجم المخصصات المرصودة للمحافظة وحجم الانفاق حيث تم تخصيص (١٨٤٣١.٧)الف دينار مشكلة ما نسبتة (٤٨.٢%) من اجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ (١٨٣٩٨.٣) الف دينار اي ما نسبتة (٩٩.٨%) من المخصصات المرصودة لوزارة الاشغال العامة والاسكان في المحافظة وتعتبر من النسب المرتفعة في مثل هذا الوقت من السنة.

وزارة المياة والري /سلطة وادي الاردن :-

تم تخصيص مبلغ (١٠١٥٩)الف دينار لسلطة وادي الاردن في محافظة البلقاء مشكلة ما نسبتة (٢٦.٦%) من اجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، حيث تم انفاق (١٠٢٦٣.٧)الف دينار اي ما نسبتة (١٠١%) من المخصصات المرصودة للسلطة في المحافظة، حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١، وهي نسبة ضمن المستوى المستهدف في مثل هذا الوقت من السنة .

الصحة :-

تم تخصيص مبلغ (١٤٤٩.٥)الف دينار لوزارة الصحة في محافظة البلقاء مشَّكلة ما نسبتة (٣.٨%) من اجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، حيث تم انفاق (١٤١٥.٨)الف دينار اي ما نسبتة (٩٧.٧%) من المخصصات المرصودة للوزارة في المحافظة حتى

٢٠٠٨/١٢/٣١، وهي ضمن المستوى المستهدف للانفاق ، ومعظم المخصصات المرصودة في المحافظة عبارة عن نفقات مستمرة لتحديث الاجهزة وصيانتها لرفع كفاءة الجهاز الطبي.

التربية والتعليم :-

تم تخصيص مبلغ (٢٣٤١.٩)الف دينار لوزارة التربية والتعليم في محافظة البلقاء مشكّلة ما نسبتة (٦.١%) من اجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة حيث تم انفاق (٢١٨٤.٣) الف دينار اي ما نسبتة (٩٣.٣%) من المخصصات المرصودة للوزارة في المحافظة حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ وهي نسبة ضمن المستوى المستهدف في مثل هذا الوقت من السنة.

وفيما يلي بطاقة وصف لأهم المشاريع التي تم تقييمها:-

بالألف دينار

١- مشروع إنشاء مبنى محافظة البلقاء وسكن المحافظ		
الكلفة الكلية:	١٩٦٠	كانون أول ٢٠٠٨ أيار ٢٠٠٨
مدة التنفيذ:	١٦ شهراً	
مخصصات عام ٢٠٠٨ :	٢٠٥٠	
الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١:	١٩٧٩	
نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨:	٩٦.٥%	
نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:	١٠٠%	
سير العمل في المشروع :	تم الانتهاء من المشروع/وتم الاستلام الأولي.	
الأوامر التغييرية :	تم استثناء سكن المحافظ من المشروع لتوفير مساحة لوقوف السيارات داخل حرم المبنى .	
نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:	١٠٠%	

تقييم المشروع :	يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات.
ملاحظات :	-

بالألف دينار

٢- مشروع مستشفى البقعة		
الكلفة الكلية :	١٥٠٠٠	كانون أول ٢٠٠٨ تشرين أول ٢٠٠٨
مدة التنفيذ	٢٠ شهراً	
مخصصات عام ٢٠٠٨	١٧٠٠ تم إجراء مناقلات بكامل المخصص	
الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	-	
نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨	-	
نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:	-	
سير العمل في المشروع:	المشروع في مرحلة التنفيذ والعمل مستمر على أرض الواقع.	
الأوامر التغييرية :	-	
نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:	٤٠%	
تقييم المشروع :	المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات.	
ملاحظات :	تم الإنفاق على المشروع من أصل القرض الصيني.	

بالألف دينار

٣- مشروع إكمال طريق السلط الدائري/ الجزء الأول		
الكلفة الكلية	١٣٢٥٠	تشرين أول ٢٠٠٨
مدة التنفيذ	٦٠ شهرا	
مخصصات عام ٢٠٠٨	١٢٠٠	
الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	١٢٠٠	
نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨	١٠٠%	
نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:	١٠٠%	

سير العمل في المشروع:	تم الانتهاء من المشروع وتم استلامه حيث تم افتتاحه من قبل دولة رئيس الوزراء بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٢٨.
الأوامر التغييرية	-
نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:	١٠٠%
تقييم المشروع	المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات
ملاحظات:	يقع المشروع في لواء قصبة السلط ويخدم سكان المحافظة.

بالألف دينار

٤- مشروع تنفيذ طريق الشونة الشمالية-الجنوبية (منطقة كريمة)	
الكلفة الكلية	١٠٥٠٠
مدة التنفيذ	٢٤ شهراً
مخصصات عام ٢٠٠٨	١٥٠٠
الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	١٥٠٠
نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨	١٠٠%
نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:	٩٠%
سير العمل في المشروع	المشروع في مرحلة التنفيذ والعمل جاري في موقع المشروع.
الأوامر التغييرية	
نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:	٧٠%
تقييم المشروع	المشروع يسير حسب المخطط المعدل له بسبب انتهاء فترة المشروع حيث هناك تأخر بمشروع توسعة طريق الشونة الجنوبية-الكفرين الذي يجري العمل به حالياً الأمر الذي يتسبب بوقوع حوادث سير على الطريق ومشاكل عديدة جراء هذا التأخير الملحوظ.
ملاحظات	ربط محافظة إربد في محافظة البلقاء.

بالألف دينار

٥- مشروع تقاطعات البقعة		
الكلفة الكلية	١٠٠٠٠	كانون أول ٢٠٠٨
مدة التنفيذ	٢٤ شهراً	
مخصصات عام ٢٠٠٨	٤٩٠٠	
الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	٤٩٠٠	
نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨:	١٠٠%	
نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:	١٠٠%	

تشرين أول ٢٠٠٨

سير العمل في المشروع	تم الانتهاء من المشروع وتم استلامه وتم افتتاحه من قبل دولة رئيس الوزراء وهو على مرحلتين :- ١- مرحلة الجسر. ٢- مرحلة ربط المخيم مع الشارع الرئيسي.
الأوامر التغييرية	(١) مليون دينار لربط المخيم وأعمال توسعة للطرق والخدمات.
نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:	١٠٠%
تقييم المشروع	المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات
ملاحظات	-

بالألف دينار

٦- مشروع تحسين وتنفيذ تقاطع أم النعاج	
الكلفة الكلية	٦٠٠٠
مدة التنفيذ	٢٤ شهراً
مخصصات عام ٢٠٠٨	(٢٠٠) إجراء مناقلة مالية بمبلغ (٥٠٠) ألف دينار
الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠
نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨	١٠٠%
نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:	١٠%
سير العمل في المشروع:	تم طرح العطاء وتمت إحالته.
الأوامر التغييرية	-
نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:	١٠%
تقييم المشروع	المشروع يسير دون المستوى المخطط له بسبب التأخر في طرح وإحالة العطاء.
ملاحظات	يقع المشروع في لواء قصبة السلط وهو مشروع حيوي جداً بسبب كثرة الحوادث التي تقع على هذا الطريق مما يساعد في التخفيف منها .

بالألف دينار

٧- مشروع تنفيذ جسر على تقاطع عين الباشا

الكلفة الكلية	٤٣٩٥	كانون أول ٢٠٠٨ تشرين أول ٢٠٠٨
مدة التنفيذ	٢٢ شهراً	
مخصصات عام ٢٠٠٨	٣٤٠٠	
الإنفـــــاق الفعلـــــي حتـــــى ٢٠٠٨/١٢/٣١	٣٤٠٠	
نسـبة الإنفـاق مـن المخصـص ٢٠٠٨	%١٠٠	
نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:	%١٠٠	
سير العمل في المشروع	تم الانتهاء من المشروع/قيد الاستلام الأولي وهو على مرحلتين :- ١- مرحلة الجسر. ٢- مرحلة الخدمات.	
الأوامر التغييرية	-	
نسـبة الانجـاز مقارنـة بالكلفـة الاجمالية:	%١٠٠	
تقييم المشروع	المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات	
ملاحظات	-	

بالألف دينار

٨- مشروع طريق السلط الأغوار

الكلفة الكلية	٢٥٠٠	كانون أول ٢٠٠٨ تشرين أول ٢٠٠٨ 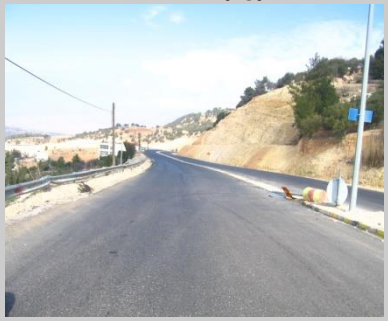
مدة التنفيذ	٢٢ شهراً	
مخصصات عام ٢٠٠٨	٢٥٠٠	
الإنفـــــاق الفعلـــــي حتـــــى ٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٥٠٠	
نسبة الإنفـاق مـن المخصـص ٢٠٠٨	%١٠٠	
نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:	%٩٠	
سير العمل في المشروع	المشروع في مرحلة التنفيذ والعمل جار في موقع المشروع ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال شهر شباط ٢٠٠٩.	
الأوامر التغييرية	بناء جدران استنادية على جوانب الطريق.	
نسـبة الانجـاز مقارنـة بالكلفـة الاجمالية:	%٩٢	
تقييم المشروع	المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات.	

ملاحظات	المشروع يقع في لواء قصبة السلط

بالألف دينار

٩- مشروع إنشاء طريق عيرا – الكرامة	
الكلفة الكلية	٧٥٠
مدة التنفيذ	١٠ شهراً
مخصصات عام ٢٠٠٨	٢٥٠
الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٢٢
نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨	٨٨%
نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:	٤٠%
سير العمل في المشروع	المشروع في مرحلة التنفيذ حيث تمت معالجة الانزلاقات التي حصلت للتربة.
الأوامر التغييرية	حدوث أوامر تغييرية لمعالجة الانزلاقات .
نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:	٥٥%
تقييم المشروع	المشروع يسير حسب المخطط بعد صدور الأوامر التغييرية.
ملاحظات :	يقع المشروع في لواء قصبة السلط قضاء عيرا ويرقا ويربط القضاء بلواء الشونة الجنوبية ويخدم أهالي المنطقة.

بالألف دينار

١٠- مشروع ري دامية	
الكلفة الكلية	١٥٢٠
مدة التنفيذ	١٤ شهراً
مخصصات عام ٢٠٠٨	١١٧٢
الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	١١٦١
نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨	٩٩%
نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:	١٠٠%
سير العمل في المشروع	تم الانتهاء من المشروع / قيد الاستلام الأولي.
الأوامر التغييرية	-
نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:	١٠٠%
تقييم المشروع	المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات

ملاحظات	يقع المشروع في لواء دير علا

بالألف دينار

١١- مشروع مدرسة علي بن أبي طالب الشرعية		
الكلفة الكلية	١٦٧١	كانون أول ٢٠٠٨ تشرين أول ٢٠٠٨
مدة التنفيذ	٣٦ شهرا	
مخصصات عام ٢٠٠٨	٥٣٠	
الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	٥٣٠	
نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨	١٠٠%	
نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:	١٠٠%	
سير العمل في المشروع	تم الانتهاء من المشروع / قيد الاستلام الأولي.	
الأوامر التغييرية	-	
نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:	١٠٠%	
تقييم المشروع	المشروع يسير حسب المخطط له ولا يوجد معوقات	
ملاحظات	ينفذ المشروع في كافة المحافظات ويخدم القطاع التعليمي من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة.	

بالألف دينار

١٢- مشروع إنشاء مستشفى السلط الجديد	
الكلفة الكلية	٤٥٠٠٠
مدة التنفيذ	٤٨ شهراً
مخصصات عام ٢٠٠٨	٢١٠٠ تم نقل جميع مخصصات ٢٠٠٨ لمشاريع أخرى.
الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	-
نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨	-
نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:	-
سير العمل في المشروع:	المشروع في مرحلة الدراسات وإعداد التصاميم.
الأوامر التغييرية	-
نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:	-
تقييم المشروع	المشروع يسير دون المستوى المخطط له.
ملاحظات	-

بالألف دينار

١٣- مشروع تنفيذ كيبل للمشاريع الاستثمارية في منطقة الزارة	
الكلفة الكلية	٢٧٠٠
مدة التنفيذ	١٨ شهراً
مخصصات عام ٢٠٠٨	١٢١٣
الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	١٢١٣
نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨	١٠٠%
نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:	١٠%
سير العمل في المشروع .	المشروع في مرحلة التنفيذ والعمل جارٍ في الموقع
الأوامر التغييرية .	-
نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:	٢٠%
تقييم المشروع .	المشروع يسير حسب المخطط امعدل بسبب تأخر وزارة الأشغال العامة والإسكان من تحديد المسار الآمن للكوابل.
ملاحظات	يقع المشروع في لواء الشونة الجنوبية

بالألف دينار

١٤- مشروع إسكان الأسر الفقيرة	
الكلفة الكلية	٢٢٥٠٠
مدة التنفيذ	٢٤ شهراً
مخصصات عام ٢٠٠٨	٧٦١
الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	٧٦١
نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨	١٠٠%
نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:	١٠٠%
سير العمل في المشروع .	تم الاستلام الأولي للمشروع وهو على مرحلتين :- ١- إسكان يرقا (٢٠) وحدة سكنية . ٢- إسكان الصبيحي (١٦) وحدة سكنية .
الأوامر التغييرية .	-
نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:	١٠٠%
تقييم المشروع .	المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات.
ملاحظات .	المشروع يخدم الأسر الفقيرة في المحافظة.

تشرين أول ٢٠٠٨

بالألف دينار

١٥- مشروع القرى الحضرية	
الكلفة الكلية	٢١٠٠٠
مدة التنفيذ	٢٤ شهراً
مخصصات عام ٢٠٠٨	تم تخصيص (١) مليون دينار لمحافظة البلقاء وتم إجراء مناقلات بكامل المخصص لمشاريع أخرى .
الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	-
نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨	-
نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:	-
سير العمل في المشروع .	- المشروع في مرحلة الدراسات وإعداد التصاميم. - تم تحديد قطعة الأرض .

الأوامر التغييرية .	-
نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:	-
تقييم المشروع .	المشروع يسير دون المستوى المخطط له.
ملاحظات .	-

مطالب واحتياجات محافظة البلقاء

١. إستملاك قطعة أرض في منطقة بيوضة الشرقية لإقامة المركز الصحي/العارضة.
٢. تحويل مركز صحي زي الشامل الى مركز إسعاف وطواريء على مدار الساعة وتزويده ببعض الأسرة وجهاز أشعة وسيارة إسعاف وإكمال الطابق الأرضي وعمل سور للمركز.
٣. إنشاء مركز صحي فرعي في منطقة الديرة علماً بأن الأرض موجودة ومسجلة بإسم وزارة الصحة.
٤. تمديد دوام مركز صحي الصبيحي الشامل ليصبح ٢٤ ساعة .
٥. إنشاء مبنى مركز صحي سيحان/العارضة .
٦. بناء مبنى للعيادات الخارجية/دير علا .
٧. تأمين منطقة زي بخدمات الصرف الصحي حفاظاً على البيئة والصحة العامة.
٨. تنفيذ مشروع الطريق السياحي الذي يربط قضاء زي بمحافظة جرش بواسطة إنشاء جسر محادي لجسر سد الملك طلال وبذلك يتم ربط محافظة البلقاء بمحافظة جرش بطريق مختصر وسريع .
٩. توسيع الشارع الرئيسي الذي يربط قضاء زي بمدينة السلط من مثلث جسر زي وحتى منطقة علان وبطول ٤ كم تقريباً نظراً لكثرة الحوادث المتكررة عليه وخاصة في فصل الشتاء ويعتبر طريق بديل حالياً عن الشارع المؤدي الى الأغوار بالإضافة لوجود المسارع النووي في منطقة علان .
١٠. إعادة إنشاء طريق بدر / ماحص و معالجة تصريف المياه كون المياه تنحدر بإتجاه البلده وتشكل خطورة على البيوت السكنية.
١١. توسعة طريق طباعة العواملة / أم جوزة وعمل جدران إستنادية/ قضاء زي .
١٢. زيادة مخصصات الطرق الزراعية لقضاء العارضة .
١٣. ربط مناطق قضاء العارضة بقضاء برما - محافظة جرش عن طريق تكملة طريق سوميا - برما .
١٤. إعادة تأهيل طريق عرقوب الراشد / سيل الزرقاء
١٥. تكملة طريق البكالوريا لغاية دوار ماحص مع إنارة الطريق .

١٦. توسعة الطريق الرئيسي / الأغوار .
١٧. توسعة الجسر على طريق وادي راجب .
١٨. تكملة توسعة طريق الطوال الجنوبي - ديرعلا .
١٩. توسعة طريق الأغوار الرئيسي - ديرعلا بطول ٤ كم .
٢٠. تكملة توسعة طريق العارضة من مثلث العارضة .
٢١. تحسين طريق الشونة الجنوبية / مثلث الكفرين .
٢٢. إضافة غرف صفية لمدرسة أم جوزة الثانوية للبنين في زي لتصبح مدرسة شاملة.
٢٣. إضافة غرف صفية لمدرسة زي الأساسية للبنات لتصبح مدرسة شاملة .
٢٤. إنشاء ١٢ غرفة صفية لمدرسة أم كثير المختلطة .
٢٥. إنشاء ١٢ غرفة صفية لمدرسة عين الباشا للبنبن .
٢٦. إنشاء ٤ غرف صفية لمدرسة الرمان الأساسية للبنين/ عين الباشا.
٢٧. إنشاء ٤ غرف صفية لمدرسة حليمة السعدية الأساسية المختلطة/ عين الباشا.
٢٨. بناء غرف صفية وسور لمدرسة ميسرا الأساسية للبنين /العارضة.
٢٩. عمل بناء حديث لمدرسة جلعد الأساسية للبنات، علماً بأن البناء الحالي مستأجر وغير صالح/زي.
